



ACCIÓNS 2010 : PLANS , PROXECTOS E OBRAS



Vicerreitoría de Infraestruturas
e Xestión Ambiental
UNIVERSIDADE DA CORUÑA

URBANISMO




PROPOSTA REVISIÓN PLAN PXOU A CORUÑA

ECOBARRIO ELVIÑA

VICERREITORÍA RESPONSABLE	Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Vicerreitor: Xosé Lois Martínez Suárez	
RESPONSABLE DO SEGUIMENTO DO CONTRATO	Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos Director: Roi Salgueiro Barrio	
PROXECTO: ARQUITECTO		
REDACTOR:		
IMPORTE DE LICITACIÓN (IVE INCLÚIDO):		
PRAZO DE EXECUCIÓN:		
PRAZO EXECUCIÓN DO REFORMADO:		
DATA DE INICIO DA OBRA:		
ESTADO DAS OBRAS:		
IMPORTE ADXUDICACIÓN:		Total orzamento final:
ORZAMENTO DO REFORMADO		
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. ORIXINAL ATE A DATA :		Total acreditado ate esta data:
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. REFORMADO ATE A DATA :		



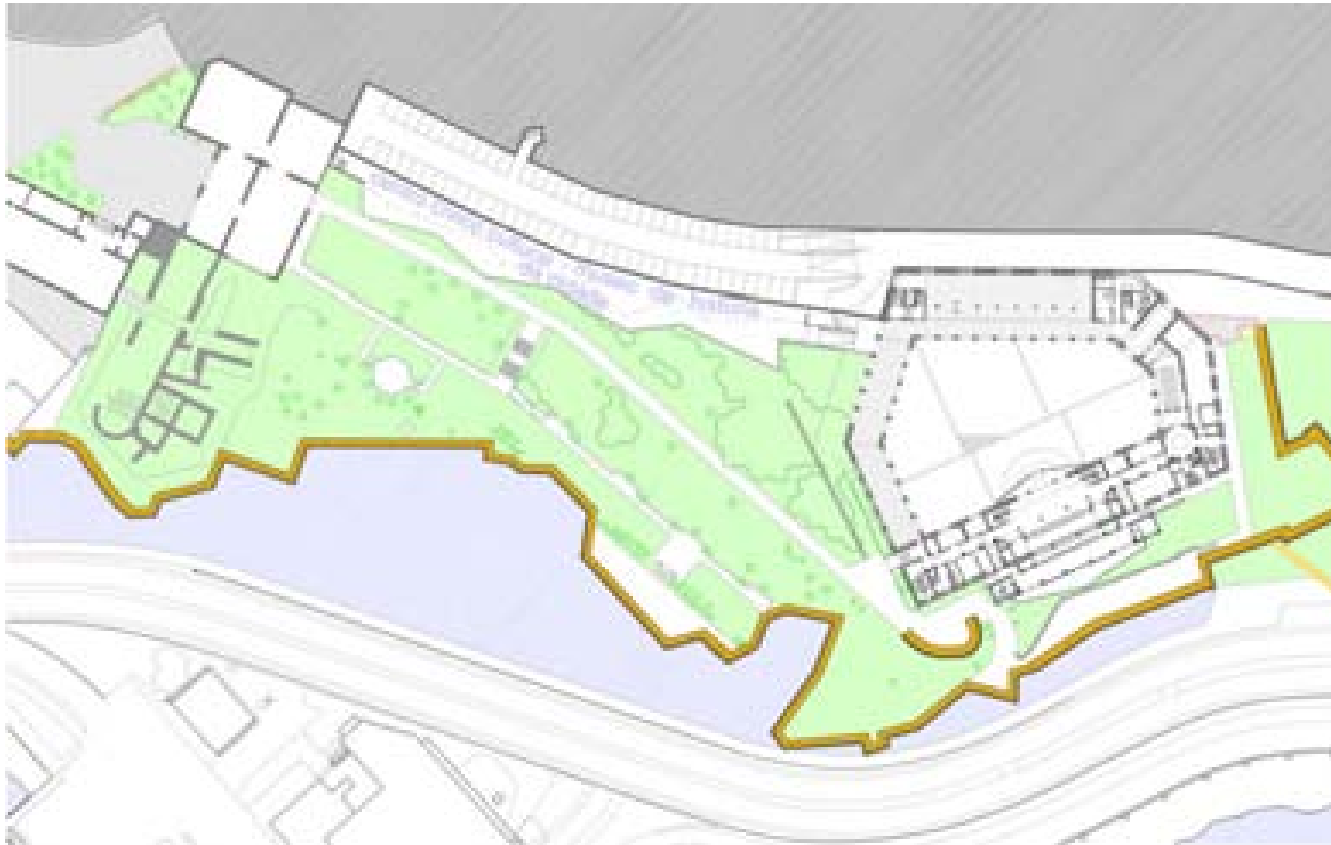

PROPOSTA REVISIÓN PLAN PXOU A CORUÑA CAMPUS A CORUÑA-MAESTRANZA		
VICERREITORÍA RESPONSABLE	Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Vicerreitor: Xosé Lois Martínez Suárez	
RESPONSABLE DO SEGUIMENTO DO CONTRATO	Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos Director: Roi Salgueiro Barrio	
ESTADO DAS OBRAS:		
IMPORTE ADXUDICACIÓN:		Total orzamento final:
ORZAMENTO DO REFORMADO		
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. ORIXINAL ATE A DATA :		Total acreditado ate esta data:
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. REFORMADO ATE A DATA :		





PROPOSTA REVISIÓN PLAN PXOU A CORUÑA

AMPLIACION CAMPUS ACORUÑA-OZA

VICERREITORÍA RESPONSABLE	Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Vicerreitor: Xosé Lois Martínez Suárez	
RESPONSABLE DO SEGUIMENTO DO CONTRATO	Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos Director: Roi Salgueiro Barrio	
PROXECTO: ARQUITECTO		
REDACTOR:		
IMPORTE DE LICITACIÓN (IVE INCLUÍDO):		
PRAZO DE EXECUCIÓN:		
PRAZO EXECUCIÓN DO REFORMADO:		
DATA DE INICIO DA OBRA:		
ESTADO DAS OBRAS:		
IMPORTE ADXUDICACIÓN:		Total orzamento final:
ORZAMENTO DO REFORMADO		Total acreditado ate esta data:
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. ORIXINAL ATE A DATA :		
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. REFORMADO ATE A DATA :		



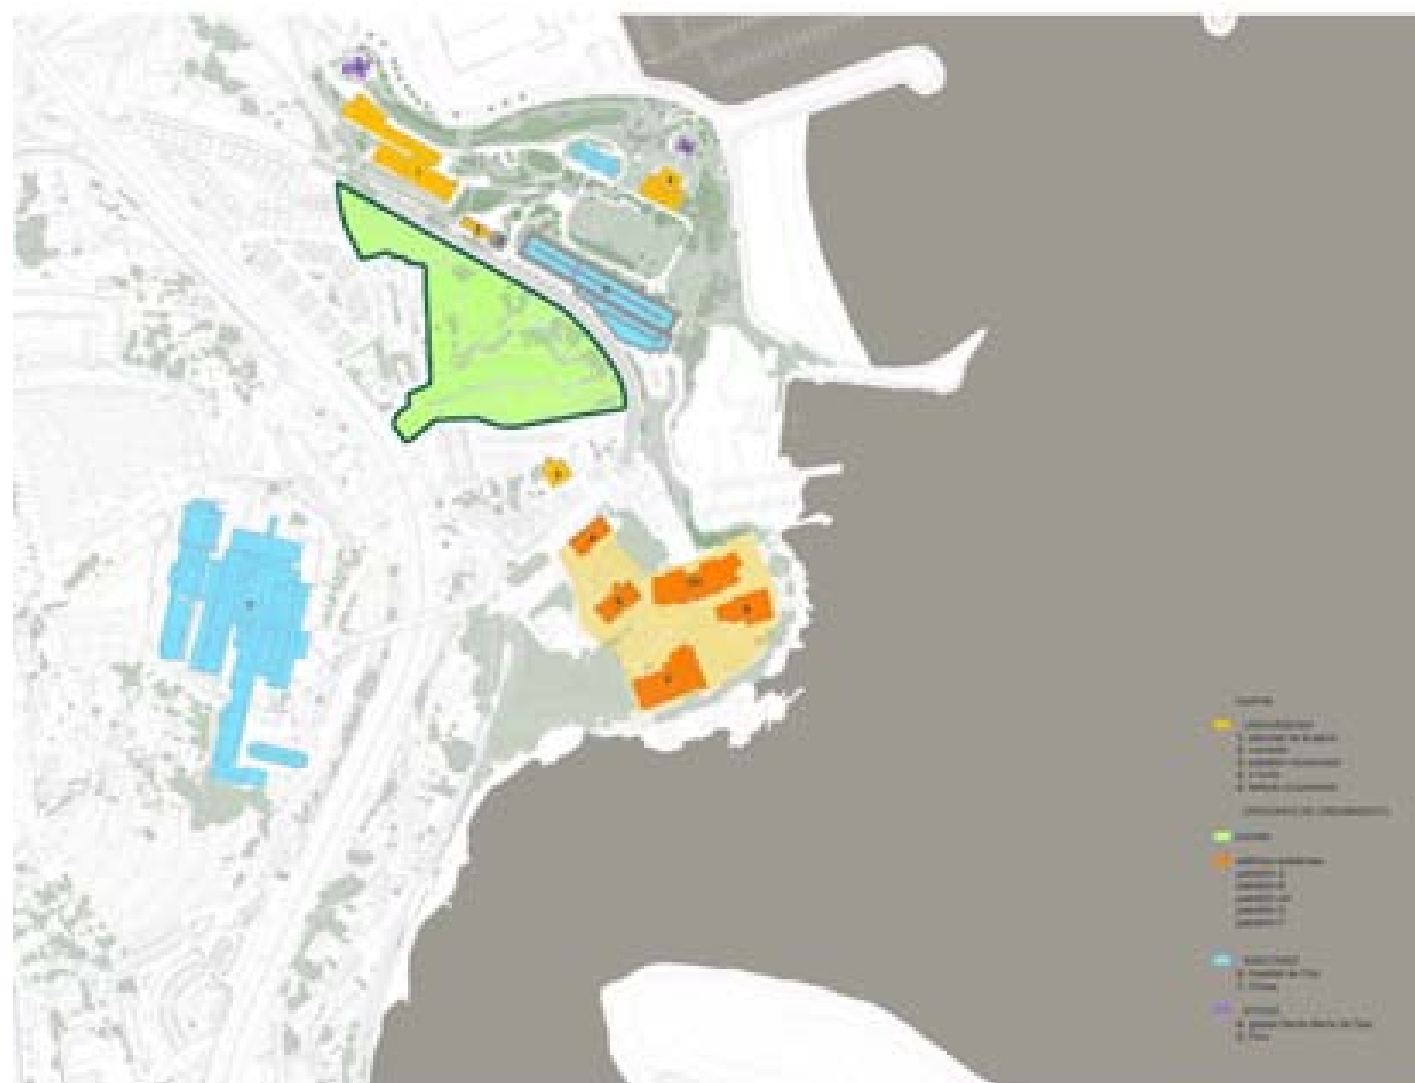

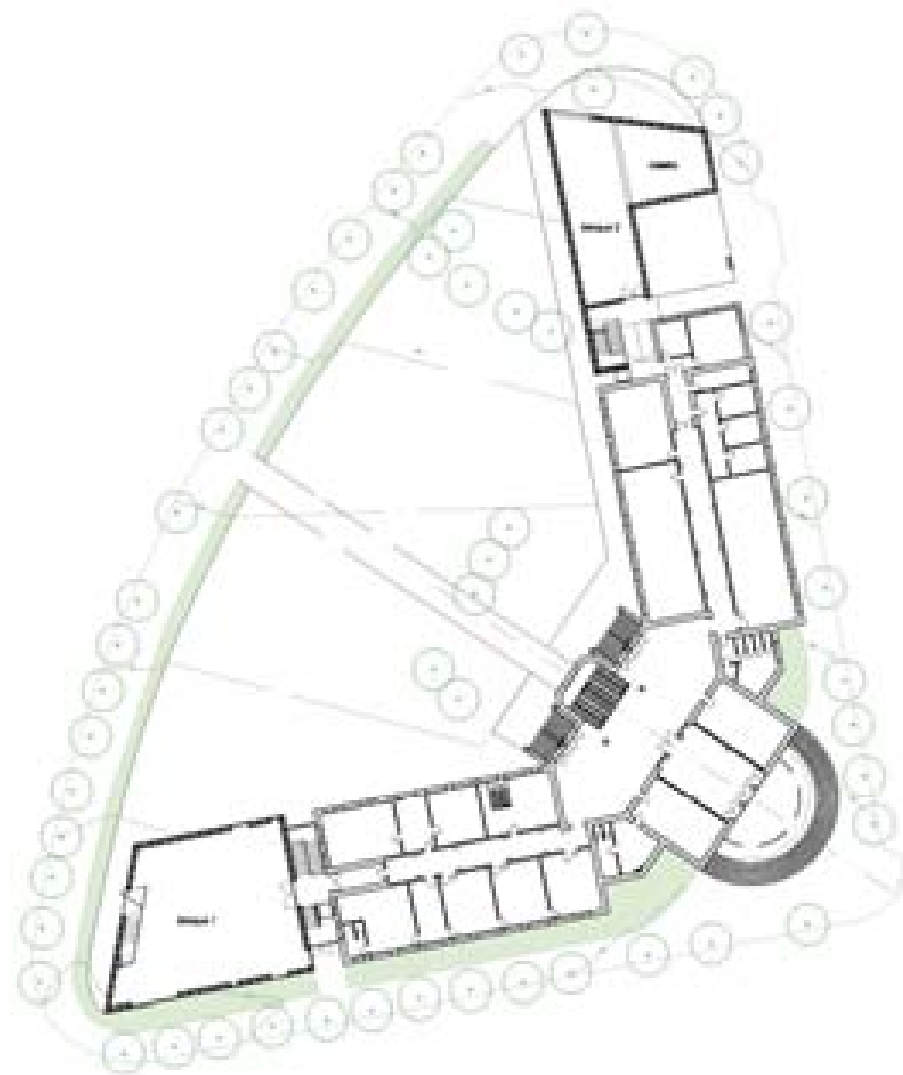

SUPERFICIE DTL BLOQUE 1 ANDAR D: 244 m²
SUPERFICIE DTL BLOQUE 2 ANDAR D: 108 m²

ANEXO D

PROPOSTA REVISIÓN PLAN PXOU A CORUÑA CAMPUS A CORUÑA-RIAZOR

VICERREITORÍA RESPONSABLE		Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Vicerreitor: Xosé Lois Martínez Suárez
RESPONSABLE DO SEGUIMENTO DO CONTRATO		Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos Director: Roi Salgueiro Barrio
ESTADO DAS OBRAS:		
IMPORTE ADXUDICACIÓN:		Total orzamento final:
ORZAMENTO DO REFORMADO		
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. ORIXINAL ATE A DATA :		Total acreditado ate esta data:
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. REFORMADO ATE A DATA :		





PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUTURAS DA UDC. CAMPUS DA ZAPATEIRA - A CORUÑA
UNIVERSIDADE DA CORUÑA VICERREITORÍA DE INFRAESTRUTURAS E XESTIÓN AMBIENTAL 2009




PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUTURAS DA ZAPATEIRA

VICERREITORÍA RESPONSABLE	Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Vicerreitor: Xosé Lois Martínez Suárez	
RESPONSABLE DO SEGUIMENTO DO CONTRATO	Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos Director: Roi Salgueiro Barrio	
ESTADO DAS OBRAS:		
IMPORTE ADXUDICACIÓN:		Total orzamento final:
ORZAMENTO DO REFORMADO		
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. ORIXINAL ATE A DATA :		Total acreditado ate esta data:
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. REFORMADO ATE A DATA :		

PLAN DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO UDC




OBRA		
PLAN DE MOBILIDADE DE ELVIÑA-ZAPATEIRA		
VICERREITORÍA RESPONSABLE	Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Vicerreitor: Xosé Lois Martínez Suárez	
RESPONSABLE DO SEGUIMENTO DO CONTRATO	Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos Director: Roi Salgueiro Barrio	
DATA DE INICIO DA OBRA:		
ESTADO DAS OBRAS:		
IMPORTE ADXUDICACIÓN:		Total orzamento final:
ORZAMENTO DO REFORMADO		
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. ORIXINAL ATE A DATA :		Total acreditado ate esta data:
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. REFORMADO ATE A DATA :		

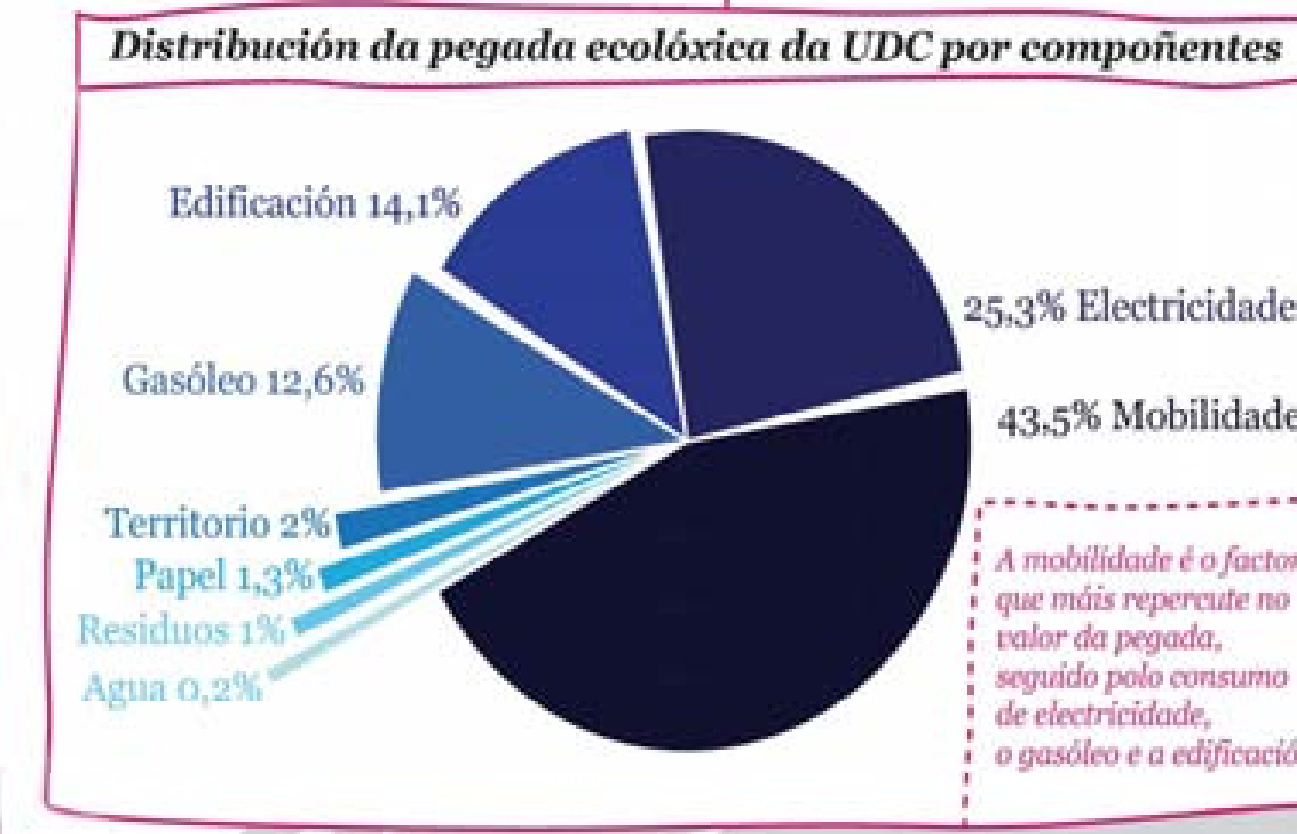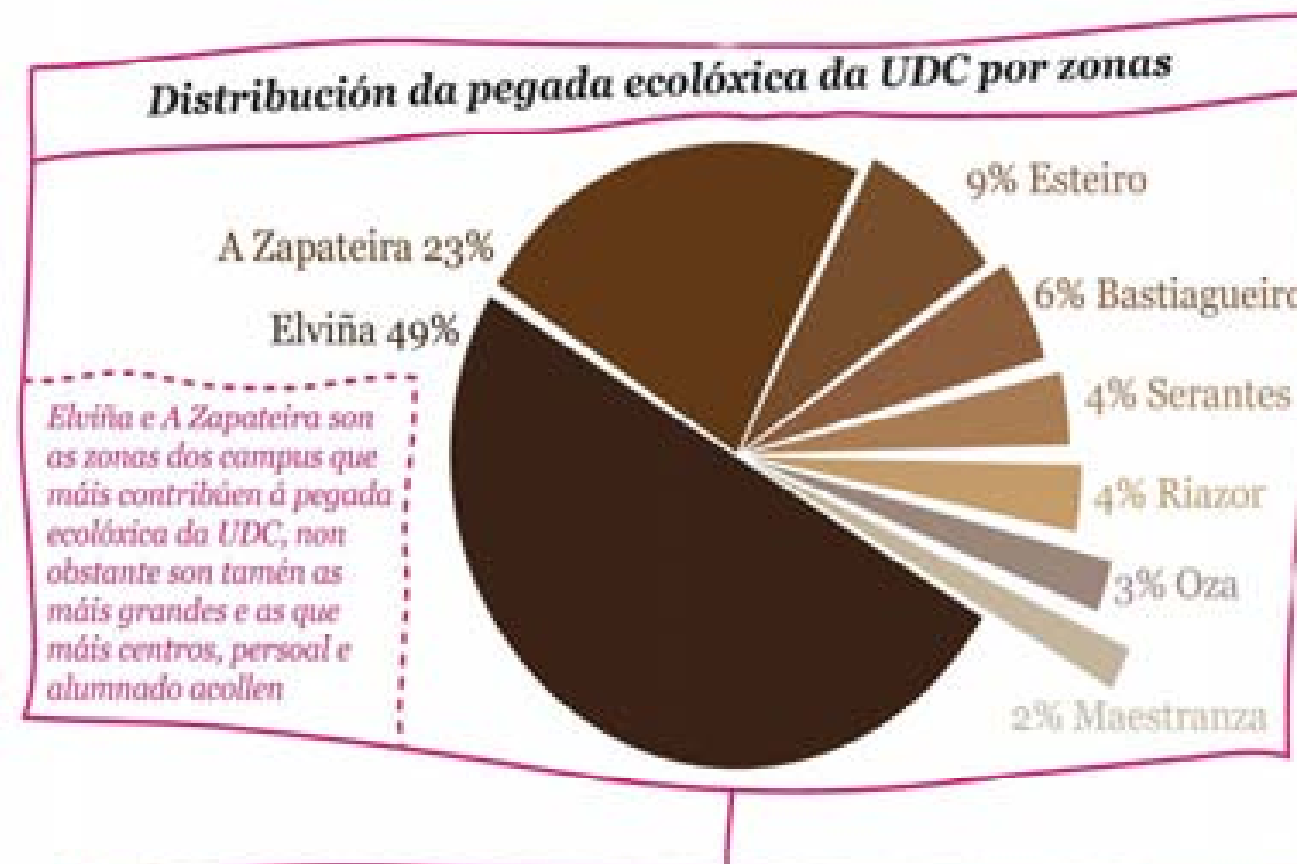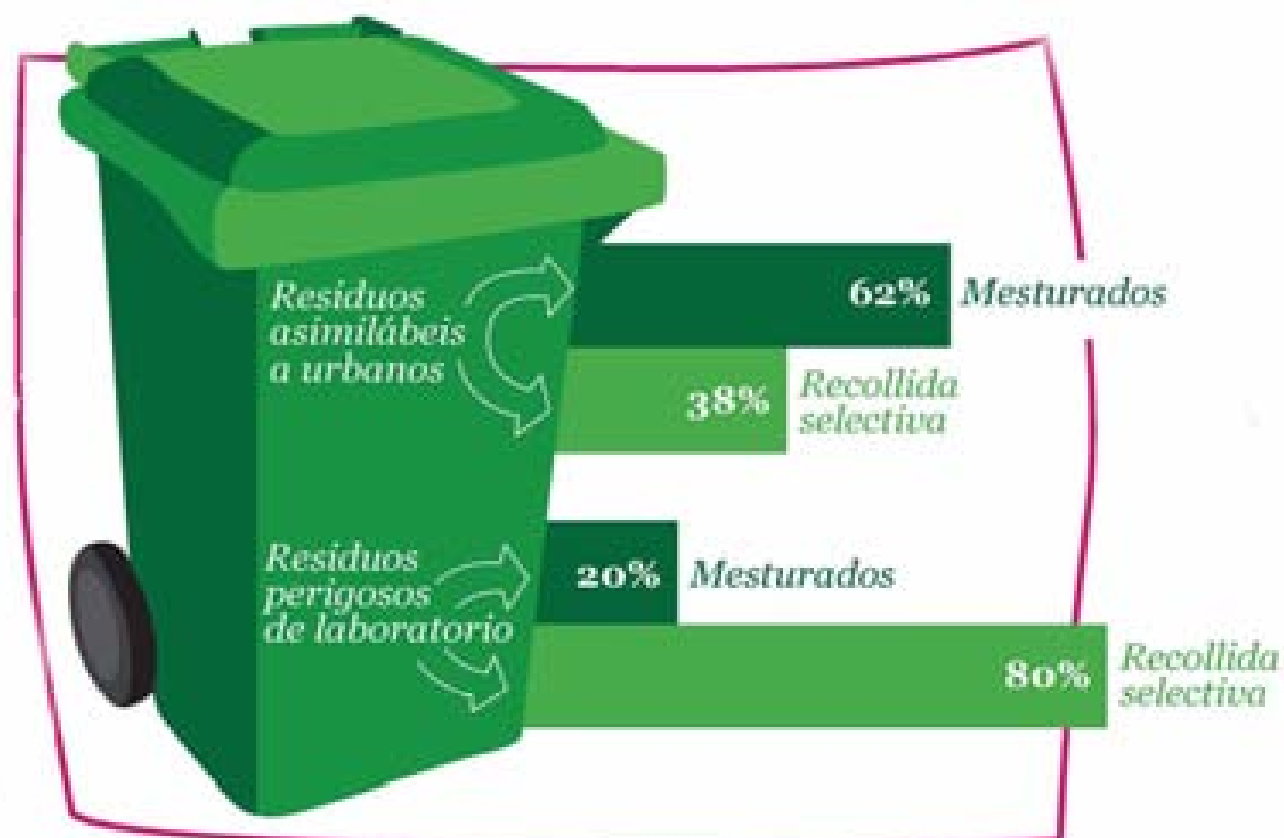


PEGADA ECOLÓXICA

VICERREITORÍA RESPONSABLE	Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Vicerreitor: Xosé Lois Martínez Suárez	
RESPONSABLE DO SEGUIMENTO DO CONTRATO	Director da oficina de medioambiente Director: Manuel Soto Castiñeira	
PROXECTO: ARQUITECTO		
REDACTOR:		
IMPORTE DE LICITACIÓN (IVE INCLÚIDO):		
SUPERFICIE CONSTRUIDA:		
PRAZO EXECUCIÓN DO REFORMADO:		
DATA DE INICIO DA OBRA:		
ESTADO DAS OBRAS:		
IMPORTE ADXUDICACIÓN:		Total orzamento final:
ORZAMENTO DO REFORMADO		
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. ORIXINAL ATE A DATA :		Total acreditado ate esta data:
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. REFORMADO ATE A DATA :		

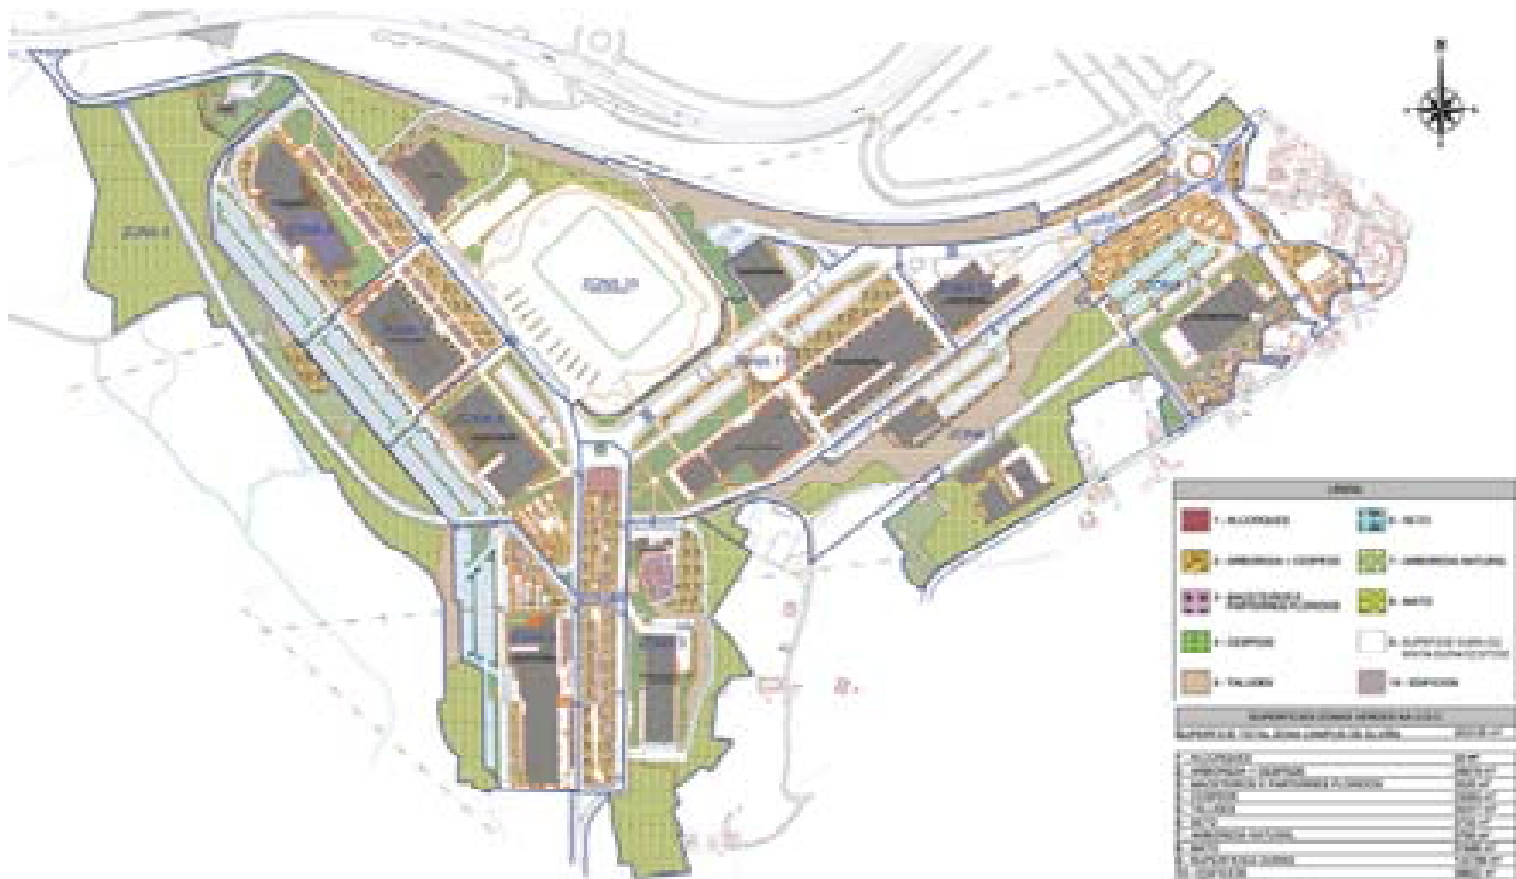

SERVIZOS		
REDACCIÓN DO PREGO E LICITACIÓN DO NOVO SERVIZO DE XARDINERÍA E MANTEMENTO DOS ESPACIOS PÚBLICOS		
VICERREITORÍA RESPONSABLE	Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Vicerreitor: Xosé Lois Martínez Suárez	
RESPONSABLE DO SEGUIMENTO DO CONTRATO	Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos Director: Roi Salgueiro Barrio	
IMPORTE DE LICITACIÓN (IVE INCLUÍDO):	580.000 €	
SUPERFICIE CONSTRUIDA:		
EMPRESA ADJUDICATARIA:		
DATA DO CONTRATO:		
PRAZO DE EXECUCIÓN:	2 anos	
DATA DE INICIO DA OBRA:		
IMPORTE ADXUDICACIÓN:	550.318,86 €	Total orzamento final:
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. ORIXINAL ATE A DATA :		Total acreditado ate esta data:
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. REFORMADO ATE A DATA :		

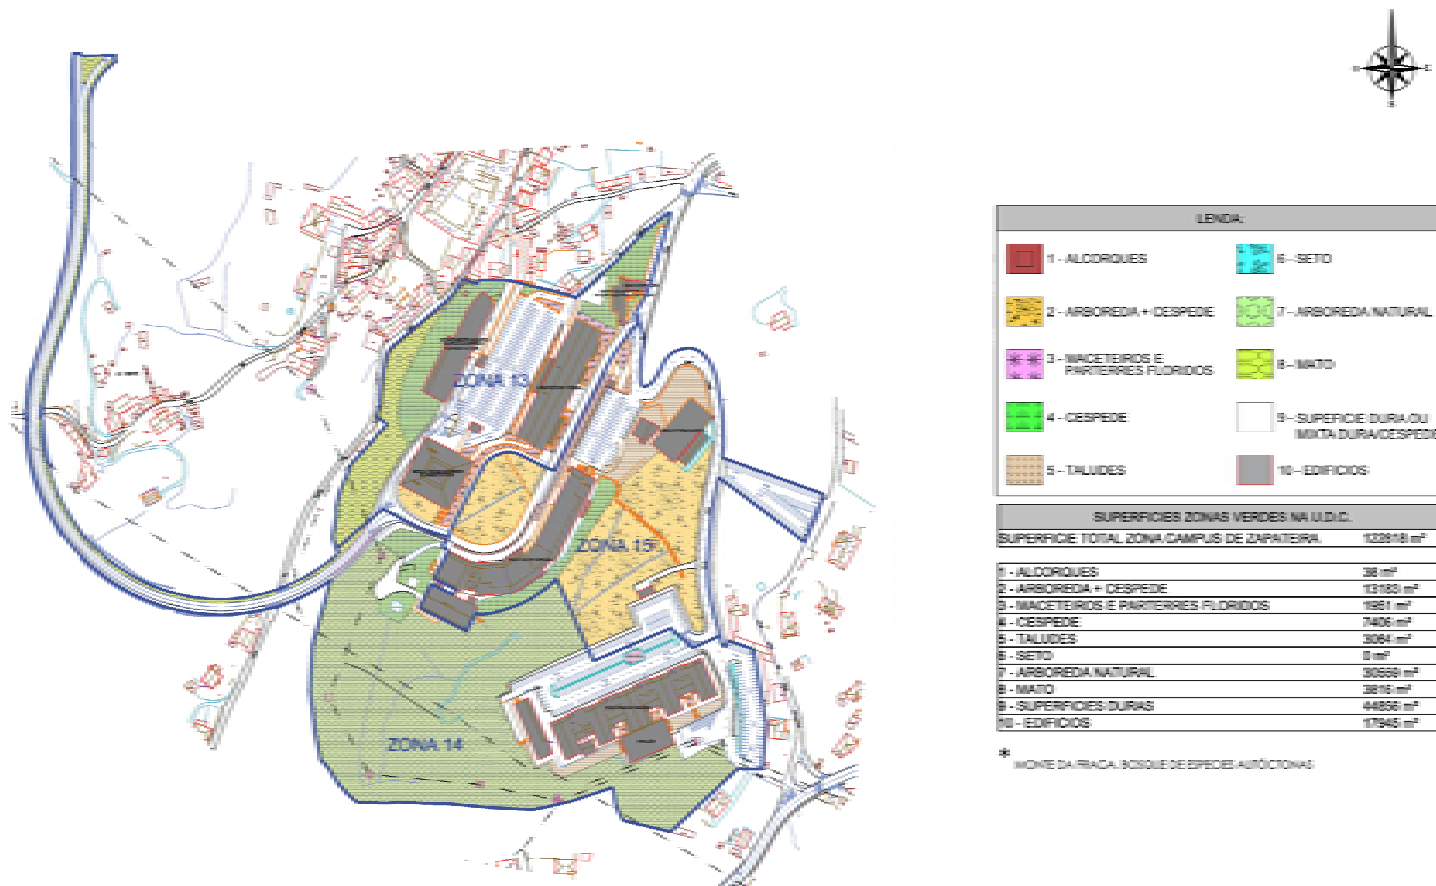



Vicerreitoría de Infraestruturas
e Xestión Ambiental
UNIVERSIDADE DA CORUÑA

EDIFICACIÓN




CAMPUS DA CORUÑA: MAESTRANZA





OBRA


CLUBE NÁUTICO. REDACCIÓN DO PROXECTO DE
REHABILITACIÓN E LICITACIÓN DA OBRA

VICERREITORÍA RESPONSABLE		Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Vicerreitor: Xosé Lois Martínez Suárez
RESPONSABLE DO SEGUIMENTO DO CONTRATO		Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos Director: Roi Salgueiro Barrio
PROXECTO: ARQUITECTO REDACTOR:		Alberto Noguerol e Pilar Diaz
IMPORTE DE LICITACIÓN (IVE INCLÚIDO):		545.761,80 €
SUPERFICIE CONSTRUIDA:		1.232,29 m2
EMPRESA CONSTRUTORA:		
ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA		
ARQUITECTO TÉCNICO, DIRECTOR DE EXECUCIÓN DE OBRA:		
COORDINADOR DE SEGURIDADE E SAÚDE:		
DATA DE ADXUDICACIÓN DA OBRA:		
DATA DO CONTRATO:		
PRAZO DE EXECUCIÓN:		
PRAZO EXECUCIÓN DO REFORMADO:		
DATA DE INICIO DA OBRA:		
ESTADO DAS OBRAS:		En licitación
IMPORTE ADXUDICACIÓN:		Total orzamento final:
ORZAMENTO DO REFORMADO		
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. ORIXINAL ATE A DATA :		Total acreditado ate esta data:
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. REFORMADO ATE A DATA :		

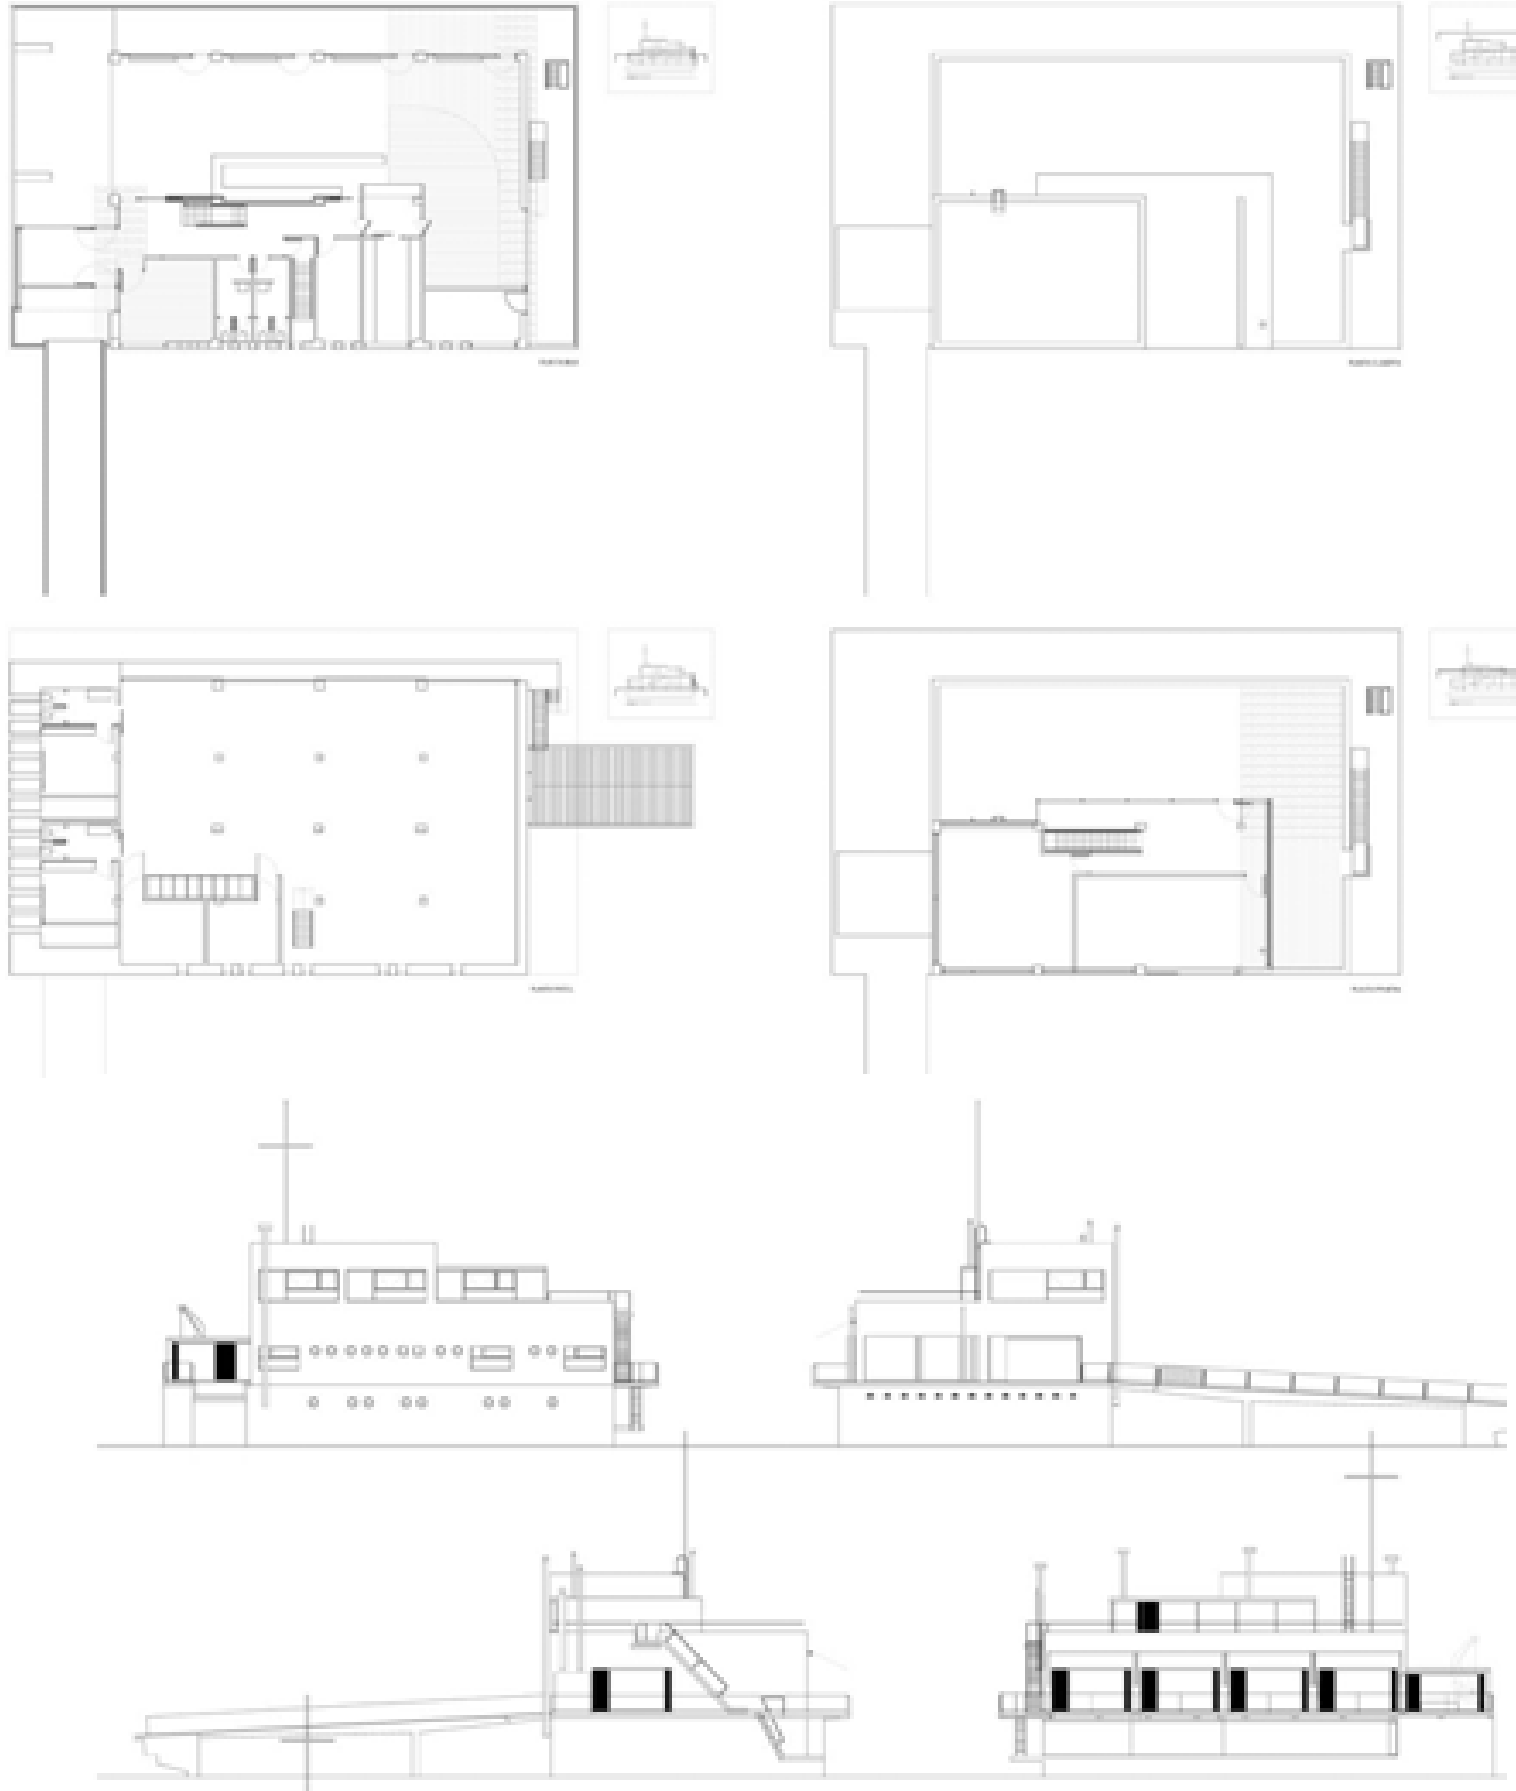


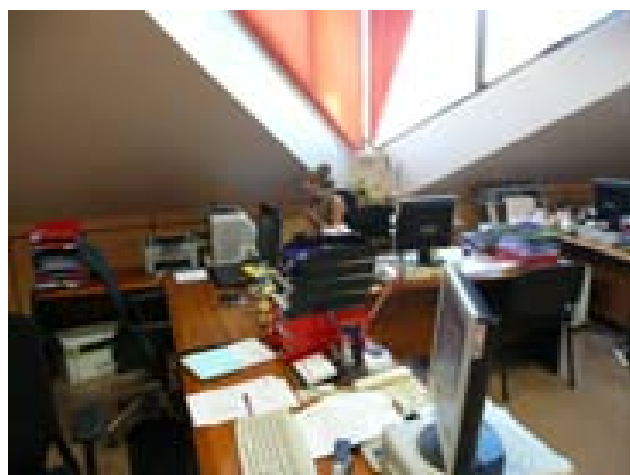

Ala 2		Usos	Mobiliario	Instalacións eléctricas
 33.30 m², 4.00 m²/persoa		01. Sala de Servizo de Investigación 02. Sala de Servizo de Investigación 03. Sala de Servizo de Investigación 04. Sala de Servizo de Investigación	Mesa tipo 1 (10x10m) 4 Mesa tipo 2 (10x10m) 4 Computadora (ordenador) 1 módulo Mobiliario (sillas, mesas, etc.) 1 módulo Mobiliario (sillas, mesas, etc.) 1 módulo	Cableado de rede Servidor de rede e rede local RPD - LAN Servidor de rede Servidor de rede Servidor de rede
		05. Sala de Servizo de Investigación 06. Sala de Servizo de Investigación 07. Sala de Servizo de Investigación 08. Sala de Servizo de Investigación	Despachos Mesa tipo 1 (10x10m) 4 Computadora (ordenador) 1 módulo Mobiliario (sillas, mesas, etc.) 1 módulo	Servidor de rede Servidor de rede Servidor de rede Servidor de rede

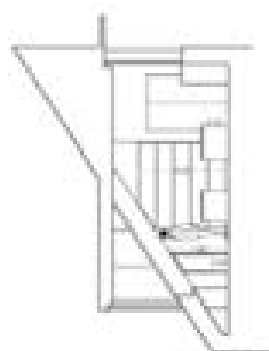

Ala 3		Usos	Mobiliario	Instalacións eléctricas
 136.40 m², 8.80 m²/persoa		01. Sala de Servizo de Personal Docente e Investigador 02. Sala de Servizo de Personal Docente e Investigador 03. Despacho 04. Sala de Servizo de Personal Docente e Investigador 05. Despacho 06. Sala de Servizo de Personal Docente e Investigador 07. Sala de Servizo de Personal Docente e Investigador 08. Sala de Servizo de Personal Docente e Investigador 09. Sala de Servizo de Personal Docente e Investigador 10. Sala de Servizo de Personal Docente e Investigador	Mesa tipo 1 (10x10m) 10 Computadora (ordenador) 10 Mobiliario (sillas, mesas, etc.) 10 Mobiliario (sillas, mesas, etc.) 10 Mobiliario (sillas, mesas, etc.) 10 Mobiliario (sillas, mesas, etc.) 10 Mobiliario (sillas, mesas, etc.) 10 Mobiliario (sillas, mesas, etc.) 10 Mobiliario (sillas, mesas, etc.) 10 Mobiliario (sillas, mesas, etc.) 10 Mobiliario (sillas, mesas, etc.) 10	Cableado de rede Servidor de rede e rede local RPD - LAN Servidor de rede Servidor de rede Servidor de rede Servidor de rede Servidor de rede Servidor de rede Servidor de rede
		11. Sala de Servizo de Personal Docente e Investigador 12. Sala de Servizo de Personal Docente e Investigador 13. Sala de Servizo de Personal Docente e Investigador 14. Sala de Servizo de Personal Docente e Investigador 15. Sala de Servizo de Personal Docente e Investigador 16. Sala de Servizo de Personal Docente e Investigador 17. Sala de Servizo de Personal Docente e Investigador 18. Sala de Servizo de Personal Docente e Investigador 19. Sala de Servizo de Personal Docente e Investigador 20. Sala de Servizo de Personal Docente e Investigador	Despachos Mesa tipo 1 (10x10m) 4 Computadora (ordenador) 1 módulo Mobiliario (sillas, mesas, etc.) 1 módulo Mobiliario (sillas, mesas, etc.) 1 módulo Mobiliario (sillas, mesas, etc.) 1 módulo Mobiliario (sillas, mesas, etc.) 1 módulo Mobiliario (sillas, mesas, etc.) 1 módulo Mobiliario (sillas, mesas, etc.) 1 módulo Mobiliario (sillas, mesas, etc.) 1 módulo Mobiliario (sillas, mesas, etc.) 1 módulo	Servidor de rede Servidor de rede Servidor de rede Servidor de rede Servidor de rede Servidor de rede Servidor de rede Servidor de rede Servidor de rede Servidor de rede



EQUIPAMENTOS REITORÍA. NOVO EQUIPAMENTO E DISTRIBUCIÓN DOS POSTOS DE TRABALLO NO 2º ANDAR, EQUIPAMENTO DA FACULDADE DE CIENCIAS E A E.T.S.CAMIÑOS CANAIS E PORTOS

VICERREITORÍA RESPONSABLE	Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Vicerreitor: Xosé Lois Martínez Suárez	
RESPONSABLE DO SEGUIMENTO DO CONTRATO	Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos Director: Roi Salgueiro Barrio	
PROXECTO: ARQUITECTO	Roi Salgueiro Barrio	
REDACTOR:	Roi Salgueiro Barrio	
IMPORTE DE LICITACIÓN (IVE INCLUÍDO):	238.000 €	
EMPRESAS ADXUDICATARIAS:	Sutega mobiliario S.L. e Planb Equipamento Integral S.L.	
DATA DE ADXUDICACIÓN:	18/02/2010	
IMPORTE ADXUDICACIÓN:	191.374,91 €	Total orzamento final: 191.374,91 €



CAMPUS DA CORUÑA: A ZAPATEIRA



OBRA

CATEDRA DA MADEIRA – PABELLÓN ETSAC

VICERREITORÍA RESPONSABLE:	Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Vicerreitor: Xosé Lois Martínez Suárez	
RESPONSABLE DO SEGUIMENTO DO CONTRATO:	Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos Director: Roi Salgueiro Barrio	
PROXECTO: ARQUITECTO REDACTOR	Jorge Salgado Cortizas	
IMPORTE DE LICITACIÓN (IVE INCLÚIDO):	275.040 €	
SUPERFICIE CONSTRUIDA:	364 m²	
EMPRESA CONSTRUTORA:	CONSTRUCCIONES EN PIEDRA SIGRAS, SL	
ARQUITECTOS DIRECTORES DE OBRA	Covadonga Carrasco López	
ARQUITECTO TECNICO, DIRECTOR DE EXECUCIÓN DE OBRA :	Emilio Mosquera Rey	
COORDINADOR DE SEGURIDADE E SAÚDE:	Elado Munin Gayoso	
DATA DE ADXUDICACIÓN DA OBRA:	27/07/2009	
DATA DO CONTRATO:	12/08/2009	
PRAZO DE EXECUCIÓN:	88 días contados a partir do día seguinte da sinatura do acta de comprobación de traza	
DATA DE INICIO DA OBRA:	21/09/2009	
ESTADO DAS OBRAS:	OBRA FINALIZADA, RECEPCIONADA 21/10/2010	
IMPORTE DE ADXUDICACIÓN (IVE INCLÚIDO):	232.408,80€	Total Orzamento: 232.408,80€
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. ORIXINAL ATE A DATA :	232.408,80€	CERTIFICADO NA SÚA TOTALIDADE Pendente de liquidación
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. REFORMADO ATE A DATA :		








OBRA

PROXECTO DE AMPLIACIÓN DA ESCOLA TECNICA

SUPERIOR DE ARQUITECTURA

VICERREITORÍA RESPONSABLE:	Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Vicerreitor: Xosé Lois Martínez Suárez	
RESPONSABLE DO SEGUIMENTO DO CONTRATO:	Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos Director: Roi Salgueiro Barrio	
PROXECTO: ARQUITECTO REDACTOR	Covadonga Carrasco López	
IMPORTE DE LICITACIÓN (IVE INCLUÍDO):	528.732,57€	
SUPERFICIE CONSTRUIDA:	761.10m²	
EMPRESA CONSTRUTORA:	Estructuras y obras de Galicia	
ARQUITECTOS DIRECTORES DE OBRA		
ARQUITECTO TECNICO, DIRECTOR DE EXECUCIÓN DE OBRA :		
COORDINADOR DE SEGURIDADE E SAÚDE:		
DATA DE ADXUDICACIÓN DA OBRA:	04/01/2011	
DATA DO CONTRATO:		
PRAZO DE EXECUCIÓN:	4 meses	
DATA DE INICIO DA OBRA:		
ESTADO DAS OBRAS:	Sen comezar	
IMPORTE DE ADXUDICACIÓN (IVE INCLUÍDO):	449.422,67€	
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. ORIXINAL ATE A DATA :		
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. REFORMADO ATE A DATA :		

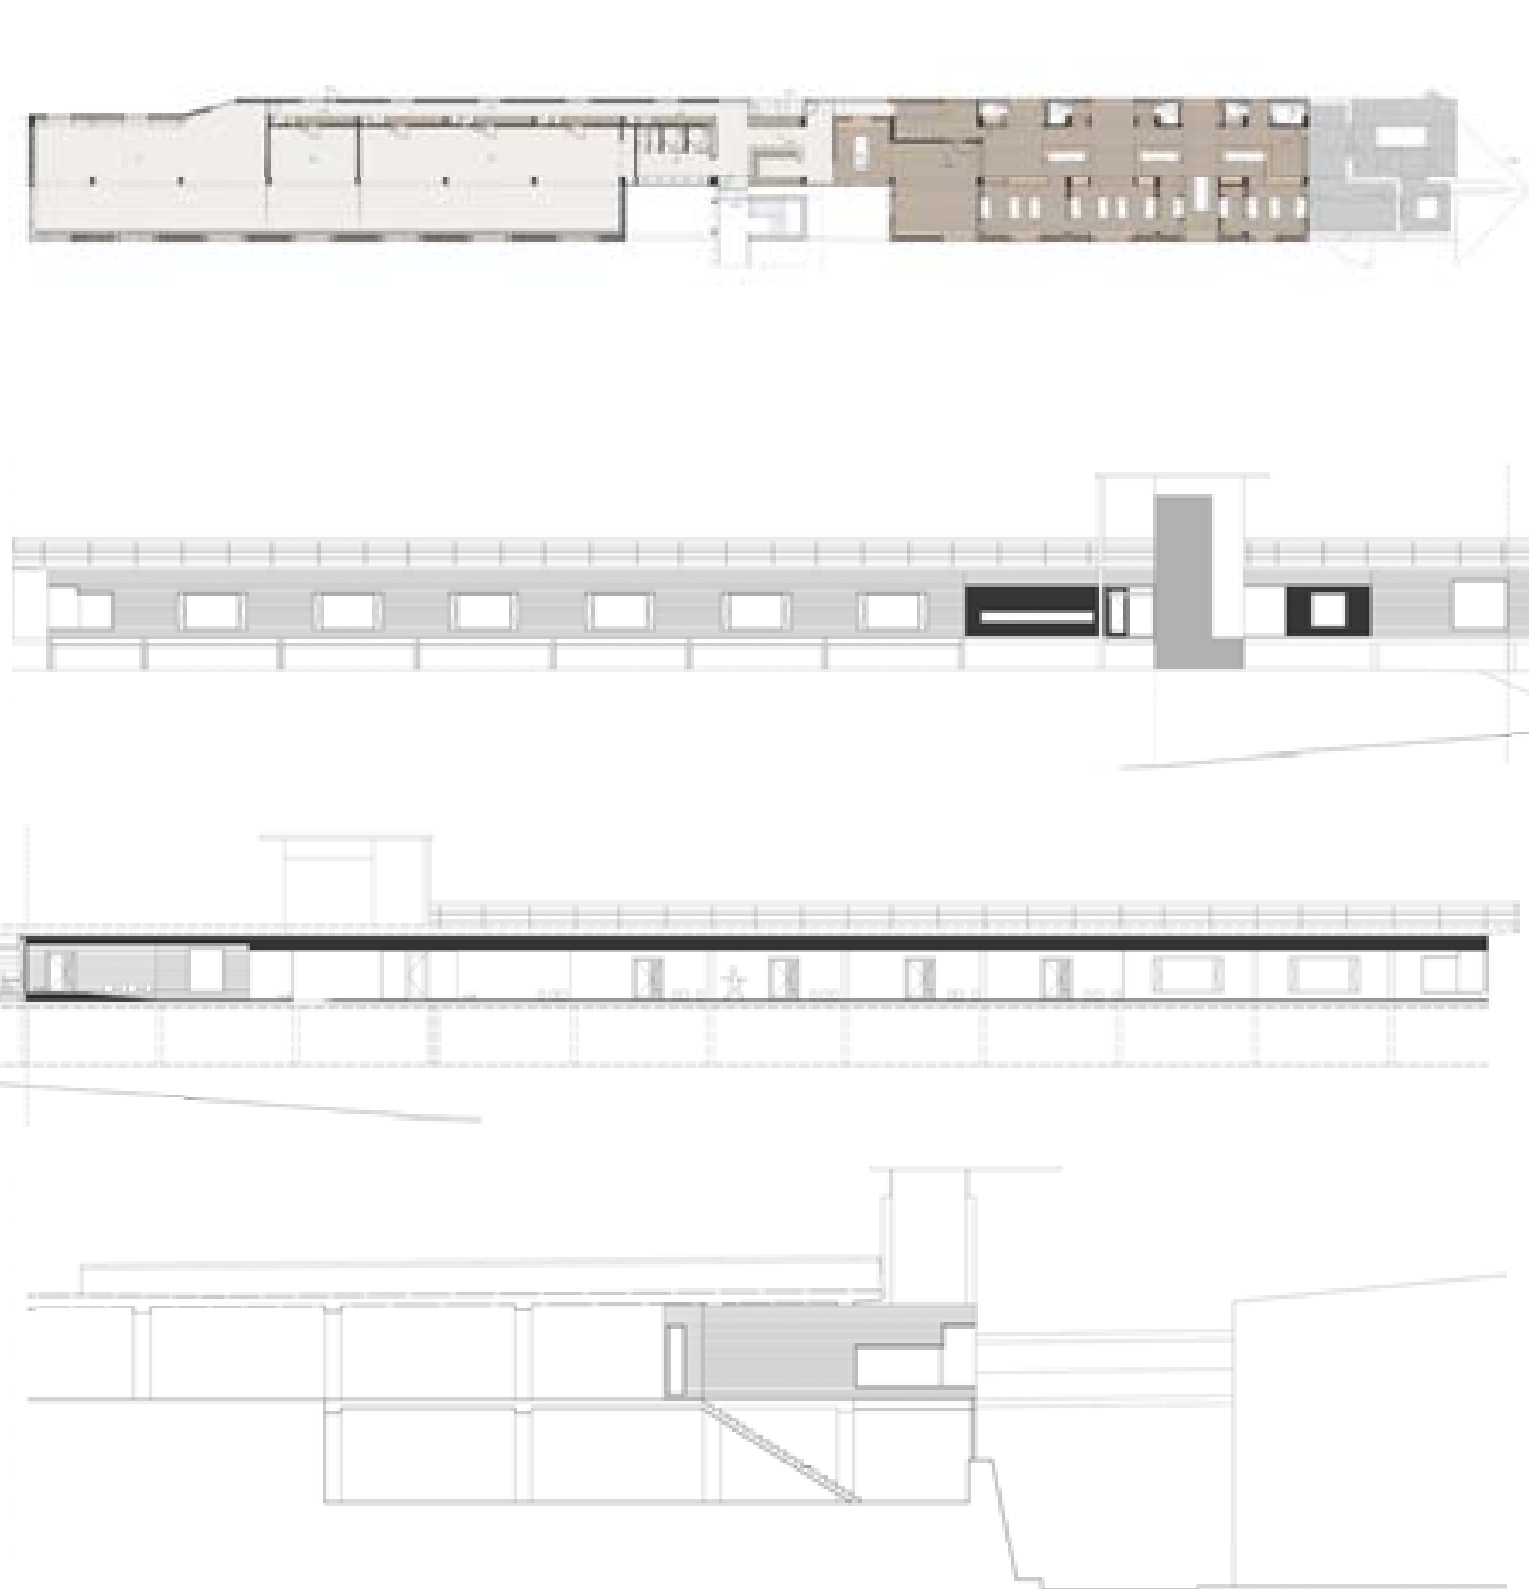




OBRA

ADAPTACIÓN DA ESCOLA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA PARA EEES

VICERREITORÍA RESPONSABLE	Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Vicerreitor: Xosé Lois Martínez Suárez	
RESPONSABLE DO SEGUIMENTO DO CONTRATO	Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos Director: Roi Salgueiro Barrio	
PROXECTO: ARQUITECTO REDACTOR:	María López Mata, Silvia Candia Expósito e Juan Carlos Mancho Trigo	
IMPORTE DE LICITACIÓN (IVE INCLUÍDO):	138.538,70 €	
SUPERFICIE CONSTRUIDA:	655,11 m ²	
EMPRESA CONSTRUTORA:	Construcciones Fraga Varela	
ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA	María López Mata	
ARQUITECTO TÉCNICO, DIRECTOR DE EXECUCIÓN DE OBRA:	Ana Gallego Núñez	
COORDINADOR DE SEGURIDADE E SAÚDE:	Ana Gallego Núñez	
DATA DE ADXUDICACIÓN DA OBRA:	18/12/2009	
DATA DO CONTRATO:	28/12/2009	
PRAZO DE EXECUCIÓN:	105 días	
PRAZO EXECUCIÓN DO REFORMADO:	2 meses	
DATA DE INICIO DA OBRA:	25/01/2010	
ESTADO DAS OBRAS:	OBRA FINALIZADA, RECEPCIONADA 23/09/2010	
IMPORTE DE ADXUDICACIÓN (IVE INCLUÍDO):	131.611,77 €	Total orzamento final: 157.932,22 €
ORZAMENTO DO REFORMADO	18.123,83€	
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. ORIXINAL ATE A DATA :	117.790,56€	Total acreditado ate esta data: 132.266,89€ Pendente de liquidación
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. REFORMADO ATE A DATA :	14.476,12€	





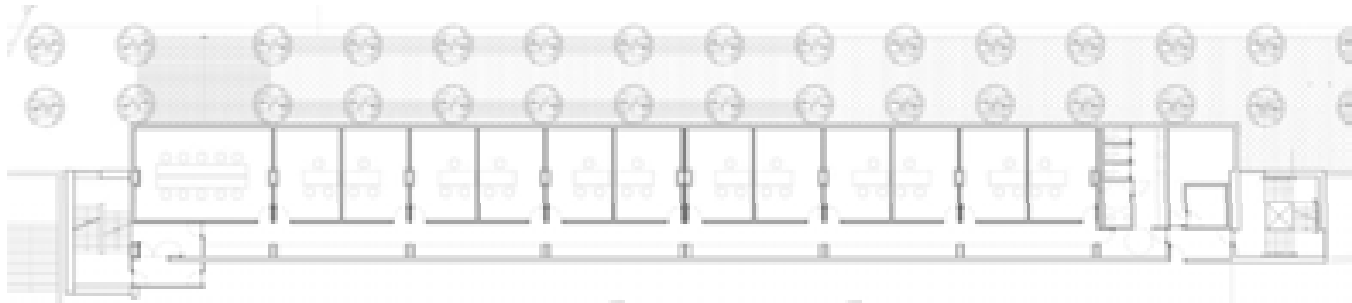

OBRA		
NOVOS DESPACHOS NO APARCADOIRO DA FACULTADE DE CIENCIAS		
VICERREITORÍA RESPONSABLE:	Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Vicerreitor: Xosé Lois Martínez Suárez	
RESPONSABLE DO SEGUIMENTO DO CONTRATO:	Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos Director: Roi Salgueiro Barrio	
PROXECTO: ARQUITECTO REDACTOR:	Sonia Vázquez Díaz	
IMPORTE DE LICITACIÓN (IVE INCLÚIDO):	324.656,27 €	
SUPERFICIE CONSTRUIDA:	433,71m2	
EMPRESA CONSTRUTORA:	CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS HERCULINAS, SA	
ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA:	Sonia Vázquez Díaz	
ARQUITECTOS TÉCNICOS, DIRECTORES DE EXECUCIÓN DE OBRA:	Ana Couceiro González	
COORDINADOR DE SEGURIDADE E SAÚDE:	Ana Couceiro González	
DATA DE ADXUDICACIÓN DA OBRA:	21/01/2009	
DATA DO CONTRATO:	29/01/2009	
PRAZO DE EXECUCIÓN:	96 días	
PRAZO EXECUCIÓN DO REFORMADO:		
DATA DE INICIO DA OBRA:	14/02/2009	
ESTADO DAS OBRAS	OBRA FINALIZADA, RECEPCIONADA 02/12/2009	
IMPORTE DE ADXUCACIÓN (IVE INCLÚIDO):	249.400 €	Total Orzamento: 249.400 €
ORZAMENTO DO REFORMADO:		
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. ORIXINAL ATE A DATA :	249.400 €	CERTIFICADO NA SÚA TOTALIDADE
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. REFORMADO ATE A DATA :		







OBRA

DISTRICT HEATING DE A ZAPATEIRA


VICERREITORÍA RESPONSABLE:	Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Vicerreitor: Xosé Lois Martínez Suárez	
RESPONSABLE DO SEGUIMENTO DO CONTRATO:	Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos Director: Roi Salgueiro Barrio	
PROXECTO: ARQUITECTO REDACTOR	Ingeniero Jesús Guillén Rodríguez	
IMPORTE DE LICITACIÓN (IVE INCLUÍDO):	453.093,68€	
EMPRESA CONSTRUTORA:	Elecnor S.A	
ARQUITECTOS DIRECTORES DE OBRA	D. Jacobo Guillén Perez	
DATA DE ADXUDICACIÓN DA OBRA:	23/12/2009	
DATA DO CONTRATO:	08/01/2010	
PRAZO DE EXECUCIÓN:	60 días naturais	
DATA DE INICIO DA OBRA:	04/08/2010	
ESTADO DAS OBRAS:	En execución.	
IMPORTE DE ADXUDICACIÓN (IVE INCLUÍDO):	445.414,07€	Total acreditado ate esta data: 350.250,27€
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. ORIXINAL ATE A DATA :	350.250,27€	
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. REFORMADO ATE A DATA :		

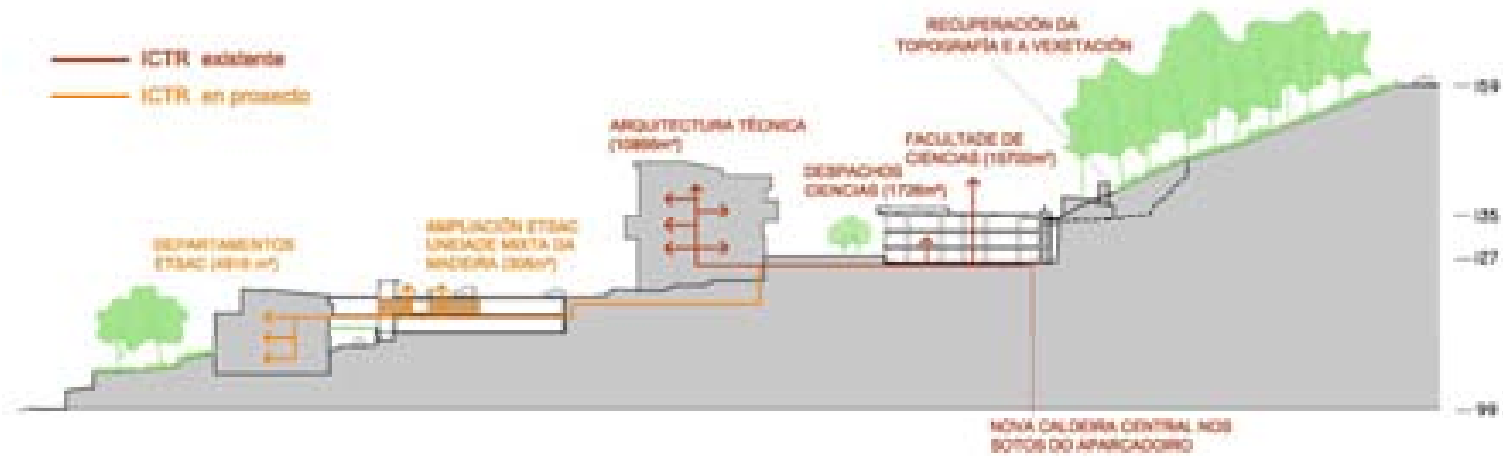


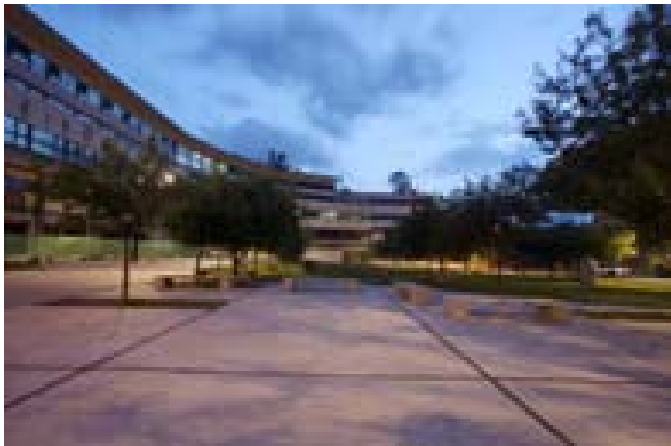

OBRA

VICERREITORÍA RESPONSABLE:	Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Vicerreitor: Xosé Lois Martínez Suárez	
RESPONSABLE DO SEGUIMENTO DO CONTRATO:	Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos Director: Roi Salgueiro Barrio	
PROXECTO: ARQUITECTO REDACTOR	Roi Salgueiro Barrio	
IMPORTE DE LICITACIÓN (IVE INCLUÍDO):	54.946,95	
SUPERFICIE CONSTRUIDA:		
EMPRESA CONSTRUTORA:	J.F. Varela	
ARQUITECTOS DIRECTORES DE OBRA	Roi Salgueiro Barrio	
ARQUITECTO TECNICO, DIRECTOR DE EXECUCIÓN DE OBRA :		
COORDINADOR DE SEGURIDADE E SAÚDE:		
DATA DE ADXUDICACIÓN DA OBRA:	30/11/2010	
DATA DO CONTRATO:		
PRAZO DE EXECUCIÓN:		
DATA DE INICIO DA OBRA:		
ESTADO DAS OBRAS:		
IMPORTE DE ADXUDICACIÓN (IVE INCLUÍDO):		
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. ORIXINAL ATE A DATA :		
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. REFORMADO ATE A DATA :		

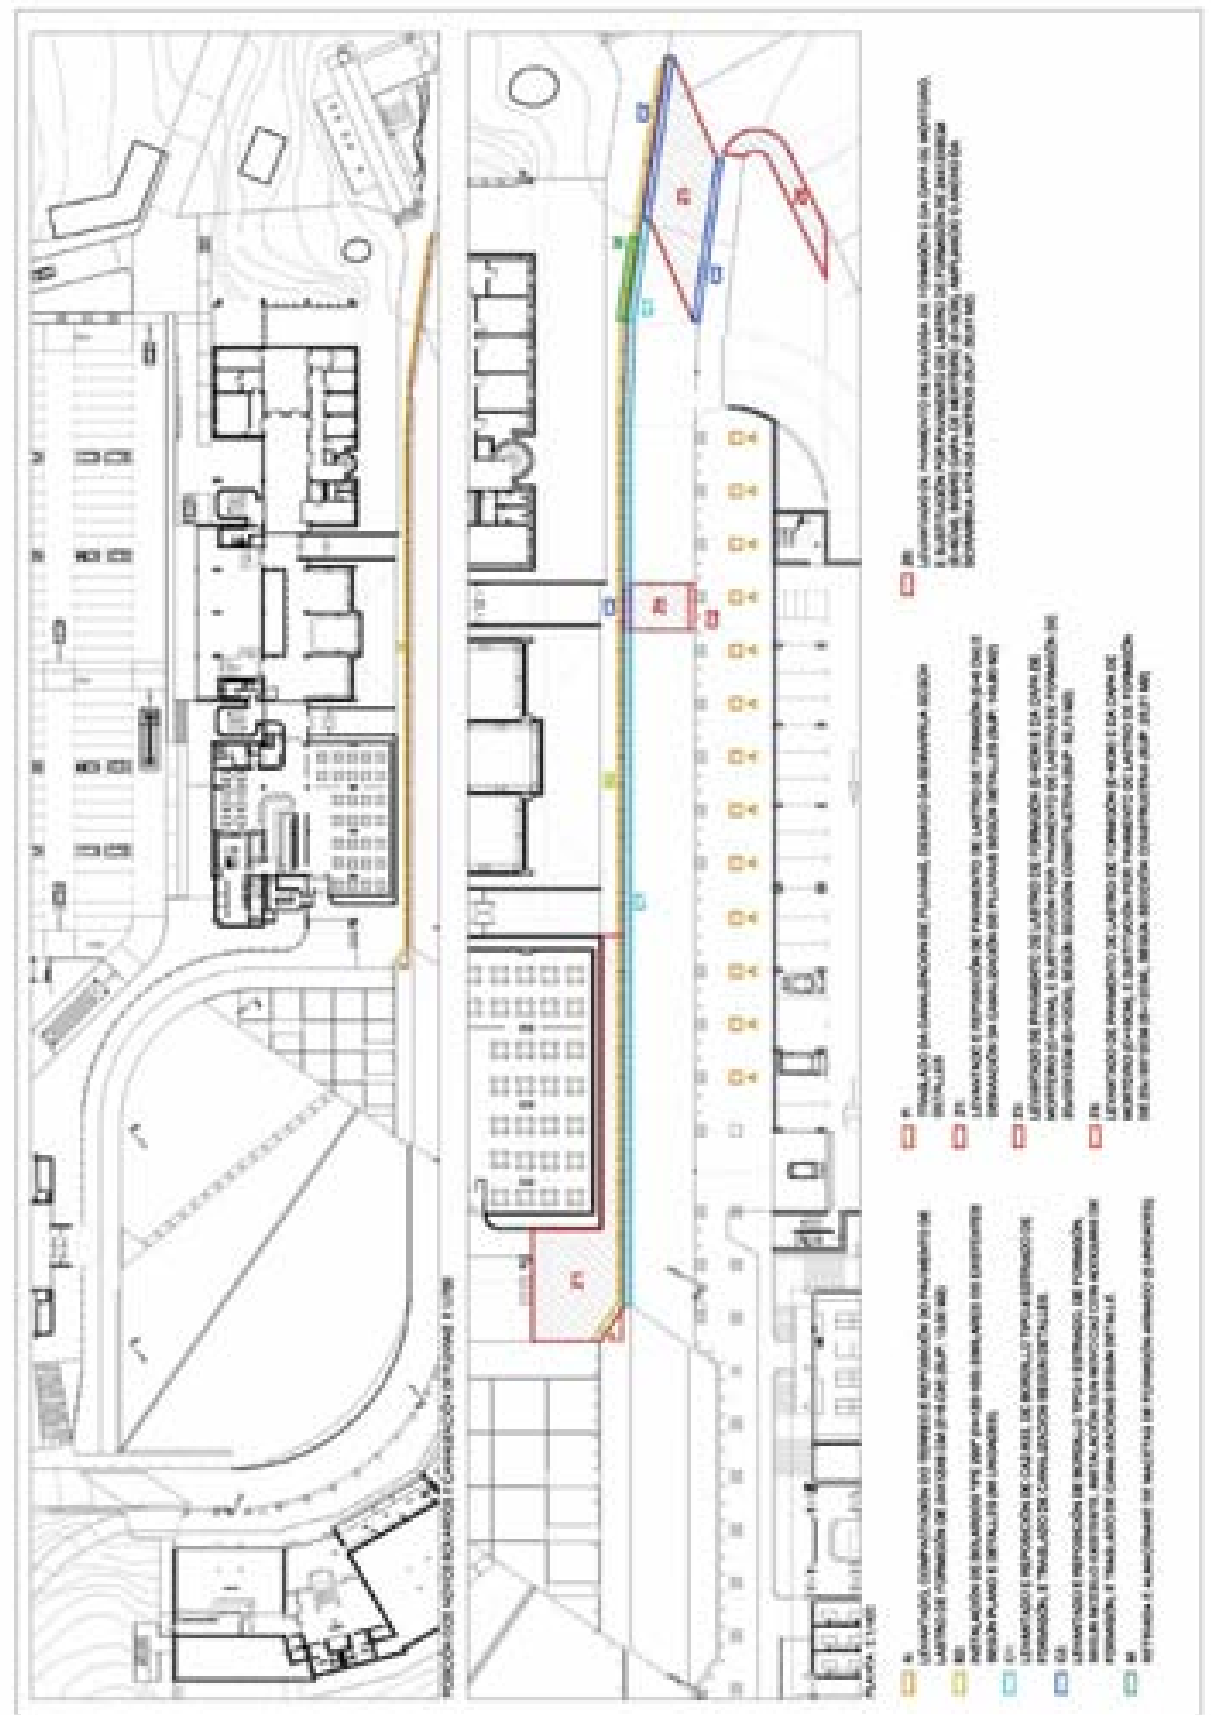

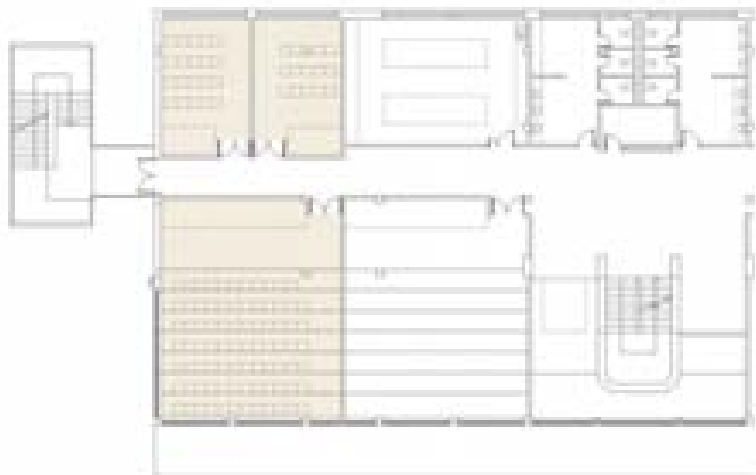

OBRA

REFORMAS NA FACULTADE DE CIENCIAS PARA A SÚA ADAPTACIÓN AO EEES

VICERREITORÍA RESPONSABLE:	Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Vicerreitor: Xosé Lois Martínez Suárez
RESPONSABLE DO SEGUIMENTO DO CONTRATO:	Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos. Roi Salgueiro Barrio, Jesús Manuel Giz Novo e Gabriel Pita da Veiga.
IMPORTE DE LICITACIÓN (IVE INCLÚIDO):	DIVISIÓN DA AULA 12 EN TRES AULAS EEES: 25.172 € CREACIÓN DE 6 NOVAS AULAS – TALLER: 52.000 €
SUPERFICIE CONSTRUIDA:	378,5 m2
EMPRESA CONSTRUTORA:	ATI CORUÑA S.L.
ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA	Roi Salgueiro Barrio
ARQUITECTO TÉCNICO, DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE OBRA:	Gabriel Pita da Veiga
COORDINADOR DE S.S.:	Gabriel Pita da Veiga
DATA DA FOLLA DE PEDIMENTO:	28/04/2010
PRAZO DE EXECUCIÓN:	90 días
ESTADO DAS OBRAS:	OBRA FINALIZADA , RECEPCIONADA 02/08/2010

IMPORTE DE ADXUDICACIÓN (IVE INCLÚIDO):	77.172 €	DIVISIÓN DA AULA 12 EN TRES AULAS EEES: 25.172 €
ORZAMENTO DO REFORMADO:		CREACIÓN DE 6 NOVAS AULAS – TALLER: 52.000 €
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. ORIXINAL ATE A DATA :		CERTIFICADO NA SÚA TOTALIDADE 77.172 €
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. REFORMADO: ATE A DATA :		





CAMPUS DA CORUÑA: ELVIÑA




OBRA

AMPLIACIÓN DO EDIFICIO CITIC


VICERREITORÍA RESPONSABLE:	Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Vicerreitor: Xosé Lois Martínez Suárez	
RESPONSABLE DO SEGUIMENTO DO CONTRATO:	Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos Director: Roi Salgueiro Barrio	
PROXECTO: ARQUITECTO REDACTOR:	Xoán Xosé Casabella López	
IMPORTE DE LICITACIÓN (IVE INCLÚIDO):	1.499.999,99 €	
SUPERFICIE CONSTRUIDA:	1 743,74 m²	
EMPRESA CONSTRUTORA:	COPCISA, SA	
ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA:	Xoán Xosé Casabella López	
ARQUITECTOS TÉCNICOS, DIRECTORES DE EXECUCIÓN DE OBRA:	José Luis Pardo Pérez	
COORDINADOR DE SEGURIDADE E SAÚDE:	José Luis Pardo Pérez	
DATA DE ADXUDICACIÓN DA OBRA:	14/10/2008	
DATA DO CONTRATO:	29/10/2008	
PRAZO DE EXECUCIÓN:	4 meses	
PRAZO EXECUCIÓN DO REFORMADO:	01/07/2010	
DATA DE INICIO DA OBRA:	15/11/2008	
ESTADO DAS OBRAS	OBRA FINALIZADA, RECEPCIONADA 21/10/2010	
IMPORTE DE ADXUDICACIÓN:	1.494.300,00€	Total Orzamento: 1 790 171,24€
ORZAMENTO DO REFORMADO	295.871,24	
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. ORIXINAL ATE A DATA :	1.494.300,00€	Total acreditado ate esta data: 1.790.171,24€ Pendente de liquidación
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. REFORMADO ATE A DATA :	295.871,24€	



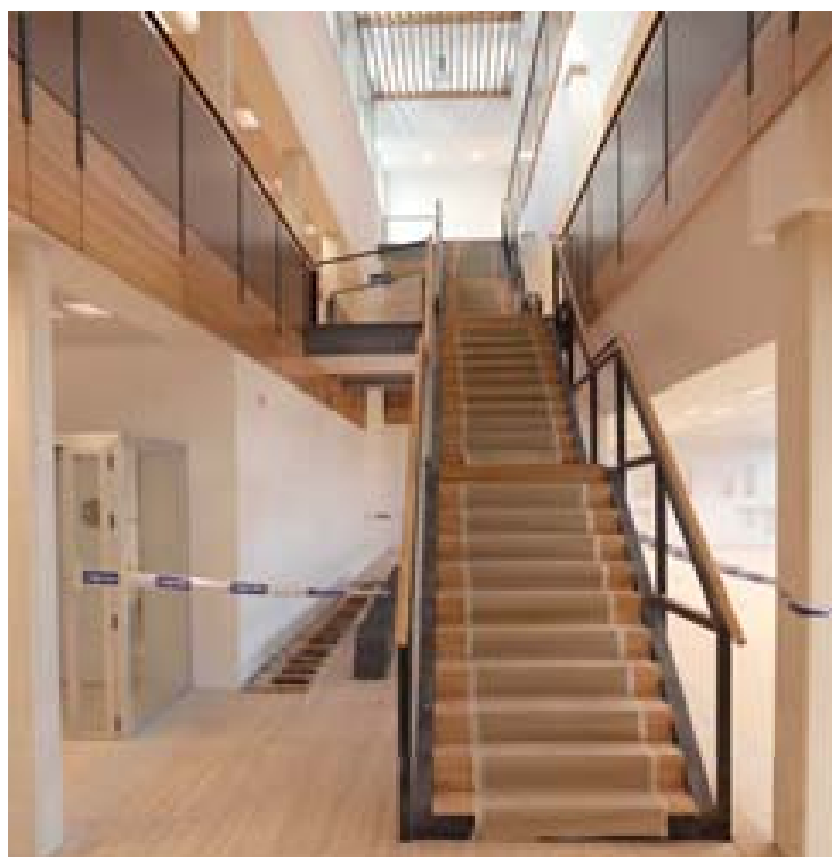

OBRA		
CONSTRUCCIÓN DO CENTRO DE INVESTIGACIÓNS CIENTÍFICAS AVANZADAS		
VICERREITORÍA RESPONSABLE:	Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Vicerreitor: Xosé Lois Martínez Suárez	
RESPONSABLE DO SEGUIMENTO DO CONTRATO:	Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos Director: Roi Salgueiro Barrio	
PROXECTO: ARQUITECTO REDACTOR	Manuel Vázquez Muíño e Angel Rico Painceiras	
IMPORTE DE LICITACIÓN (IVE INCLUÍDO):	5.145.773,35 (con IVE)	
SUPERFICIE CONSTRUIDA:	3798m2	
EMPRESA CONSTRUTORA:	ACCIONA INFRAESTRUTURAS, SA	
ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA:	Manuel Vázquez Muíño e Angel Rico Painceiras	
ARQUITECTOS TÉCNICOS, DIRECTORES DE EXECUCIÓN DE OBRA:	Manuel Santiago López Lamas	
COORDINADOR DE SEGURIDADE E SAÚDE:	Jesús Alberto López Gómez e Angel Rico Painceiras	
DATA DE ADXUDICACIÓN DA OBRA:	14/10/2008	
DATA DO CONTRATO:	29/10/2008	
PRAZO DE EXECUCIÓN:	14 meses contados a partir do día seguinte da sinatura do acta de comprobación de traza	
PRAZO DE EXECUCIÓN REFORMADO:	7 meses contados a partir do día seguinte da sinatura do acta de comprobación de traza	
DATA DE INICIO DA OBRA:	06/11/2008	
DATA PREVISTA DE FINALIZACIÓN:	01/01/2011	
ESTADO DAS OBRAS	En execución.	
IMPORTE DE ADXUDICACIÓN:	4 317 303,84€	Total Orzamento: 5 180 764,60€
ORZAMENTO DO REFORMADO 1	300.915,41 €	Total Orzamento do reformado: 863 460,75 €
ORZAMENTO DO REFORMADO 2	562.545,34 €	
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. ORIXINAL ATE A DATA :	3.682.221,34€	Total acreditado ate esta data: 3.682.221,34€
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. REFORMADO 1 ATE A DATA :		
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. REFORMADO 2 ATE A DATA :		



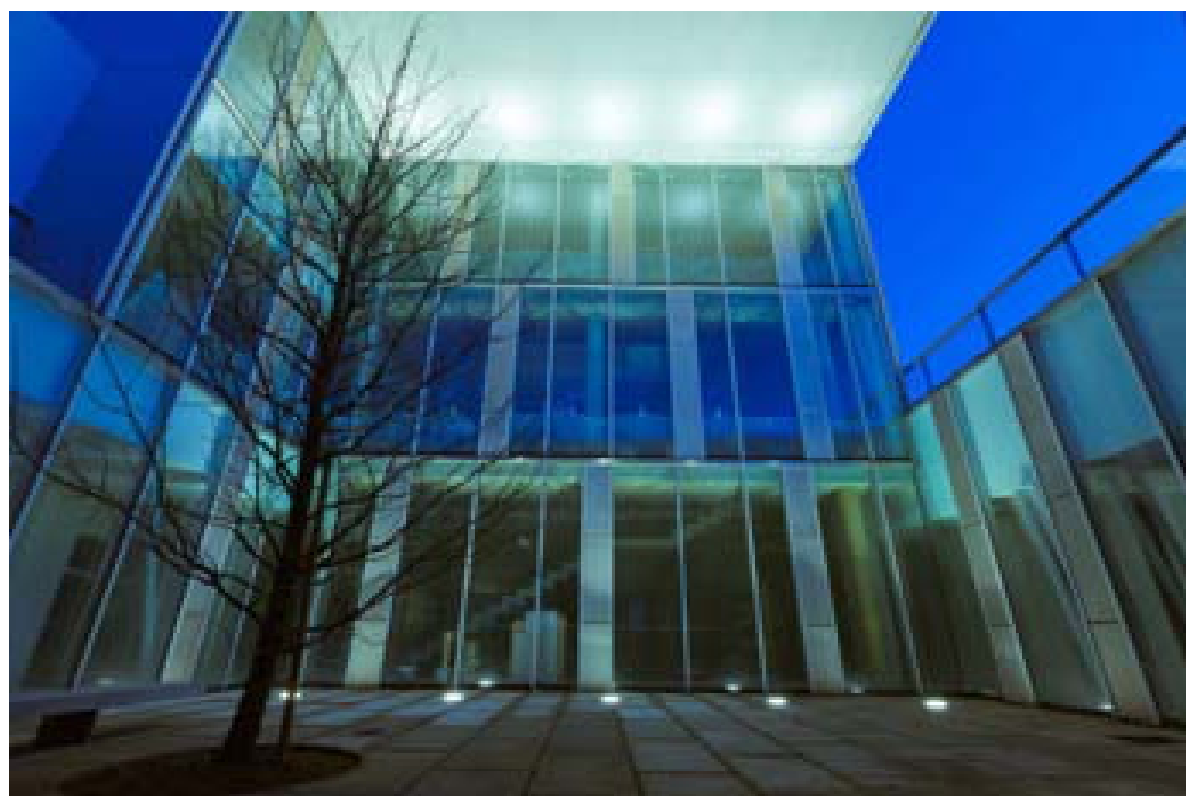



OBRA


AMPLIACIÓN DO EDIFICIO CITEEC

VICERREITORÍA RESPONSABLE:	Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Vicerreitor: Xosé Lois Martínez Suárez	
RESPONSABLE DO SEGUIMENTO DO CONTRATO:	Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos Director: Roi Salgueiro Barrio	
PROXECTO: ARQUITECTOS REDACTORES:	Enxeñeiros e arquitectos consultores IDOM, SA: Julia Míguez Rey e Galo Zayas Carvajal	
IMPORTE DE LICITACIÓN (CON IVE):	5.000.000 €	
SUPERFICIE CONSTRUIDA:	2210 m2	
EMPRESA CONSTRUTORA:	ALDESA CONSTRUCCIONES, SA	
ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA:	Andrés Fernández- Albalat	
ARQUITECTOS TÉCNICOS, DIRECTORES DE EXECUCIÓN DE OBRA:	Pablo Reboredo Canosa e Alfredo Osorio Varela Julia Míguez Rey, Pilar Romero Cajigal e Galo Zayas Carvajal.	
COORDINADOR DE SEGURIDADE E SAÚDE:	Patricia Álvarez Sánchez Orozco	
DATA DE ADXUDICACIÓN DA OBRA:	11/06/2008	
DATA DO CONTRATO:	04/07/2008	
PRAZO DE EXECUCIÓN:	11 meses contados a partir do día seguinte da sinatura do acta de comprobación de traza	
DATA DE INICIO DA OBRA:	09/07/2008	
DATA PREVISTA DE FINALIZACIÓN:	Pendente de definición de prazo co modificado técnico	
ESTADO DAS OBRAS	Pendente de definición do modificado técnico	
ORZAMENTO DO PROXECTO:	4 115 500,00€	Total Orzamento: 4 937 165,73€
ORZAMENTO DE REFORMADO 1:	496 710,04 €	
ORZAMENTO DE REFORMADO 2:	324 955,69 €	
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. ORIXINAL ATE A DATA :	1.781.524,89€	Total acreditado ate esta data: 2.522.606,32€
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. REFORMADO nº1 ATE A DATA :	416 125,74€	
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. REFORMADO nº2 ATE A DATA :	324 955,69€	








OBRA		
ÁREA CIENTÍFICA DO PARQUE TECNOLÓXICO DA UDC		
VICERREITORÍA RESPONSABLE:	Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Vicerreitor: Xosé Lois Martínez Suárez	
RESPONSABLE DO SEGUIMENTO DO CONTRATO:	Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos Director: Roi Salgueiro Barrio	
PROXECTO: ARQUITECTO REDACTOR:	César Portela Fernández- Jardón e César Padrón Conde	
IMPORTE DE LICITACIÓN (IVE INCLUÍDO):	4.000.000,00 €	
SUPERFICIE CONSTRUIDA:	4.314,03 m2	
EMPRESA CONSTRUTORA:	DRAGADOS SA	
ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA:	César Portela Fernández- Jardón e César Padrón Conde	
ARQUITECTOS TÉCNICOS, DIRECTORES DE EXECUCIÓN DE OBRA:	Pablo Reboredo Canosa	
COORDINADOR DE SEGURIDADE E SAÚDE:	Alfredo Osorio Varela	
DATA DE ADXUDICACIÓN DA OBRA:	18/12/2009	
DATA DO CONTRATO:	30/12/2009	
PRAZO DE EXECUCIÓN:	13 meses	
DATA DE INICIO DA OBRA:	15/01/2010	
DATA PREVISTA DE FINALIZACIÓN:	15/02/2011	
ESTADO DAS OBRAS:	En execución	
IMPORTE DE ADXUDICACIÓN:	3.291.600,00 €	Total Orzamento: 3.291.600,00 €
ORZAMENTO DO REFORMADO:		
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. ORIXINAL ATE A DATA :	1.976.241,16€	Total acreditado ate esta data: 1.976.241,16€
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. REFORMADO ATE A DATA :		

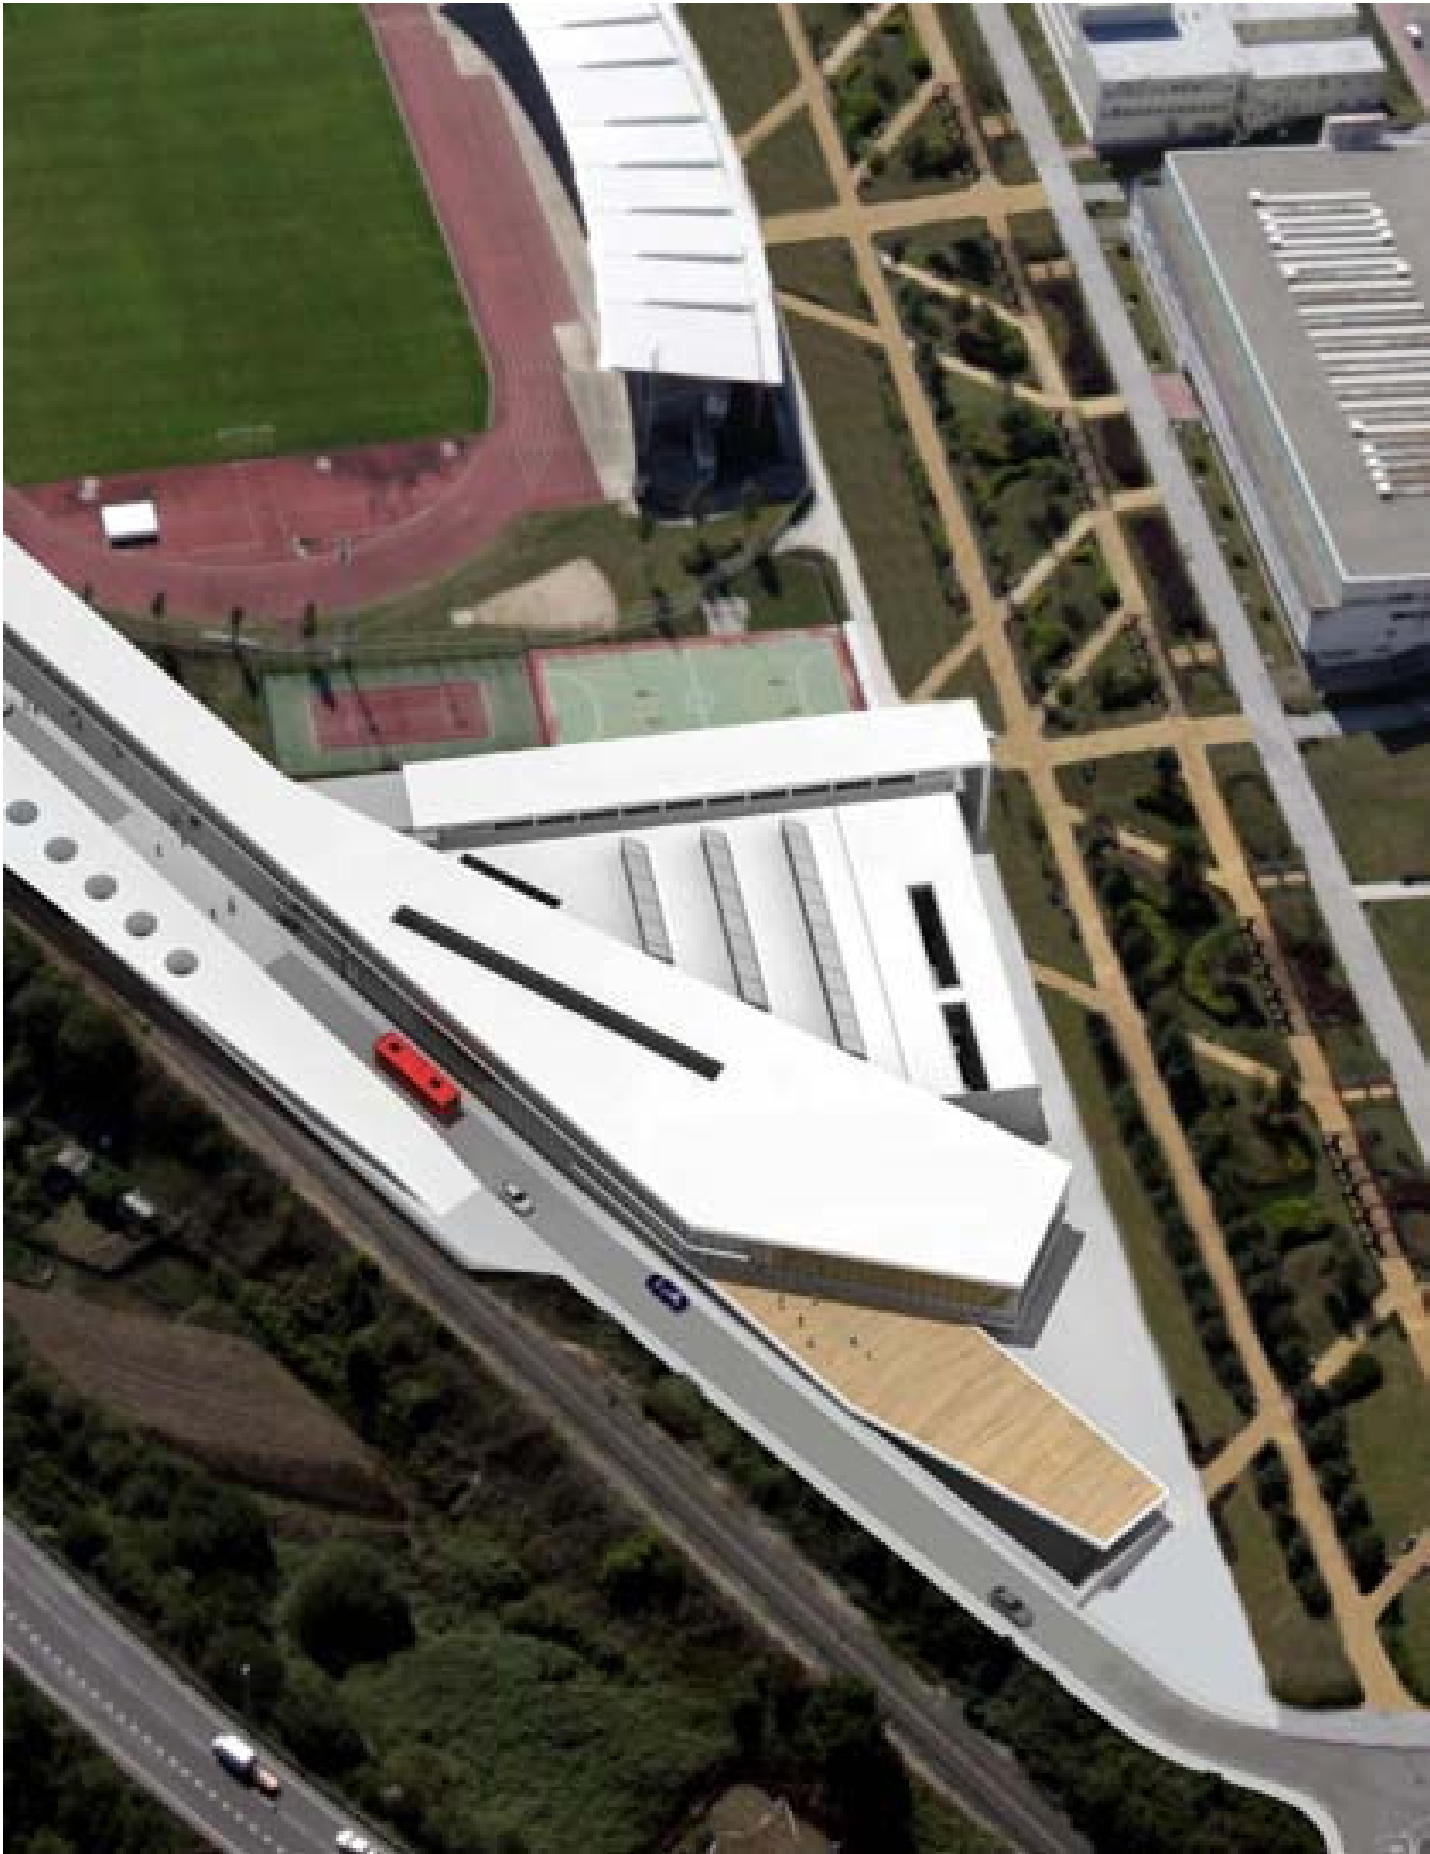

OBRA		
OBRA DE ACCIONS PREVIAS, CIMENTACIONS, SOTERRAMENTO DE INSTALACIONS E ALUMEADO DA AREA DEPORTIVA E DAS PISTAS, DO CAMPUS CENTER		
VICERREITORÍA RESPONSABLE	Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Vicerreitor: Xosé Lois Martínez Suárez	
RESPONSABLE DO SEGUIMENTO DO CONTRATO	Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos Director: Roi Salgueiro Barrio	
PROXECTO: ARQUITECTO REDACTOR:	Juán López Villanueva	
IMPORTE DE LICITACIÓN (IVE INCLUÍDO):	1.404.200 €	
SUPERFICIE CONSTRUIDA:		
EMPRESA CONSTRUTORA:		
ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA		
ARQUITECTO TÉCNICO, DIRECTOR DE EXECUCIÓN DE OBRA:		
COORDINADOR DE SEGURIDADE E SAÚDE:		
DATA DE ADXUDICACIÓN DA OBRA:	Sen adxudicar	
DATA DO CONTRATO:		
PRAZO DE EXECUCIÓN:		
DATA DE INICIO DA OBRA:		
ESTADO DAS OBRAS:		
IMPORTE ADXUDICACIÓN:		
ORZAMENTO DO REFORMADO		
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. ORIXINAL ATE A DATA :		
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. REFORMADO ATE A DATA :		

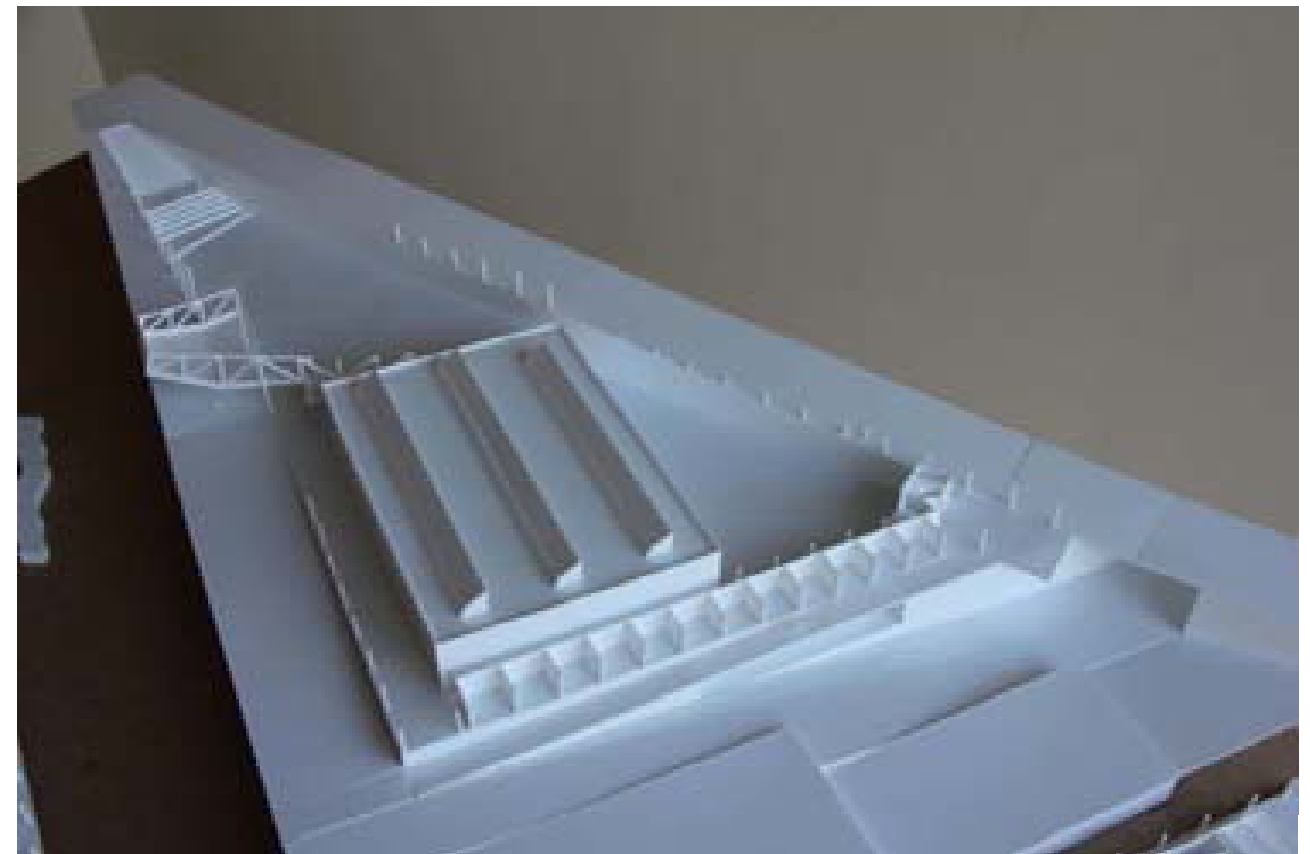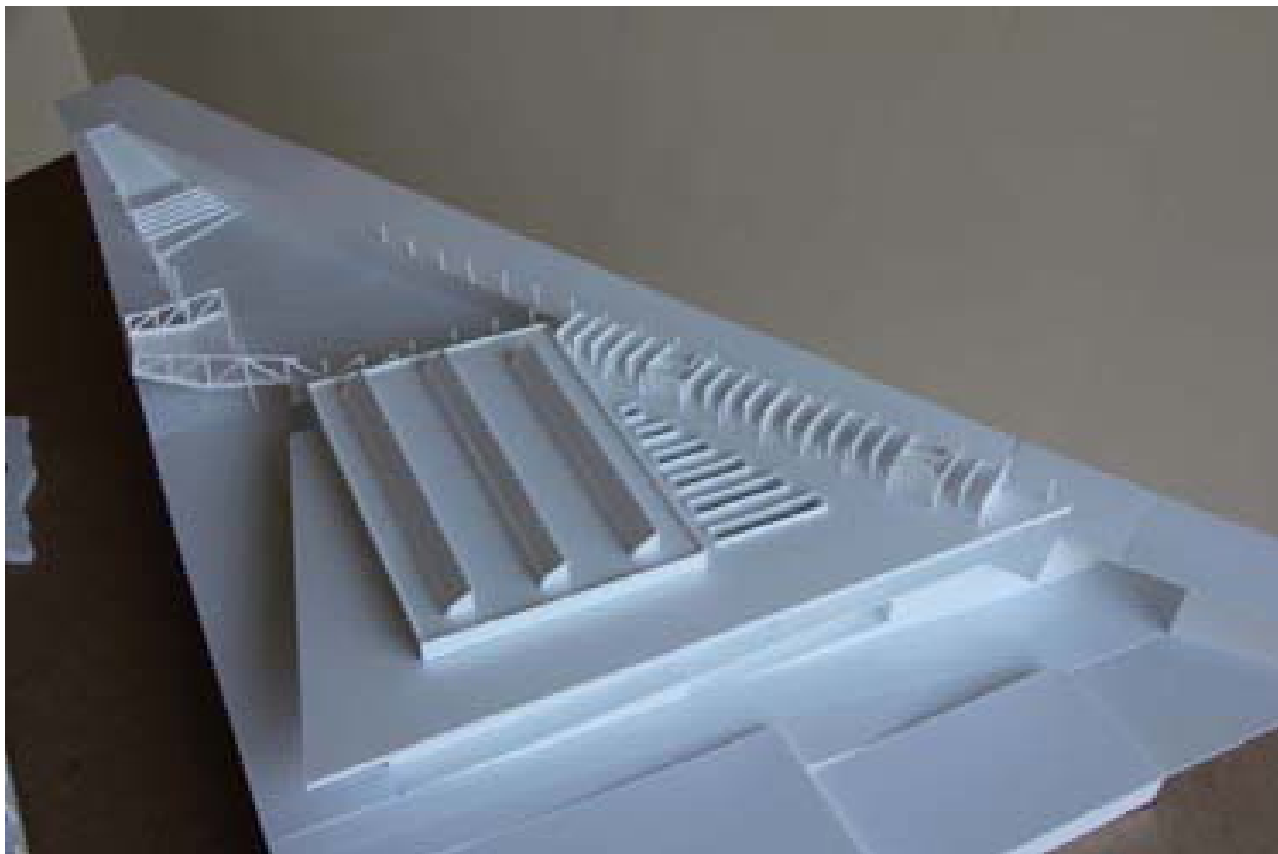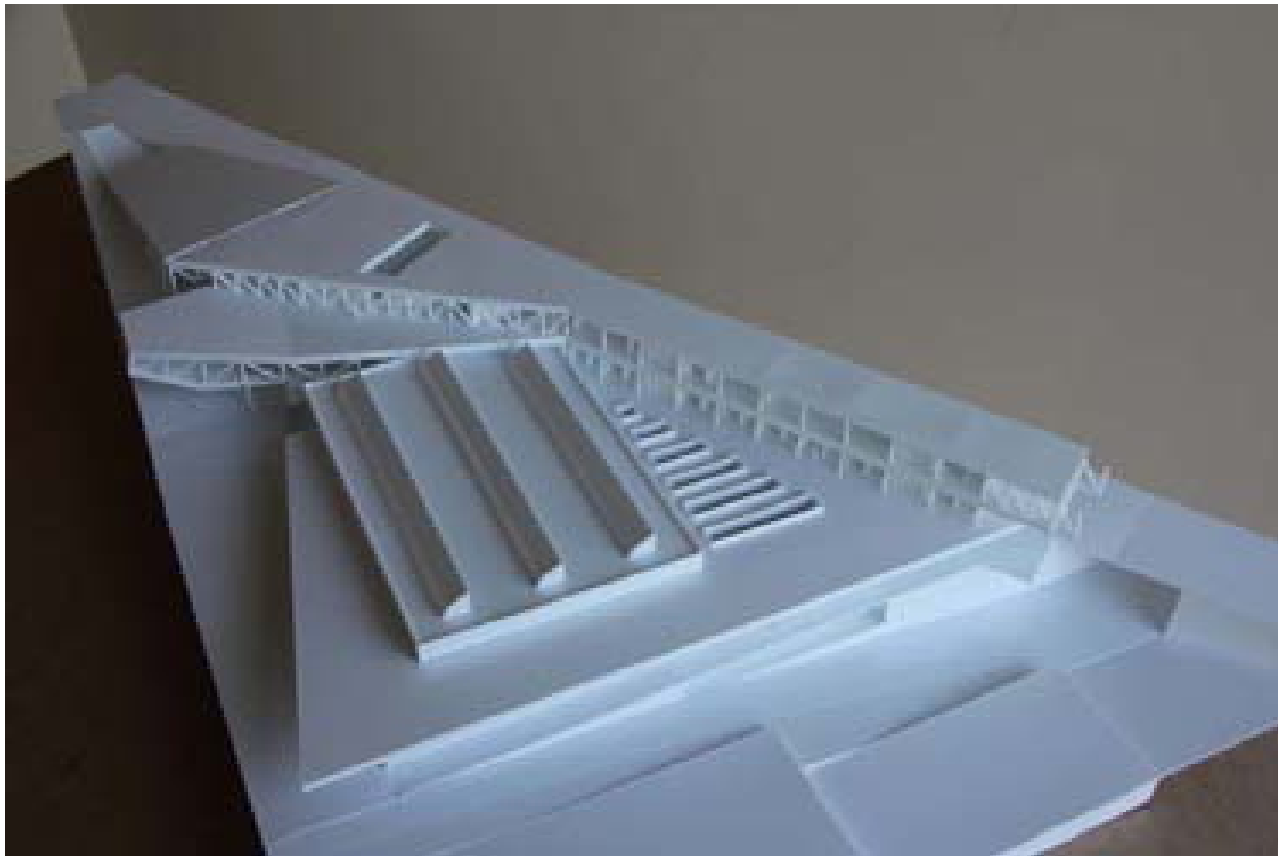






OBRA		
OFICINAS BANCARIAS E SERVICIOS UNIVERSITARIOS		
VICERREITORÍA RESPONSABLE:	Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Vicerreitor: Xosé Lois Martínez Suárez	
RESPONSABLE DO SEGUIMENTO DO CONTRATO:	Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos Director: Roi Salgueiro Barrio	
PROXECTO: ARQUITECTO REDACTOR:	Jesus Irrisarri	
IMPORTE DE LICITACIÓN (IVE INCLUÍDO):	300.000 €	
SUPERFICIE CONSTRUIDA:		
EMPRESA CONSTRUTORA:		
DATA DE INICIO DA OBRA:		
ESTADO DAS OBRAS		
IMPORTE DE ADXUDICACIÓN:		Total Orzamento:
ORZAMENTO DO REFORMADO		
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. ORIXINAL ATE A DATA :		
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. REFORMADO ATE A DATA :		



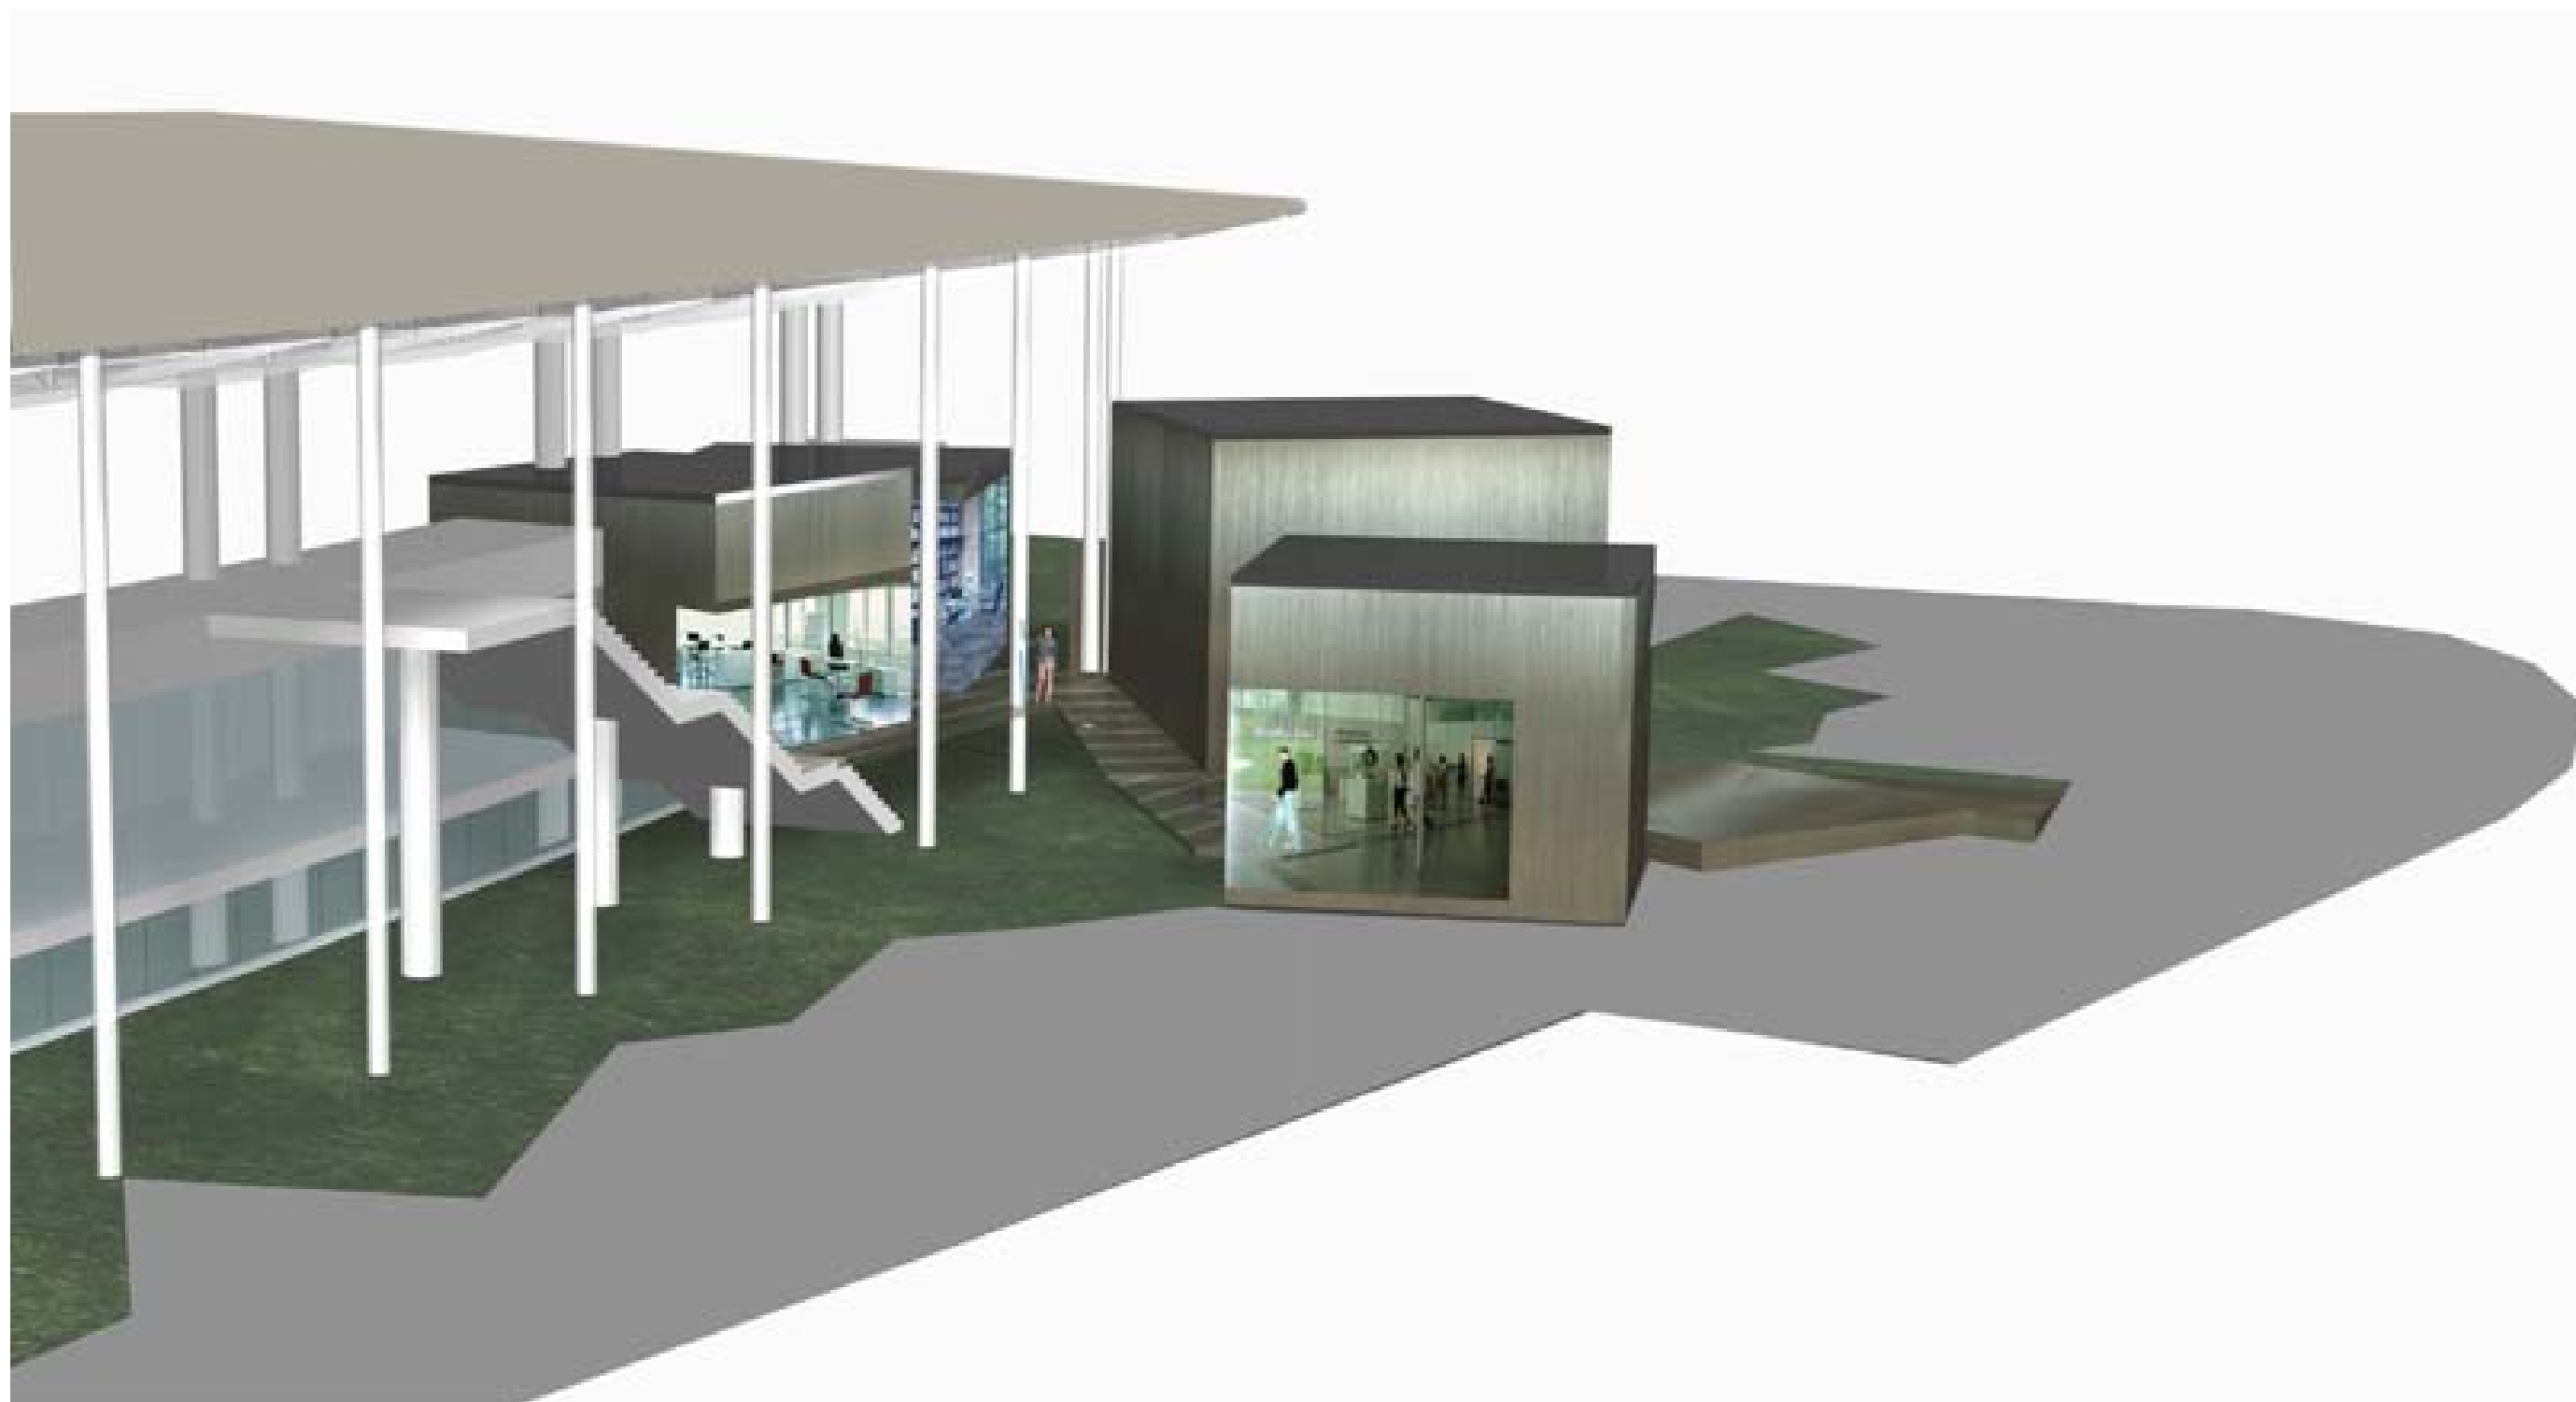







OBRA

REFORMA FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN
PARA A SÚA ADAPTACIÓN Ó EEES

VICERREITORÍA RESPONSABLE:	Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Vicerreitor: Xosé Lois Martínez Suárez	
RESPONSABLE DO SEGUIMENTO DO CONTRATO:	Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos Director: Roi Salgueiro Barrio	
PROXECTO: ARQUITECTO REDACTOR:	Andrés Fernández -Albalat	
IMPORTE DE LICITACIÓN (IVE INCLÚIDO):	487.687,47 €	
SUPERFICIE CONSTRUIDA:	565,10 m2	
EMPRESA CONSTRUTORA:	CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS HERCULINAS SA Y PINTURAS, RESTAURACIONES Y REVESTIMIENTOS S.L., Y UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS	
ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA:	Andrés Fernández- Albalat	
ARQUITECTOS TÉCNICOS, DIRECTORES DE EXECUCIÓN DE OBRA:	Roberto Medín Guyatt	
COORDINADOR DE SEGURIDADE E SAÚDE:	Roberto Medín Guyatt	
DATA DE ADXUDICACIÓN DA OBRA:	22/01/2010	
DATA DO CONTRATO:	03/02/2010	
PRAZO DE EXECUCIÓN:	90 días naturais	
PRAZO EXECUCIÓN DO REFORMADO:		
DATA DE INICIO DA OBRA:	12/06/2010	
ESTADO DAS OBRAS	OBRA FINALIZADA, RECEPCIONADA 21/06/2010	
IMPORTE DE ADXUDICACIÓN:	340.808,00 €	Total Orzamento: 340.808,00 €
ORZAMENTO DO REFORMADO:		
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. ORIXINAL ATE A DATA :	375.074,61€	CERTIFICADO NA SÚA TOTALIDADE 375.074,61€
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. REFORMADO ATE A DATA :		









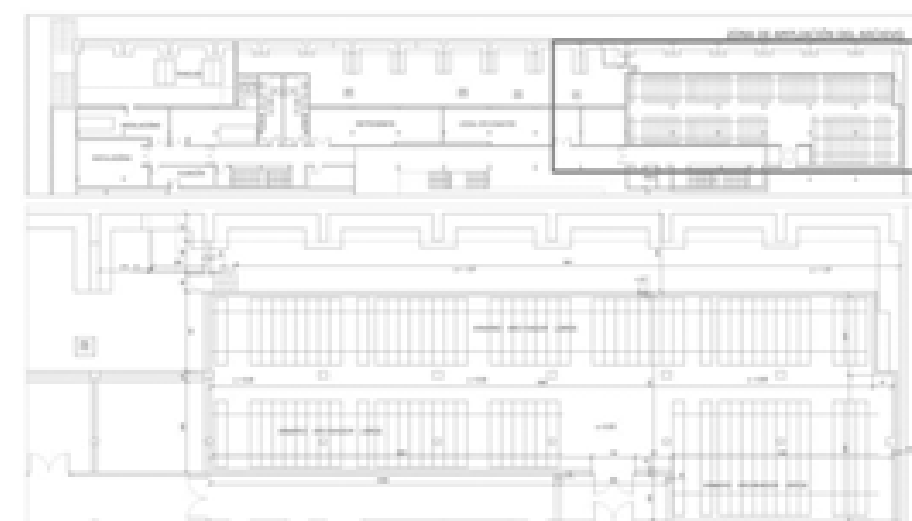
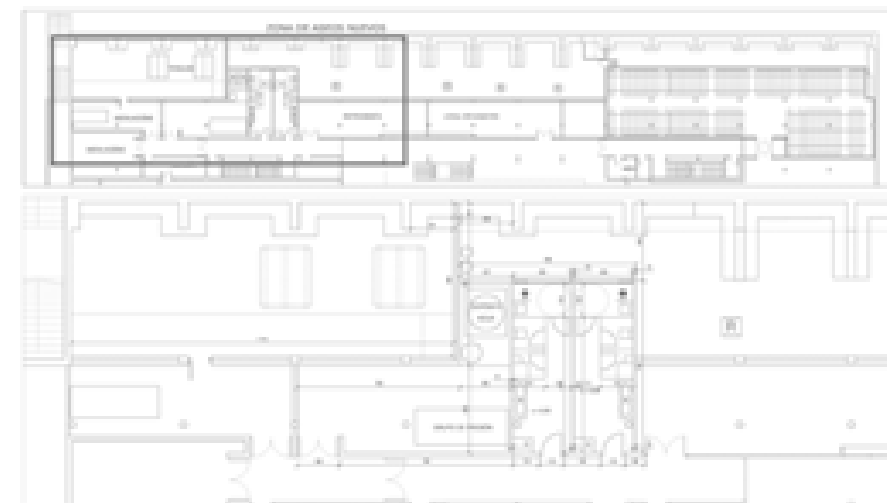


OBRA

REFORMA DA FACULTADE DE DEREITO PARA A SÚA ADAPTACIÓN Ó EEES FASE 1

VICERREITORÍA RESPONSABLE	Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Vicerreitor: Xosé Lois Martínez Suárez	
RESPONSABLE DO SEGUIMENTO DO CONTRATO	Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos Director: Roi Salgueiro Barrio	
PROXECTO: ARQUITECTO REDACTOR:	Elena Sarmiento Díez e Adrián Martín Prieto	
IMPORTE DE LICITACIÓN (IVE INCLÚIDO):	499.990,89 €	
SUPERFICIE CONSTRUIDA:	1207 m2	
EMPRESA CONSTRUTORA:	CONSTRUCCIONES RIOTORTO S.L.	
ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA	Elena Sarmiento Díez	
ARQUITECTO TÉCNICO, DIRECTOR DE EXECUCIÓN DE OBRA:	Óscar Fidalgo Longueira	
COORDINADOR DE SEGURIDADE E SAÚDE:	Óscar Fidalgo Longueira	
DATA DE ADXUDICACIÓN DA OBRA:	12/01/2010	
DATA DO CONTRATO:	14/01/2010	
PRAZO DE EXECUCIÓN:	210 días naturais contados a partir do día seguinte da sinatura do acta de comprobación de traza	
PRAZO EXECUCIÓN DO REFORMADO:	15 días sumados ao prazo orixinal	
DATA DE INICIO DA OBRA:	26/01/2010	
ESTADO DAS OBRAS:	OBRA FINALIZADA, RECEPCIONADA 23/09/2010	
IMPORTE ADXUDICACIÓN:	399.992,71 €	Total orzamento final: 399.992,71 €
ORZAMENTO DO REFORMADO		
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. ORIXINAL ATE A DATA :	387.211,63	Total acreditado ate esta data: 387.211,63 €
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. REFORMADO ATE A DATA :		

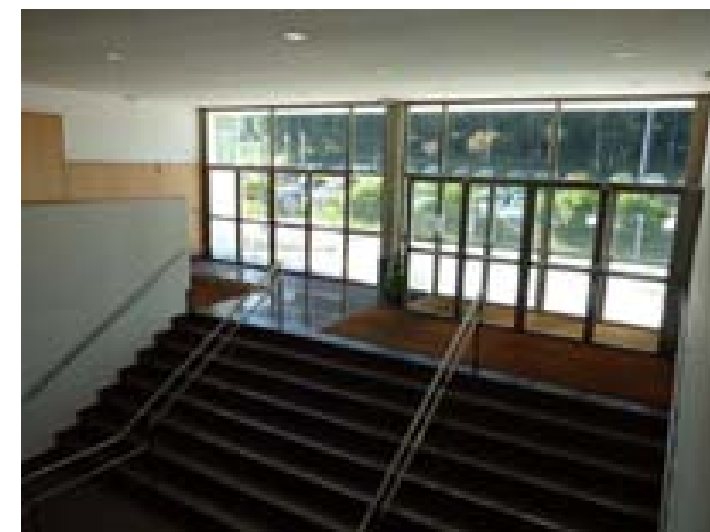

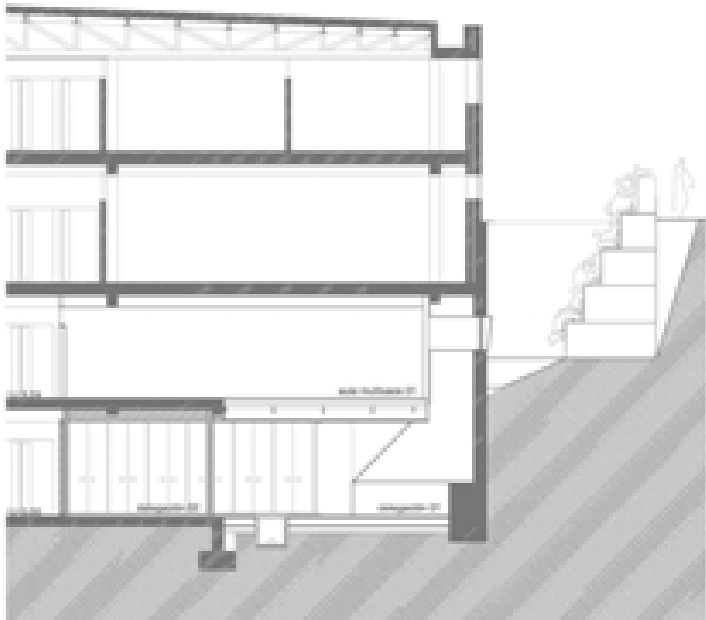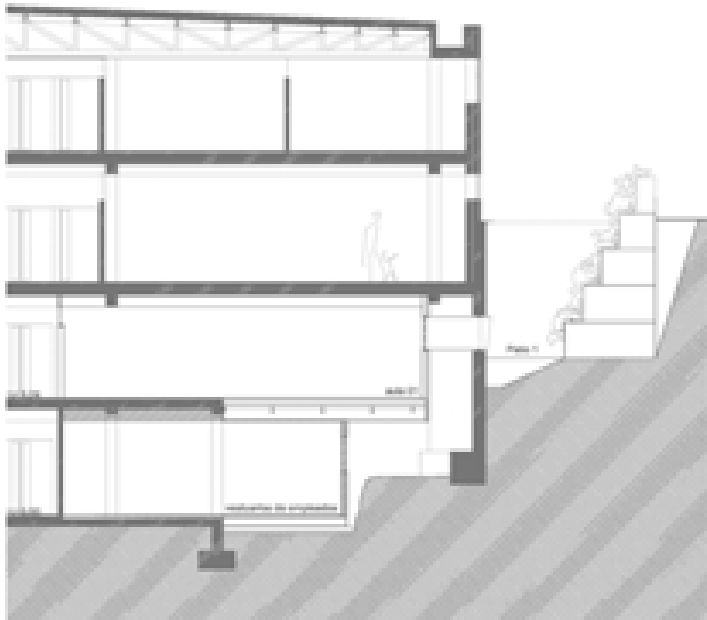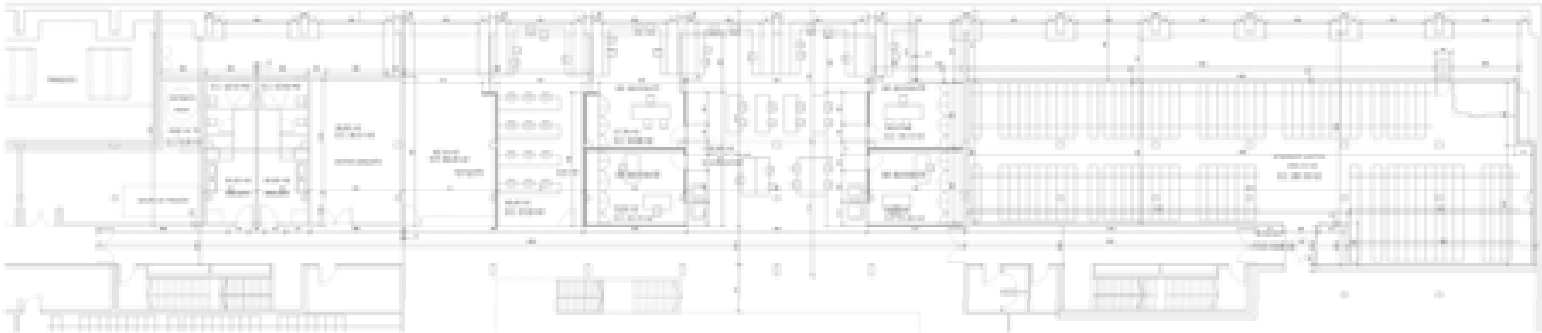

OBRA		
REFORMA DA FACULTADE DE DEREITO PARA A SÚA ADAPTACIÓN Ó EEES FASE 2-ESPACIO EXTERIOR		
VICERREITORÍA RESPONSABLE	Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Vicerreitor: Xosé Lois Martínez Suárez	
RESPONSABLE DO SEGUIMENTO DO CONTRATO	Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos Director: Roi Salgueiro Barrio	
PROXECTO: ARQUITECTO REDACTOR:	Elena Sarmiento Díez e Adrián Martín Prieto	
IMPORTE DE LICITACIÓN (IVE INCLÚIDO):	235.974, 48€	
SUPERFICIE CONSTRUIDA:	696,27 m2	
EMPRESA CONSTRUTORA:	Neor. S.A.	
ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA		
ARQUITECTO TÉCNICO, DIRECTOR DE EXECUCIÓN DE OBRA:		
COORDINADOR DE SEGURIDADE E SAÚDE:		
DATA DE ADXUDICACIÓN DA OBRA:	22/11/2010	
DATA DO CONTRATO:		
PRAZO DE EXECUCIÓN:		
PRAZO EXECUCIÓN DO REFORMADO:		
DATA DE INICIO DA OBRA:		
ESTADO DAS OBRAS:		
IMPORTE ADXUDICACIÓN:	210.135,27 €	Total orzamento final:
ORZAMENTO DO REFORMADO		
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. ORIXINAL ATE A DATA :		Total acreditado ate esta data:
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. REFORMADO ATE A DATA :		



REFORMA DA FACULTADE DE DEREITO PARA A SÚA ADAPTACIÓN AO ESPAZO EUROPEO DE ENSINANZA SUPERIOR
Universidade da Coruña





OBRA		
PINTADO DA FACULTADE DE DEREITO		
VICERREITORÍA RESPONSABLE	Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Vicerreitor: Xosé Lois Martínez Suárez	
RESPONSABLE DO SEGUIMENTO DO CONTRATO	Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos Director: Roi Salgueiro Barrio	
PROXECTO: ARQUITECTO REDACTOR:	Elena Sarmiento Díez e Adrián Martín Prieto	
IMPORTE DE LICITACIÓN (IVE INCLUÍDO):	93.125,55 €	
SUPERFICIE CONSTRUIDA:		
EMPRESA CONSTRUTORA:	Decoraciones Grela S.L.	
ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA		
ARQUITECTO TÉCNICO, DIRECTOR DE EXECUCIÓN DE OBRA:		
COORDINADOR DE SEGURIDADE E SAÚDE:	Ana Gallego Nuñez	
DATA DE ADXUDICACIÓN DA OBRA:	13-08-2009	
DATA DO CONTRATO:	14-12-2009	
PRAZO DE EXECUCIÓN:	3 meses	
PRAZO EXECUCIÓN DO REFORMADO:	Suspendido ate o remate das obras doutra empresa constructora nos sótanos do edificio	
DATA DE INICIO DA OBRA:	01-02-2010	
ESTADO DAS OBRAS:	Sen rematar	
IMPORTE ADXUDICACIÓN:	93.121,55 €	Total orzamento final: 78.873,44 €
ORZAMENTO DO REFORMADO		
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. ORIXINAL ATE A DATA :	78.873,44 €	Total acreditado ate esta data: 78.873,44 €
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. REFORMADO ATE A DATA :		









OBRA

ADMINISTRACION CONXUNTA ECONÓMICAS-
EMPRESARIAIS

VICERREITORÍA RESPONSABLE	Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Vicerreitor: Xosé Lois Martínez Suárez	
RESPONSABLE DO SEGUIMENTO DO CONTRATO	Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos Director: Roi Salgueiro Barrio	
PROXECTO: ARQUITECTO REDACTOR:	Roi Salgueiro Barrio	
IMPORTE DE LICITACIÓN (IVE INCLUÍDO):		
SUPERFICIE CONSTRUIDA:		
EMPRESA CONSTRUTORA:	Interiores Galicia S.L.	
ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA	Roi Salgueiro Barrio	
ARQUITECTO TÉCNICO, DIRECTOR DE EXECUCIÓN DE OBRA:	Gabriel Pita da Veiga Vazquez	
ESTADO DAS OBRAS:		
IMPORTE ADXUDICACIÓN:	28.903,78 €	Total orzamento final:
ORZAMENTO DO REFORMADO		
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. ORIXINAL ATE A DATA :		Total acreditado ate esta data:
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. REFORMADO ATE A DATA :		

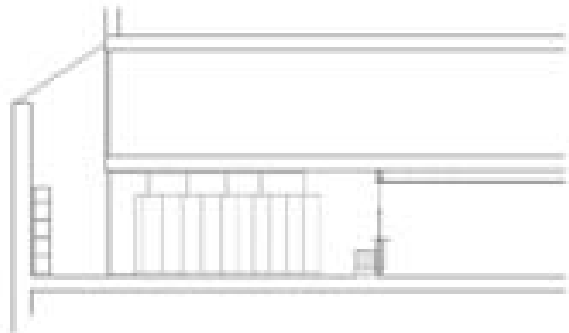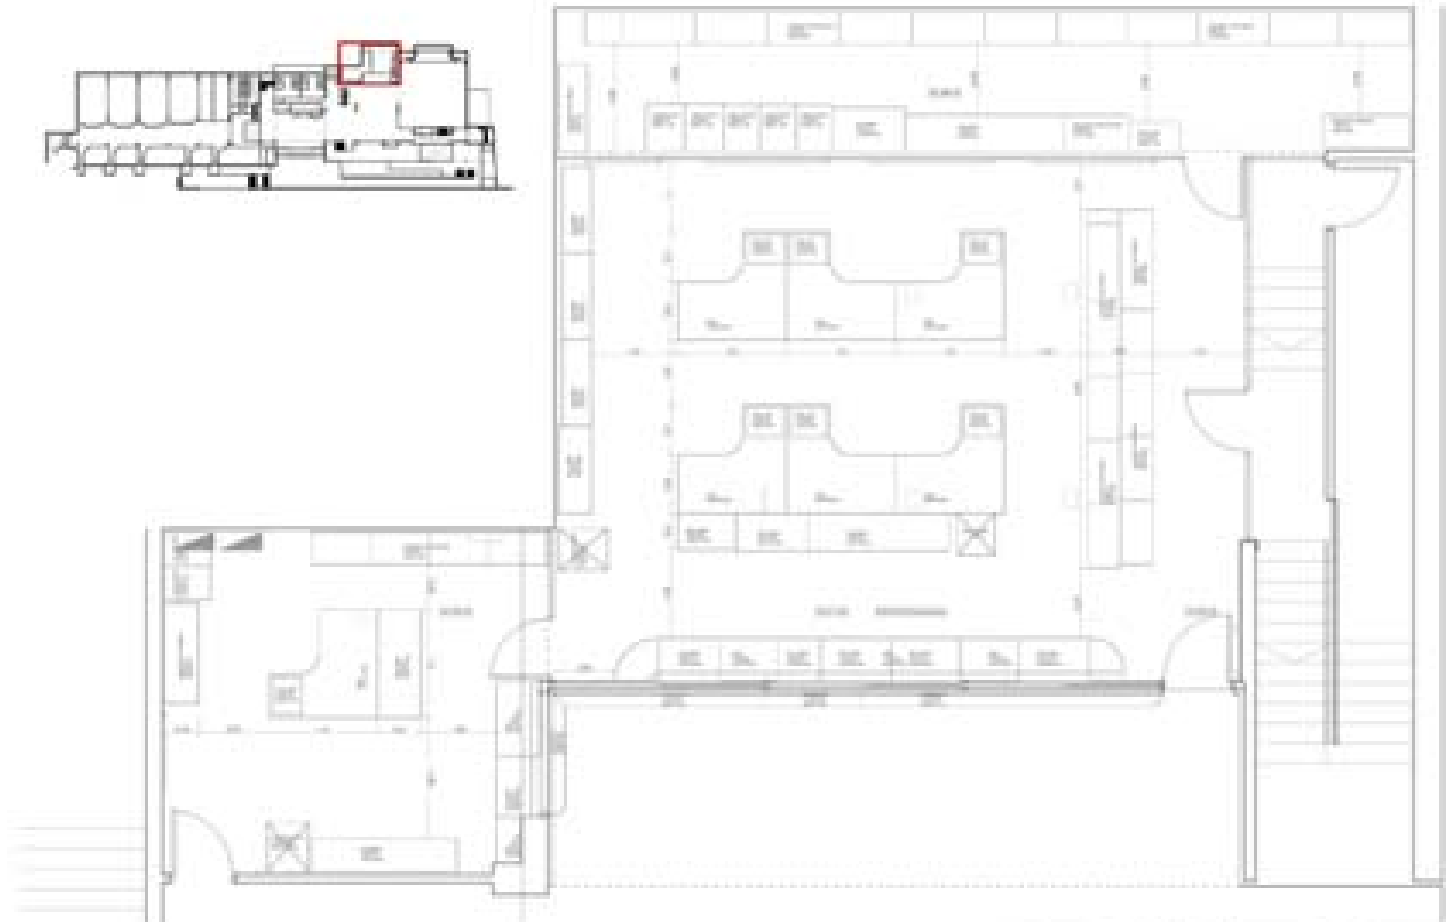




OBRA

RESTAURACIÓN EXTERIOR DO LAGAR

VICERREITORÍA RESPONSABLE:	Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Vicerreitor: Xosé Lois Martínez Suárez	
RESPONSABLE DO SEGUIMENTO DO CONTRATO:	Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos Director: Roi Salgueiro Barrio	
PROXECTO: ARQUITECTOS REDACTORES:	Daniel Beiras García - Sabell e David Estany Garea	
IMPORTE DE ADXUCACIÓN (IVE INCLUÍDO):	230.319,11 €	
SUPERFICIE CONSTRUIDA:	364 m²	
EMPRESA CONSTRUTORA:	NEOR, SA	
ARQUITECTOS DIRECTORES DE OBRA	Daniel Beiras García - Sabell e David Estany Garea	
ARQUITECTO TECNICO, DIRECTOR DE EXECUCIÓN DE OBRA :	Ana Couceiro González	
COORDINADOR DE SEGURIDADE E SAÚDE:	Ana Couceiro González	
DATA DE ADXUDICACIÓN DA OBRA:	03/12/2009	
DATA DO CONTRATO:	13/12/2009	
PRAZO DE EXECUCIÓN:	Dos meses e vintetres días	
PRAZO EXECUCIÓN DO REFORMADO:	Ata 30/06/2010	
DATA DE INICIO DA OBRA:	25/01/2010	
ESTADO DAS OBRAS:	OBRA FINALIZADA, RECEPCIONADA 23/09/2010	
ORZAMENTO INICIAL:	224.445,98 €	Total Orzamento: 224.445,98 €
ORZAMENTO DO REFORMADO		
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. ORIXINAL ATE A DATA :	223.266,08 €	223.266,08 € Pendente de liquidación
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. REFORMADO ATE A DATA :		

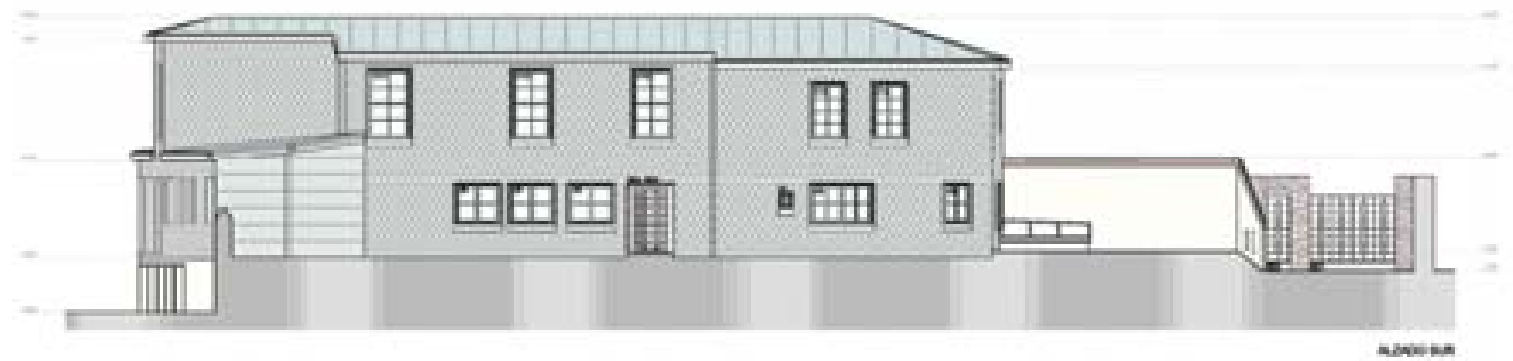



PROXECTO		
REURBANIZACION DO CONTORNO DO LAGAR		
VICERREITORÍA RESPONSABLE	Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Vicerreitor: Xosé Lois Martínez Suárez	
RESPONSABLE DO SEGUIMENTO DO CONTRATO	Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos Director: Roi Salgueiro Barrio	
PROXECTO: ARQUITECTO REDACTOR:	Daniel Beiras García-Sabell David Estany Garea	
IMPORTE DE LICITACIÓN (IVE INCLUÍDO):		
SUPERFICIE CONSTRUIDA:	5.110,74 m2	
EMPRESA CONSTRUTORA:	Oficina Galega de Proxectos Arquitectónicos S. L.	
ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA		
ARQUITECTO TÉCNICO, DIRECTOR DE EXECUCIÓN DE OBRA:		
COORDINADOR DE SEGURIDADE E SAÚDE:		
DATA DE ADXUDICACIÓN DA OBRA:		
DATA DO CONTRATO:		
PRAZO DE EXECUCIÓN:		
PRAZO EXECUCIÓN DO REFORMADO:		
DATA DE INICIO DA OBRA:		
ESTADO DAS OBRAS:		
IMPORTE ADXUDICACIÓN:	15.246,52 €	Total orzamento final:
ORZAMENTO DO REFORMADO		Total acreditado ate esta data:
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. ORIXINAL ATE A DATA :		
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. REFORMADO ATE A DATA :		









PROXECTO




ADAPTACIÓN EESS FACULTADE DE INFORMÁTICA,
AULAS

VICERREITORÍA RESPONSABLE	Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Vicerreitor: Xosé Lois Martínez Suárez	
RESPONSABLE DO SEGUIMENTO DO CONTRATO	Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos Director: Roi Salgueiro Barrio	
PROXECTO: ARQUITECTO REDACTOR:	Flavia Piñeiro Ces	Paula Souto Cañas
IMPORTE DE LICITACIÓN (IVE INCLÚIDO):		
SUPERFICIE CONSTRUIDA:	306 m2	
EMPRESA CONSTRUTORA:		
ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA		
ARQUITECTO TÉCNICO, DIRECTOR DE EXECUCIÓN DE OBRA:		
COORDINADOR DE SEGURIDADE E SAÚDE:		
DATA DE ADXUDICACIÓN DA OBRA:		
DATA DO CONTRATO:		
PRAZO DE EXECUCIÓN:		
PRAZO EXECUCIÓN DO REFORMADO:		
DATA DE INICIO DA OBRA:		
ESTADO DAS OBRAS:		
IMPORTE ADXUDICACIÓN:	2.568,05 €	Total orzamento final:
ORZAMENTO DO REFORMADO		
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. ORIXINAL ATE A DATA :		Total acreditado ate esta data:
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. REFORMADO ATE A DATA :		

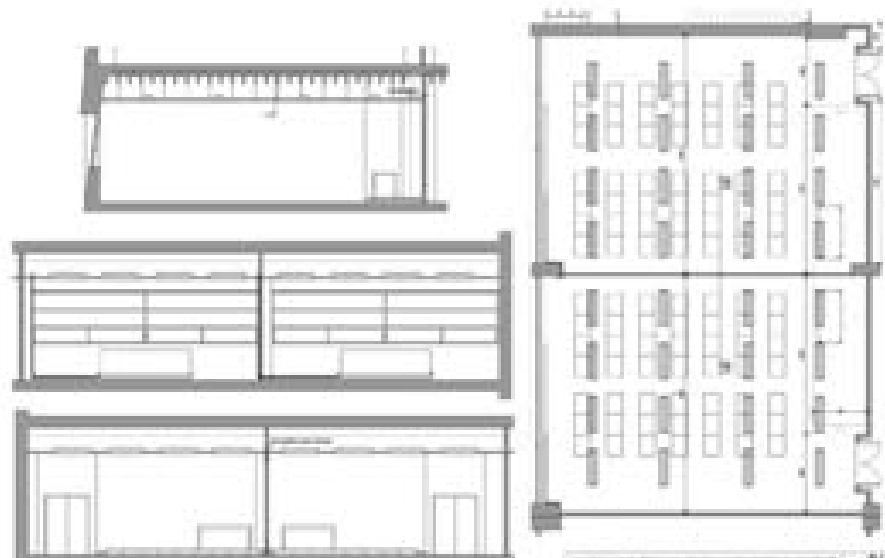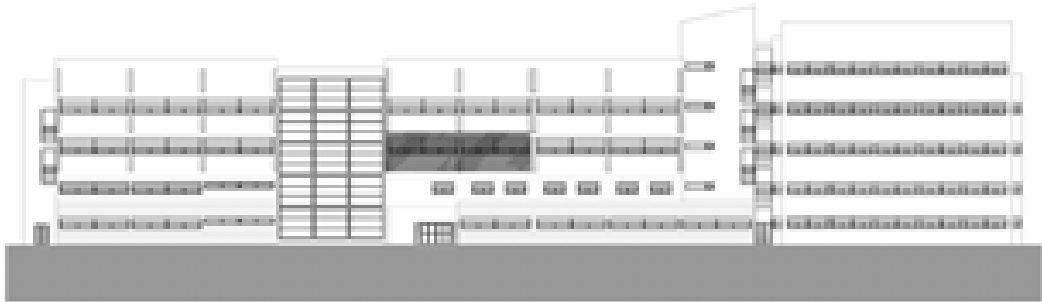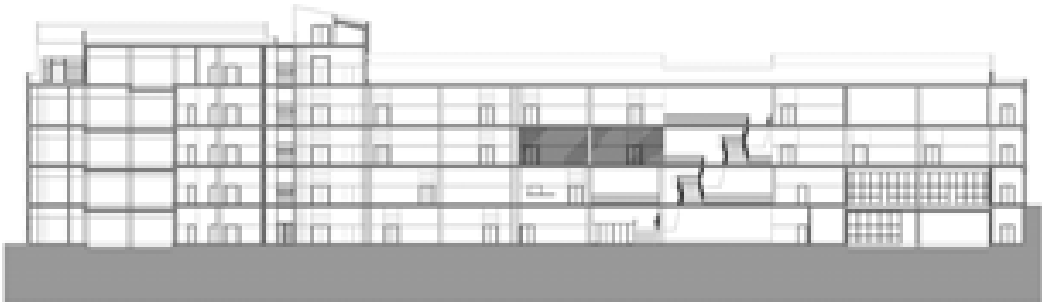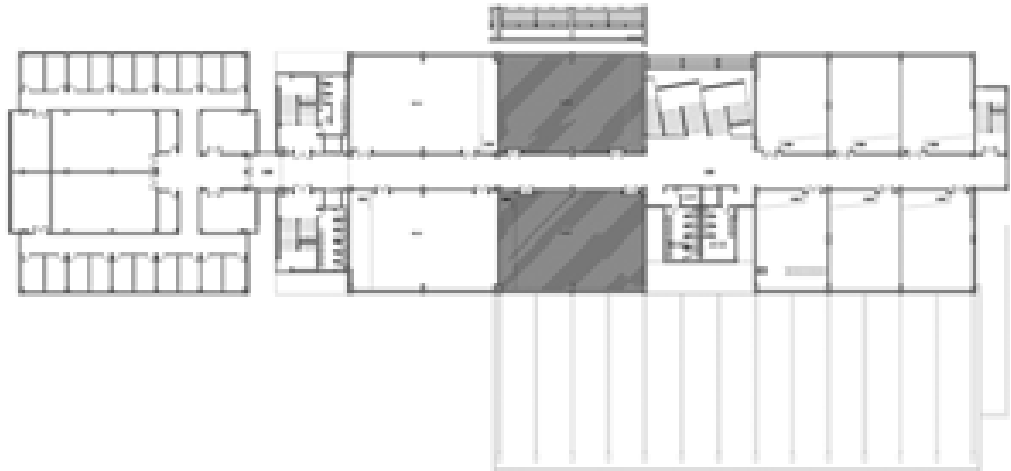



OBRA ADAPTACIÓN EESS FACULTADE DE INFORMÁTICA, LABORATORIOS		
VICERREITORÍA RESPONSABLE	Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Vicerreitor: Xosé Lois Martínez Suárez	
RESPONSABLE DO SEGUIMENTO DO CONTRATO	Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos Director: Roi Salgueiro Barrio	
PROXECTO: ARQUITECTO REDACTOR:	Flavia Piñeiro Ces Paula Souto Cañas	
IMPORTE DE LICITACIÓN (IVE INCLÚIDO):		
SUPERFICIE CONSTRUIDA:	202.60 m2	
EMPRESA CONSTRUTORA:	Mon S.L.	
ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA		
ARQUITECTO TÉCNICO, DIRECTOR DE EXECUCIÓN DE OBRA:		
COORDINADOR DE SEGURIDADE E SAÚDE:		
DATA DE ADXUDICACIÓN DA OBRA:		
DATA DO CONTRATO:		
PRAZO DE EXECUCIÓN:		
PRAZO EXECUCIÓN DO REFORMADO:		
DATA DE INICIO DA OBRA:		
ESTADO DAS OBRAS:		
IMPORTE ADXUDICACIÓN:	50.010,76 €	Total orzamento final:
ORZAMENTO DO REFORMADO		
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. ORIXINAL ATE A DATA :		Total acreditado ate esta data:
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. REFORMADO ATE A DATA :		

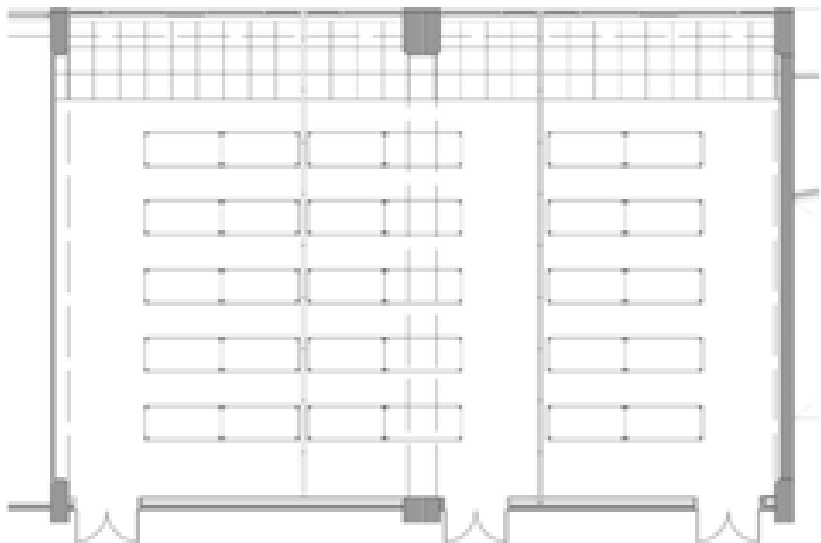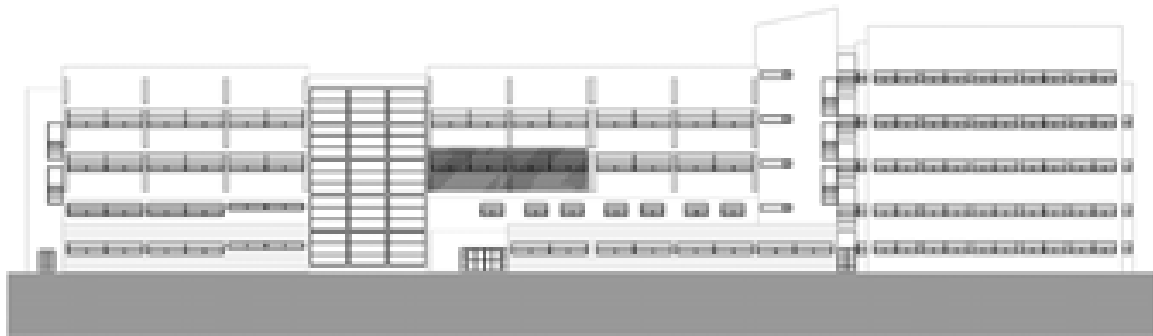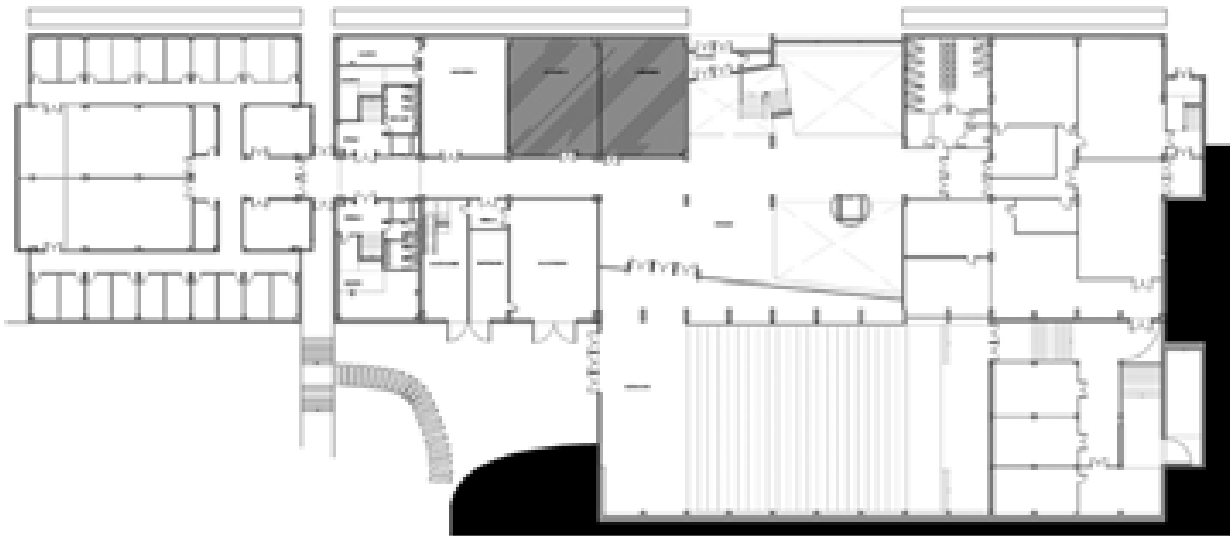



OBRA		
REFORMA XOANA CAPDEVIELLE, DESPACHOS CUFIE		
VICERREITORÍA RESPONSABLE	Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Vicerreitor: Xosé Lois Martínez Suárez	
RESPONSABLE DO SEGUIMENTO DO CONTRATO	Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos Director: Roi Salgueiro Barrio	
PROXECTO: ARQUITECTO REDACTOR:	Roi Salgueiro Barrio	
IMPORTE DE LICITACIÓN (IVE INCLuíDO):		
SUPERFICIE CONSTRUIDA:	105.54 m2	
EMPRESA CONSTRUTORA:	Interiores Galicia S.L. y Climagal S.L.	
ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA		
ARQUITECTO TÉCNICO, DIRECTOR DE EXECUCIÓN DE OBRA:	Gabriel Pita Barreira Vázquez	
COORDINADOR DE SEGURIDADE E SAÚDE:	Gabriel Pita Barreira Vázquez	
DATA DE ADXUDICACIÓN DA OBRA:	02-08-2010	
DATA DO CONTRATO:		
PRazo DE EXECUCIÓN:		
PRazo EXECUCIÓN DO REFORMADO:		
DATA DE INICIO DA OBRA:		
ESTADO DAS OBRAS:		
IMPORTE ADXUDICACIÓN:	70.402,39€	Total orzamento final:
ORZAMENTO DO REFORMADO		
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. ORIXINAL ATE A DATA :		Total acreditado ate esta data:
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. REFORMADO ATE A DATA :		





PROXECTO TECNOLÓXICO DA TERCEIRA IDADE		
VICERREITORÍA RESPONSABLE	Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Vicerreitor: Xosé Lois Martínez Suárez	
RESPONSABLE DO SEGUIMENTO DO CONTRATO	Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos Director: Roi Salgueiro Barrio	
PROXECTO: ARQUITECTO REDACTOR:	Lago+Fidalgo unión temporal de empresas	
IMPORTE DE LICITACIÓN (IVE INCLÚIDO):	184.440 €	
ORZAMENTO DO PROXECTO:	6.000.000 €	
DATA DE CONTRATACIÓN DO PROXECTO	02/01/2010	
DATA DE ENTREGA DO PROXECTO	81 días. Está en suspenso o prazo de entrega.	
DATA DE LICITACIÓN DA OBRA	Non está establecida	
ORZAMENTO DO PROXECTO:	6.000.000 €	
IMPORTE ADXUDICACIÓN:	110.960 €	Total orzamento final: 110.960 €
ORZAMENTO DO REFORMADO		
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. ORIXINAL ATE A DATA :		Total acreditado ate esta data:
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. REFORMADO ATE A DATA :		







PROXECTO		
PROXECTO DE CENTRO DE DIA E GARDERIA		
VICERREITORÍA RESPONSABLE	Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Vicerreitor: Xosé Lois Martínez Suárez	
RESPONSABLE DO SEGUIMENTO DO CONTRATO	Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos Director: Roi Salgueiro Barrio	
PROXECTO: ARQUITECTO		
REDACTOR:		
IMPORTE DE LICITACIÓN (IVE INCLuíDO):		
SUPERFICIE CONSTRUIDA:		
EMPRESA CONSTRUTORA:		
ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA		
ARQUITECTO TÉCNICO, DIRECTOR DE EXECUCIÓN DE OBRA:		
ESTADO DAS OBRAS:		
IMPORTE ADXUDICACIÓN:		Total orzamento final:
ORZAMENTO DO REFORMADO		
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. ORIXINAL ATE A DATA :		Total acreditado ate esta data:
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. REFORMADO ATE A DATA :		










CAMPUS DA CORUÑA: RIAZOR

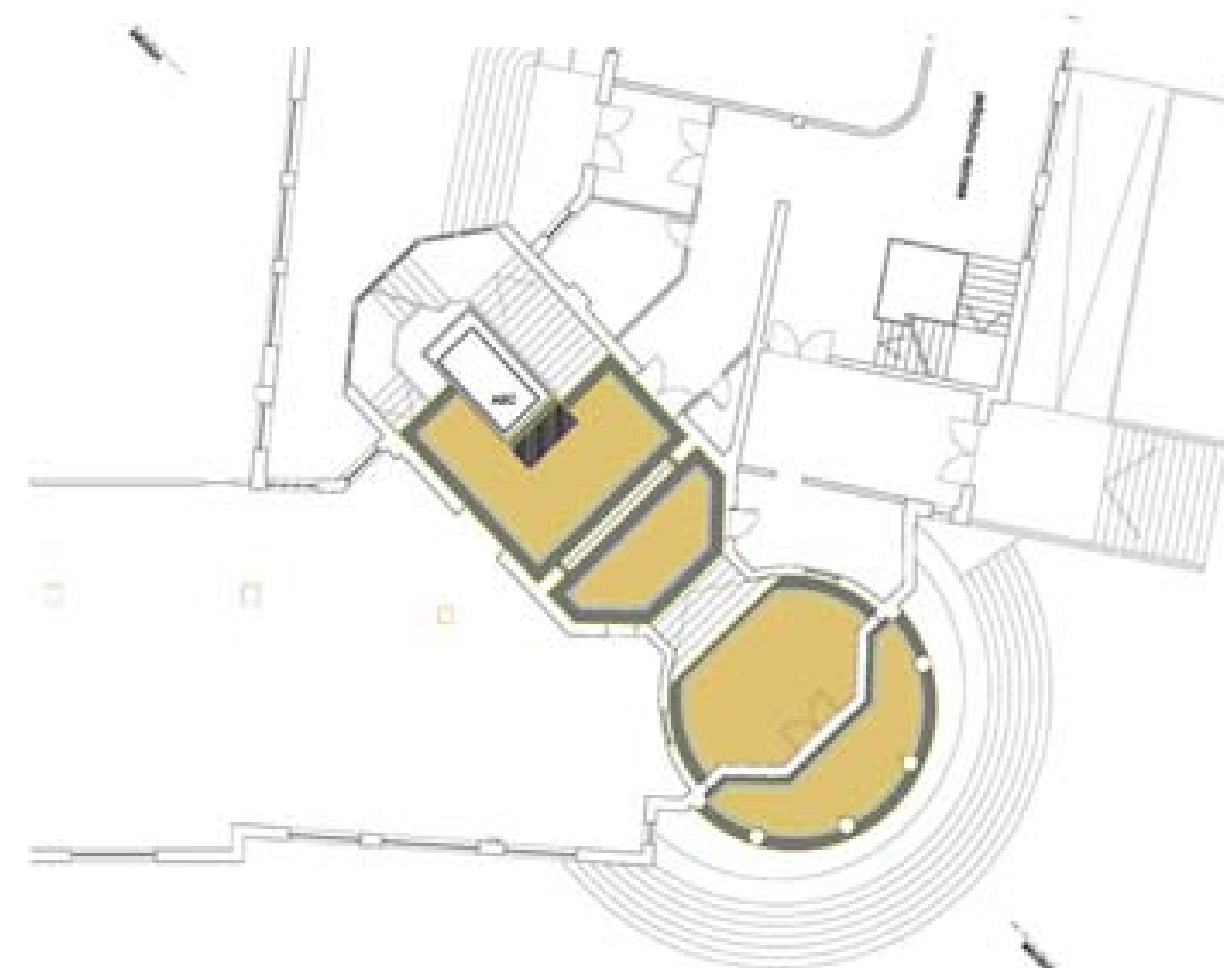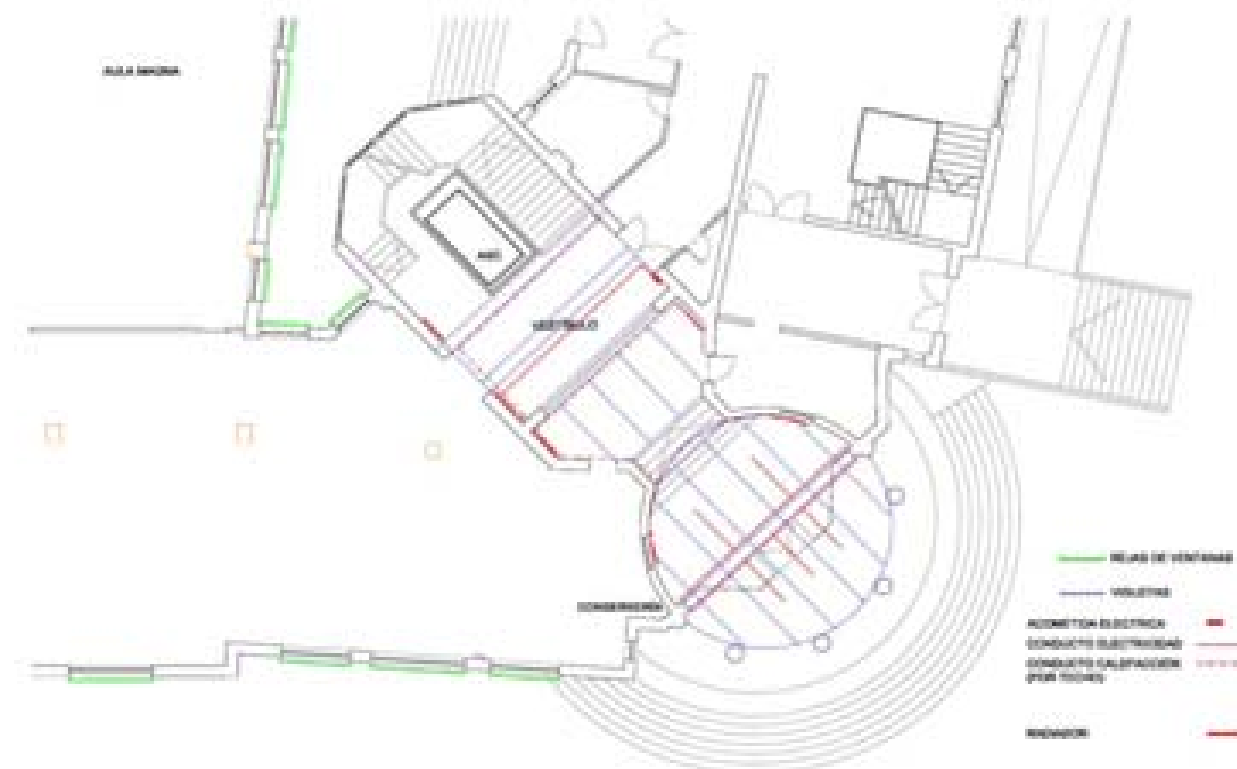




PROXECTO
PROXECTO DE REFORMA DO ACCESO O CENTRO
CULTURAL DE RIAZOR

VICERREITORÍA RESPONSABLE	Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Vicerreitor: Xosé Lois Martínez Suárez
RESPONSABLE DO SEGUIMENTO DO CONTRATO	Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos Director: Roi Salgueiro Barrio
PROXECTO: ARQUITECTO REDACTOR:	Cesáreo Padrón Conde
IMPORTE DE ADXUDICACIÓN: (IVE INCLUÍDO):	7.080 €

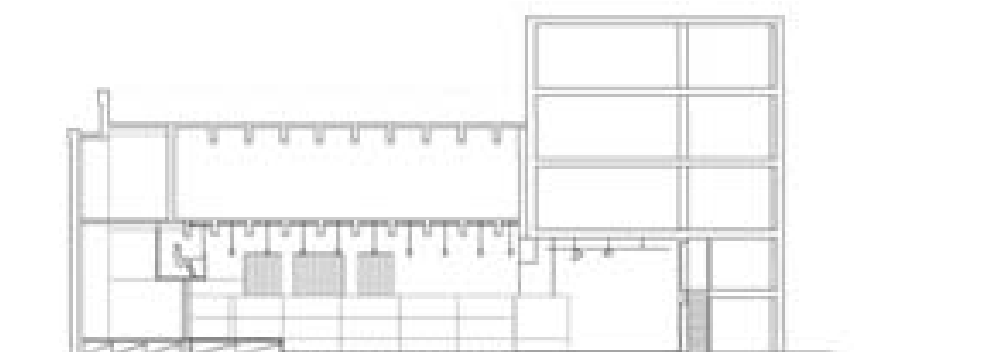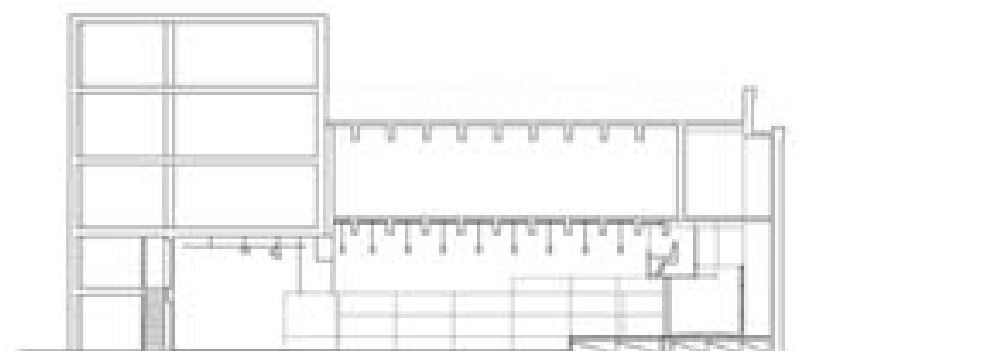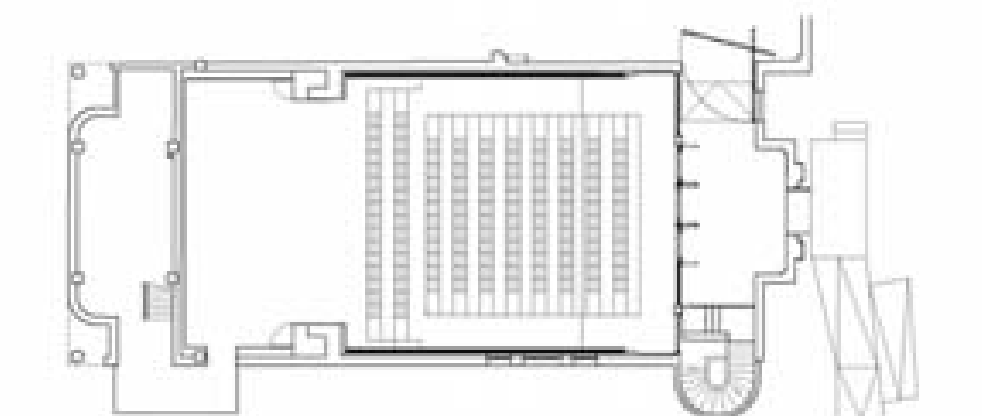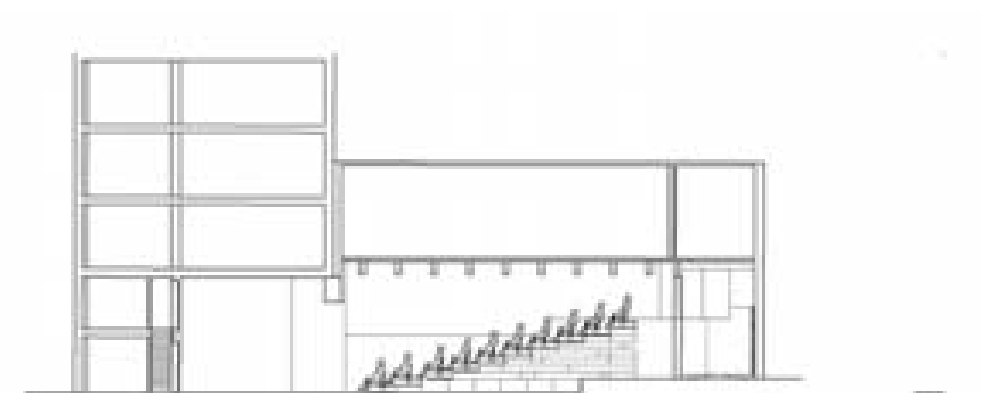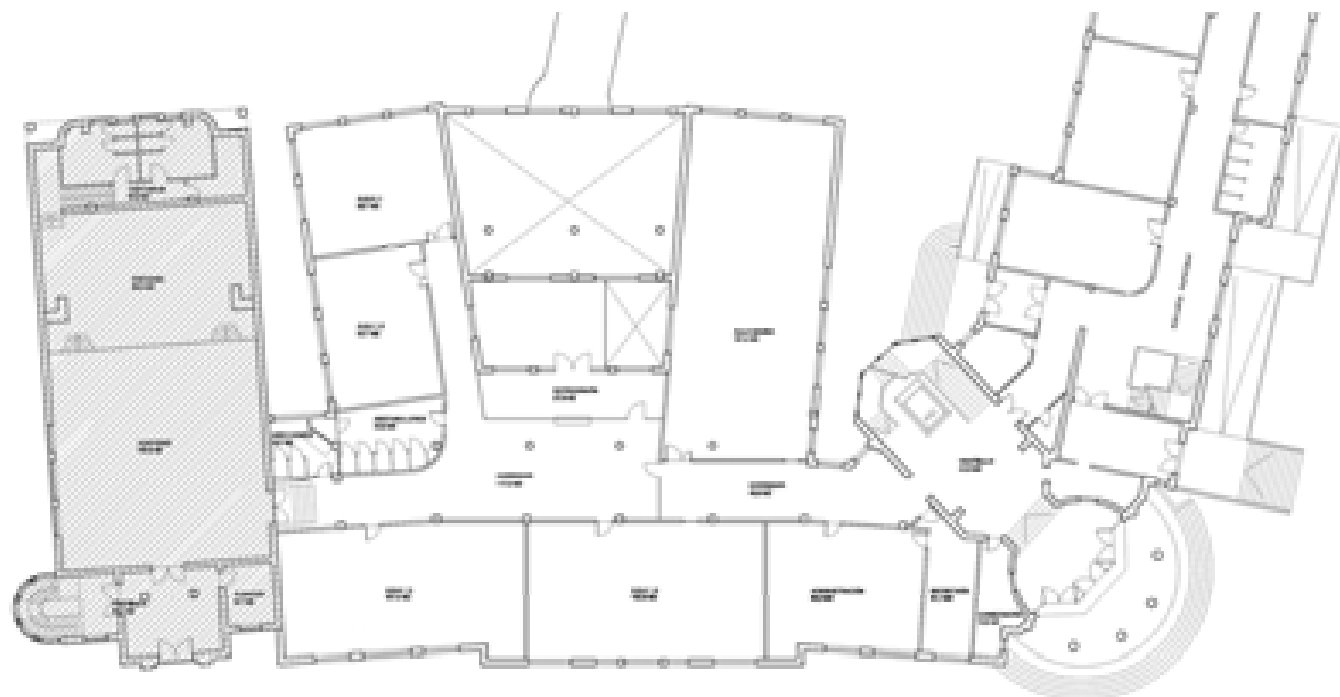

PROXECTO DO TEATRO DO CENTRO CULTURAL DE RIAZOR

VICERREITORÍA RESPONSABLE	Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Vicerreitor: Xosé Lois Martínez Suárez
RESPONSABLE DO SEGUIMENTO DO CONTRATO	Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos Director: Roi Salgueiro Barrio
PROXECTO: ARQUITECTO REDACTOR:	Cesar Padrón Conde
ORZAMENTO DO PROXECTO:	600.000 €
DATA DE ENTREGA DO PROXECTO	Prevista Setembro 2010.
DATA DE LICITACIÓN DA OBRA	Prevista Outubro 2010
DATA DE CONTRATACIÓN DA OBRA	Prevista decembro 2010
PRAZO DE EXECUCIÓN	Previsto 6 meses
DATA DE ENTREGA DO PROXECTO	Prevista Setembro 2010.
DATA DE LICITACIÓN DA OBRA	Prevista Outubro 2010

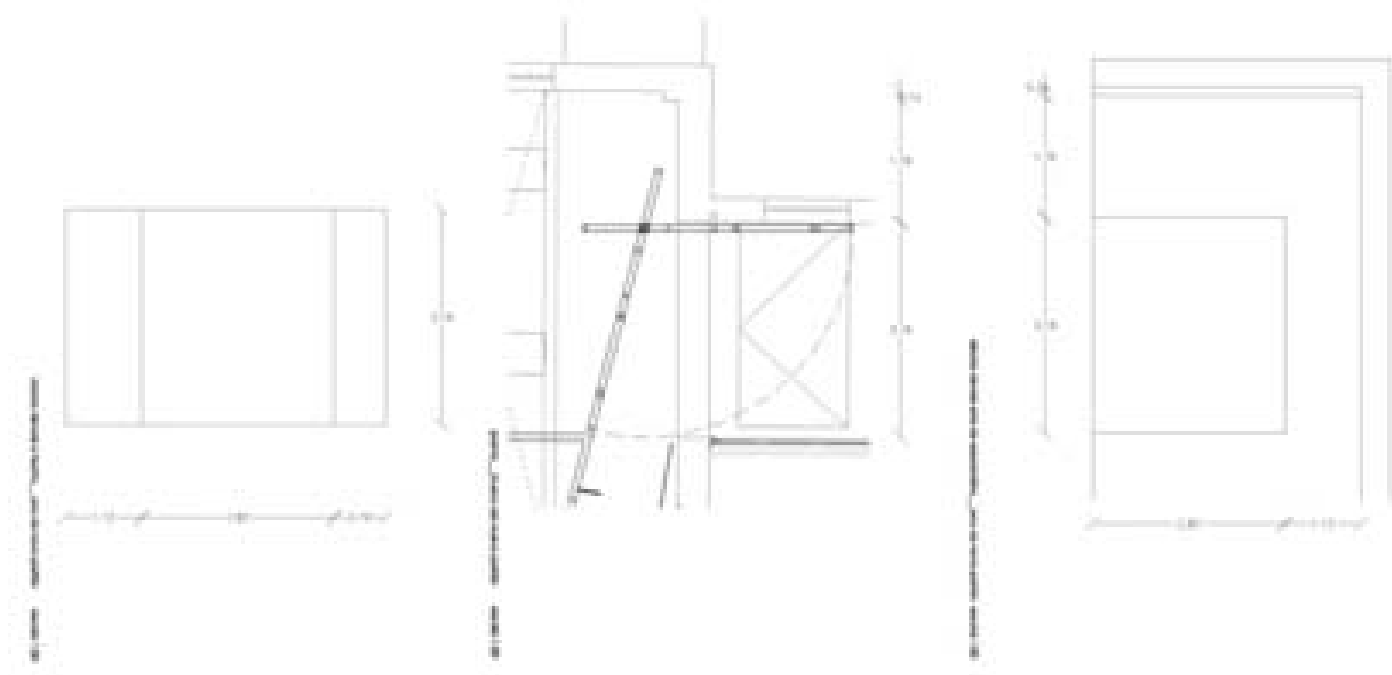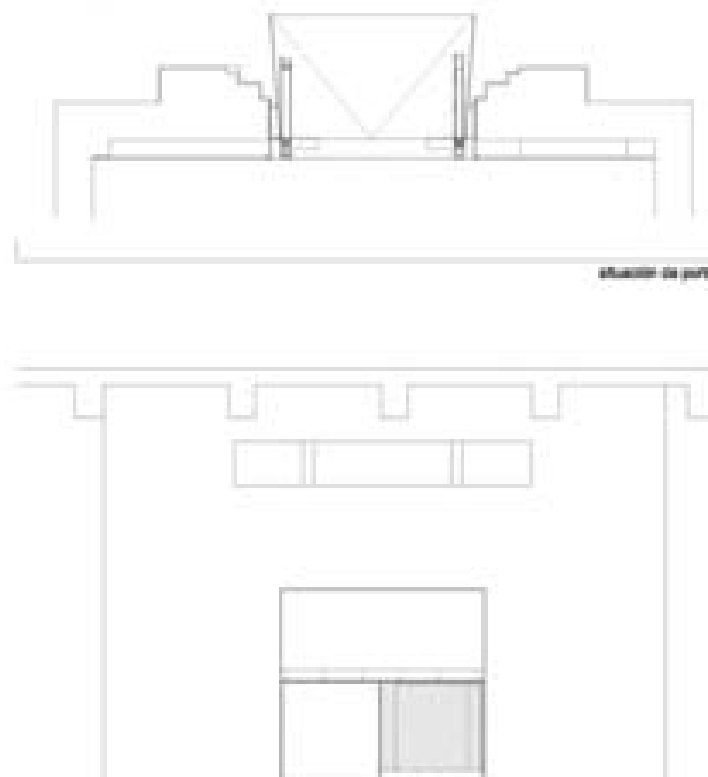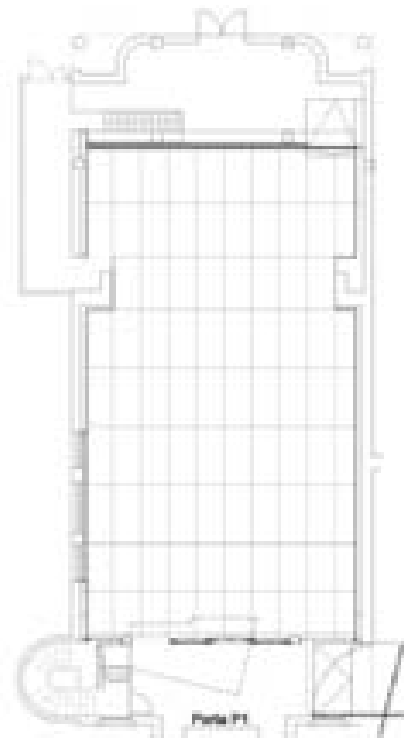

PROXECTO PROXECTO PARA A SUBSTITUCION DE CARPINTERÍAS NO CENTRO CULTURAL DE RIAZOR E TRATAMENTO DOS ESPACIOS EXTERIORES	
VICERREITORÍA RESPONSABLE	Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Vicerreitor: Xosé Lois Martínez Suárez
RESPONSABLE DO SEGUIMENTO DO CONTRATO	Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos Director: Roi Salgueiro Barrio
PROXECTO: ARQUITECTO	Cesáreo Padrón Conde
REDACTOR:	
IMPORTE DE ADXUDICACIÓN: (IVE INCLÚIDO):	7.080 €




CAMPUS DE FERROL: ESTEIRO




OBRA

ADAPTACIÓN AO EEES DA ESCOLA POLITÉCNICA
SUPERIOR. AULAS NA POLITÉCNICA

VICERREITORÍA RESPONSABLE:	Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Vicerreitor: Xosé Lois Martínez Suárez	
RESPONSABLE DO SEGUIMENTO DO CONTRATO:	Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos Director: Roi Salgueiro Barrio	
PROXECTO: ARQUITECTO REDACTOR:	Roi Salgueiro Barrio	
IMPORTE DE LICITACIÓN (IVE INCLUÍDO):		
SUPERFICIE CONSTRUIDA:		
EMPRESA CONSTRUTORA:	V.F.VARELA	
ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA:	Roi Salgueiro Barrio	
ARQUITECTOS TÉCNICOS, DIRECTORES DE EJECUCIÓN DE OBRA:	Gabriel Pita da Veiga Vázquez	
COORDINADOR DE SEGURIDADE E SAÚDE:	Gabriel Pita da Veiga Vázquez	
DATA DE ADXUDICACIÓN DA OBRA:		
DATA DO CONTRATO:		
PRAZO DE EXECUCIÓN:		
PRAZO EXECUCIÓN DO REFORMADO:		
DATA DE INICIO DA OBRA:		
ESTADO DAS OBRAS		
ORZAMENTO DO INICIAL:		
ORZAMENTO DO REFORMADO:		
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. ORIXINAL ATE A DATA :		
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. REFORMADO ATE A DATA :		

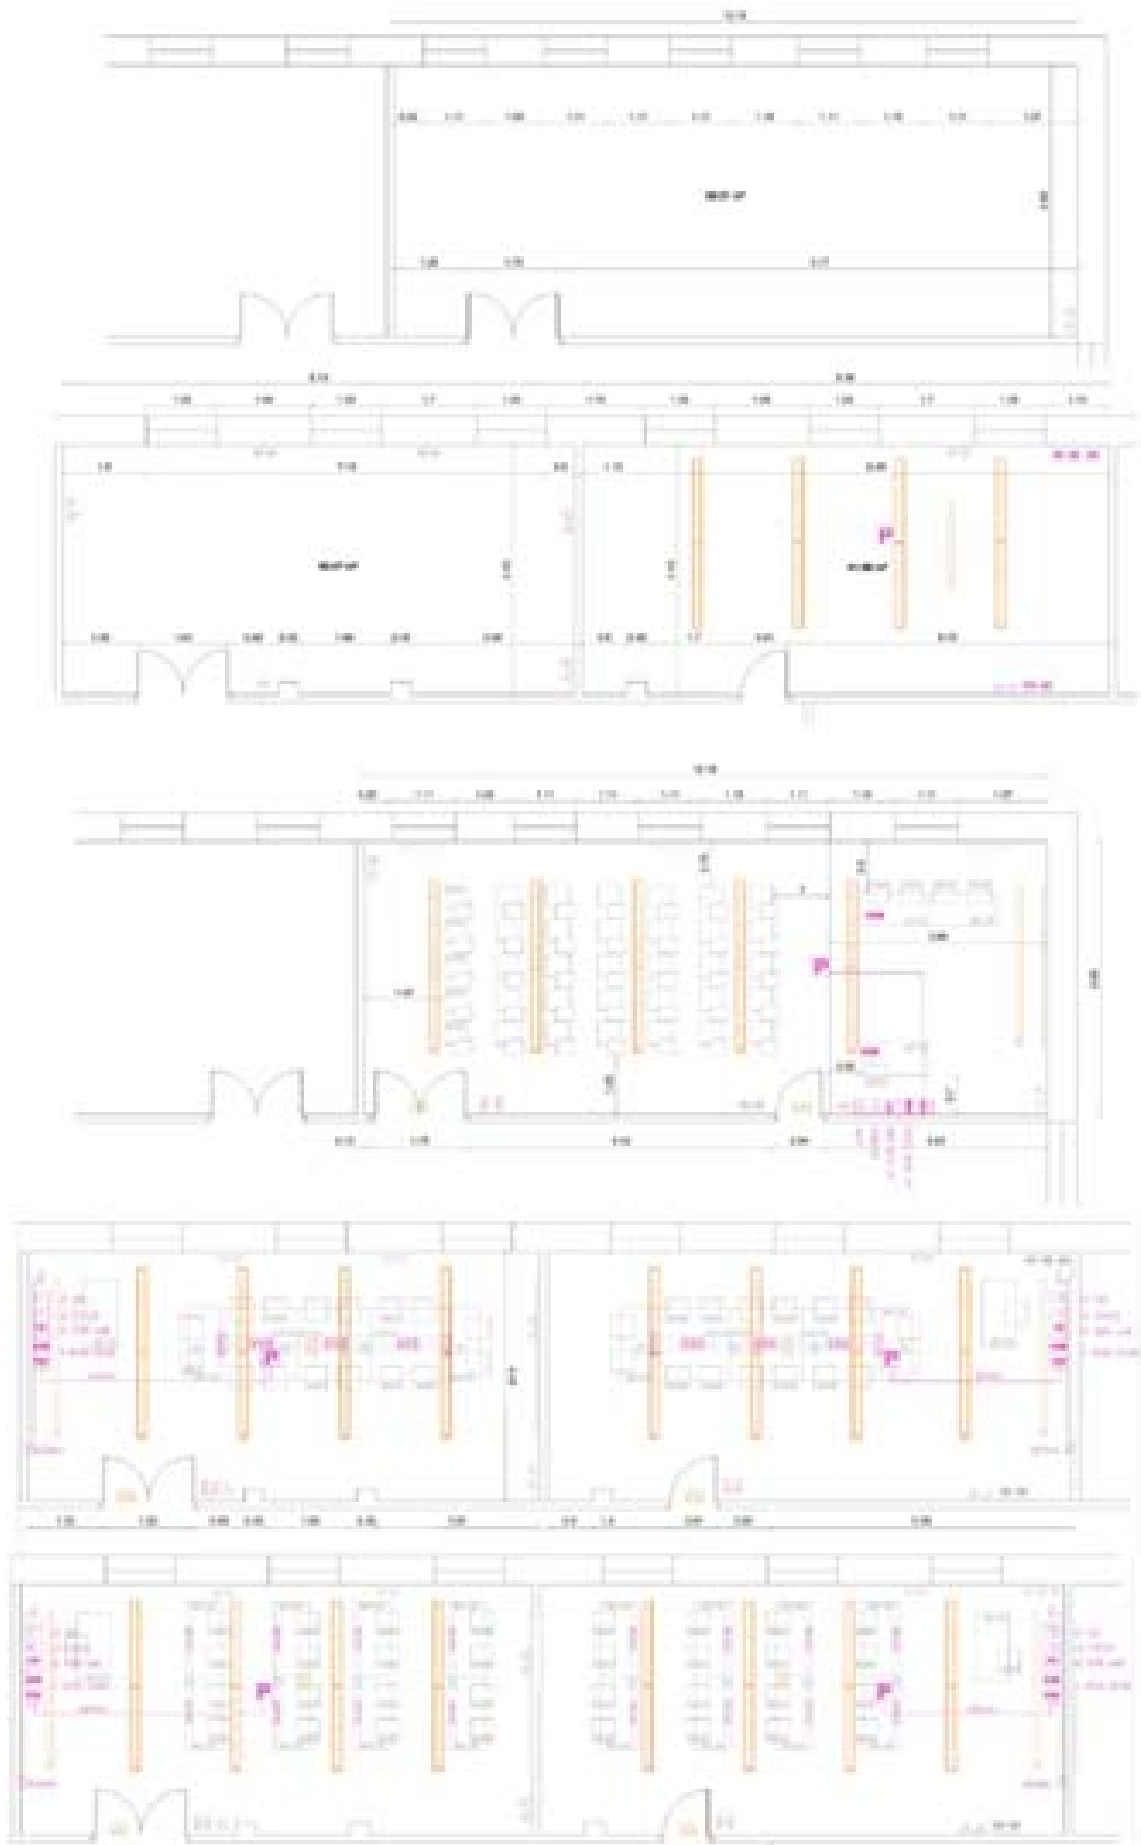

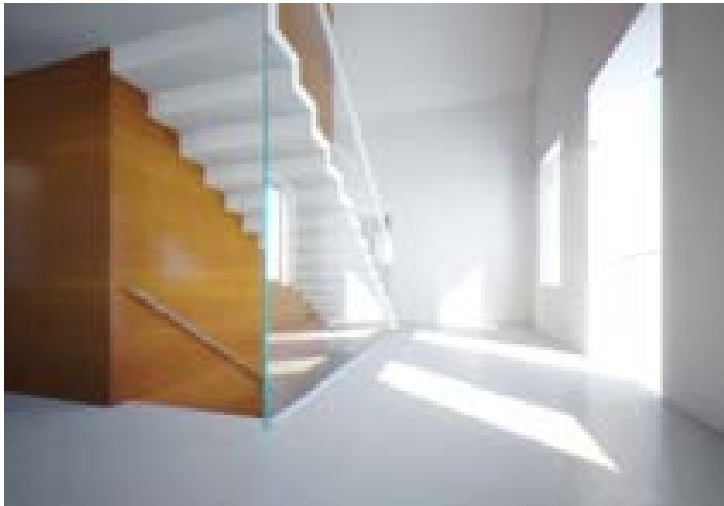


OBRA

AMPLIACIÓN DO CIT NO EDIFICIO DO COMEDOR DO
CAMPUS DE ESTEIRO

VICERREITORÍA RESPONSABLE:	Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Vicerreitor: Xosé Lois Martínez Suárez	
RESPONSABLE DO SEGUIMENTO DO CONTRATO:	Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos Director: Roi Salgueiro Barrio	
PROXECTO: ARQUITECTO REDACTOR:	Noela Seijo Canosa	
IMPORTE DE LICITACIÓN (IVE INCLÚIDO):	450.064,85 €	
SUPERFICIE CONSTRUIDA:		
EMPRESA CONSTRUTORA:	Construcciones y contratas herculinas	
ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA:	Noela Seijo Canosa Roi Salgueiro Barrio	
ARQUITECTOS TÉCNICOS, DIRECTORES DE EJECUCIÓN DE OBRA:	José Andrés Seoane Lago	
COORDINADOR DE SEGURIDADE E SAÚDE:	Gabriel Pita da Veiga Vázquez	
DATA DE ADXUDICACIÓN DA OBRA:	28/12/2009	
DATA DO CONTRATO:	11/01/2010	
PRAZO DE EXECUCIÓN:	90 días naturais	
DATA DE INICIO DA OBRA:	07/05/2010	
DATA PREVISTA DE FINALIZACIÓN:	15/11/2010	
ESTADO DAS OBRAS	En execución	
ORZAMENTO INICIAL	356.700 €	Total Orzamento: 356.700 €
ORZAMENTO DO REFORMADO		
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. ORIXINAL ATE A DATA :	328.192,82 €	Total acreditado ate esta data: 328.192,82 €
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. REFORMADO ATE A DATA :		



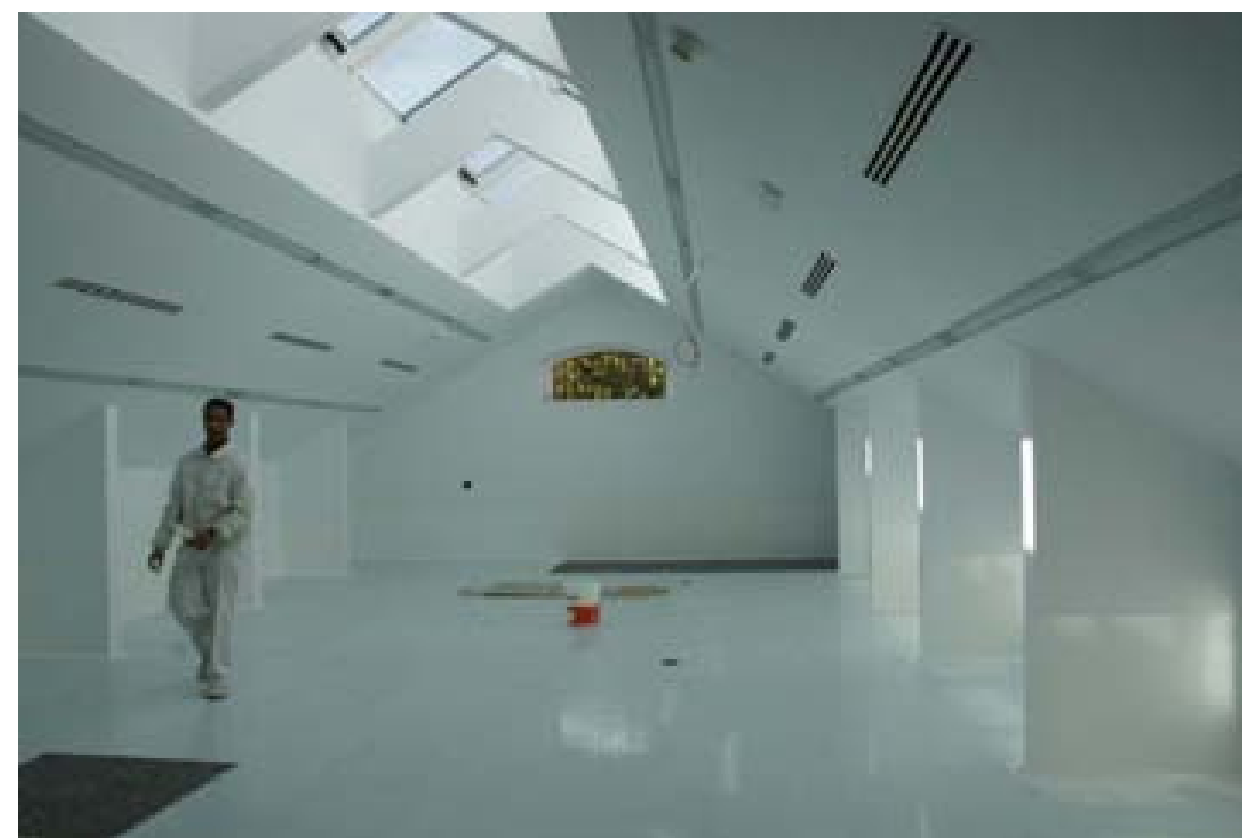





OBRA

CONSTRUCCIÓN DO CENTRO CÍVICO UNIVERSITARIO DE FERROL

VICERREITORÍA RESPONSABLE:	Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Vicerreitor: Xosé Lois Martínez Suárez	
RESPONSABLE DO SEGUIMENTO DO CONTRATO:	Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos Director: Roi Salgueiro Barrio	
PROXECTO: ARQUITECTO REDACTOR:	Manuel de la Iglesia Pérez	
IMPORTE DE LICITACIÓN (IVE INCLUÍDO):	1.063.774,71 €	
SUPERFICIE CONSTRUIDA:	1.460 m2	
EMPRESA CONSTRUTORA:	Arias hermanos construcciones, SA	
ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA:	Manuel de la Iglesia Pérez	
ARQUITECTOS TÉCNICOS, DIRECTORES DE EJECUCIÓN DE OBRA:	Ana Gallego Núñez	
COORDINADOR DE SEGURIDADE E SAÚDE:	Ana Gallego Núñez	
DATA DE ADXUDICACIÓN DA OBRA:	29/12/2006	
DATA DO CONTRATO:	23/02/2007	
PRAZO DE EXECUCIÓN:	8 meses	
PRAZO EXECUCIÓN DO REFORMADO:	3 meses e medio	
DATA DE INICIO DA OBRA:	14/06/2007 <i>Paralizada por mor de non estar aprobada a licenza municipal que permita a construción a nova data de inicio é o 13/05/2008 (Acta de reinicio da obra do 12/05/2008)</i>	
ESTADO DAS OBRAS	Rematadas. Recepción a 14/06/2010	
ORZAMENTO DO INICIAL:	1.063.774,71 €	Total Orzamento: 1.489.0670,82 €
IMPORTE DE ADXUDICACIÓN (IVE INCLUIDO):	425.509,88	CERTIFICADO NA SÚA TOTALIDADE
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. ORIXINAL ATE A DATA :	1.171.869,37	
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. REFORMADO ATE A DATA :	425.509,88	

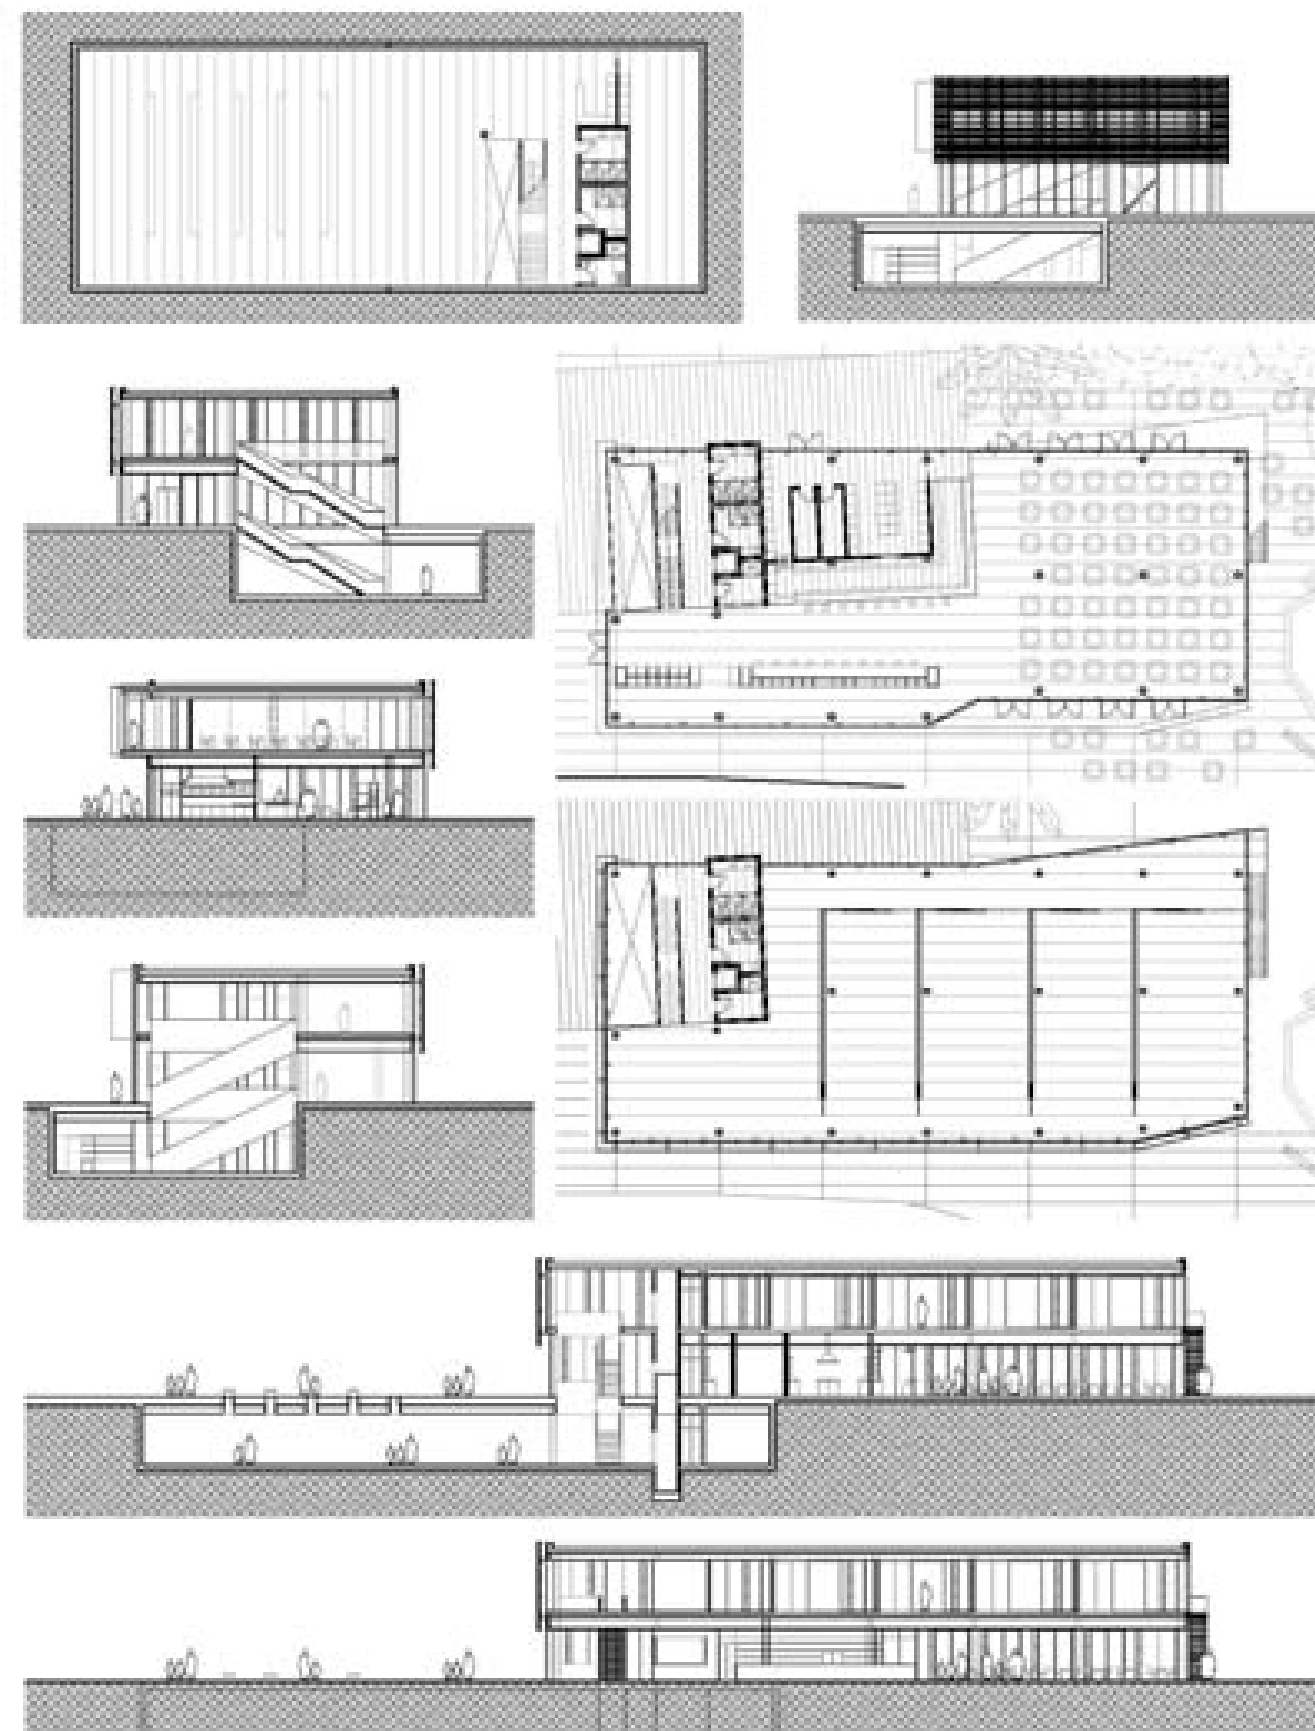



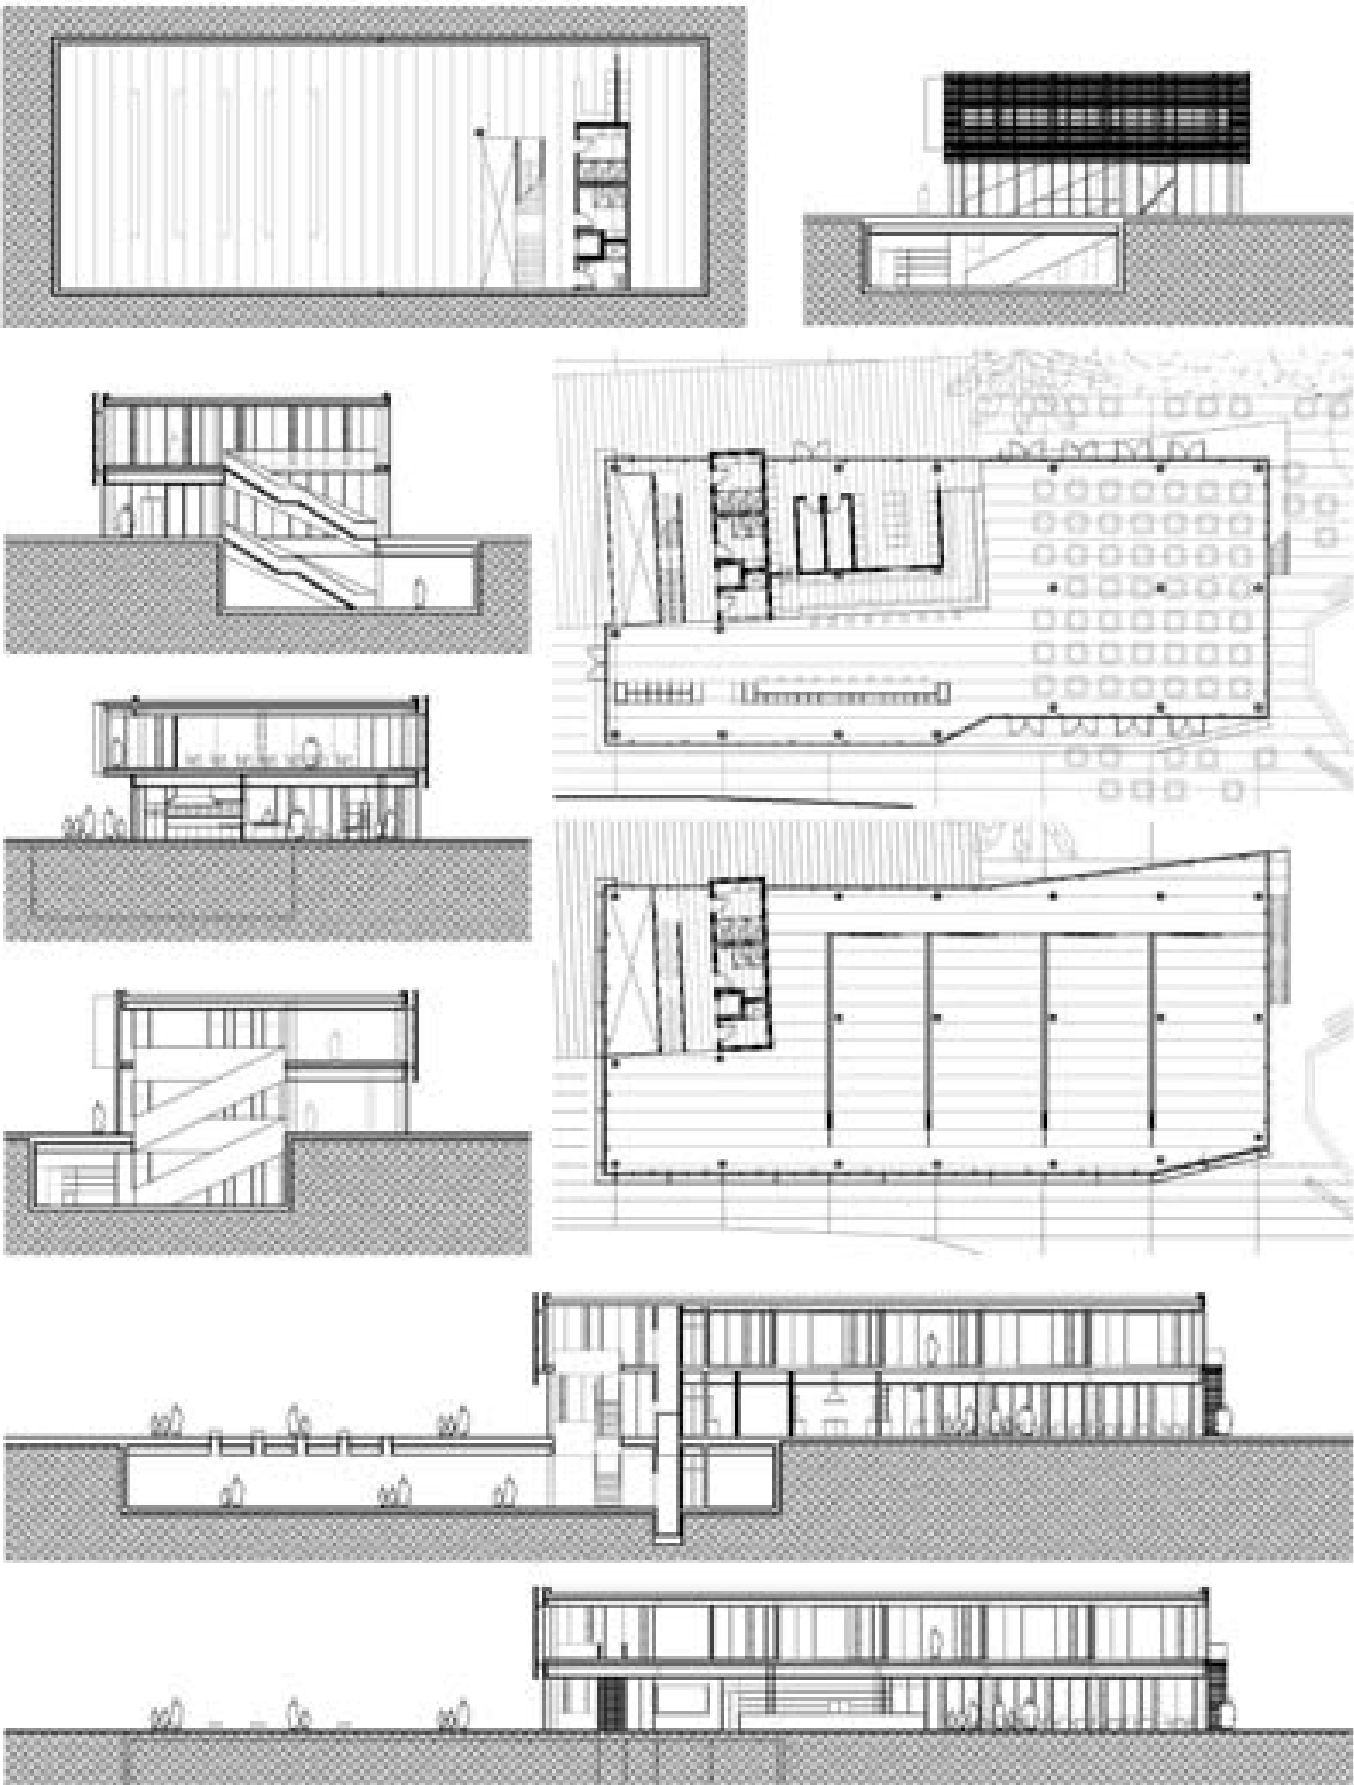


OBRA

ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DO CENTRO CÍVICO
UNIVERSITARIO. REDACCIÓN DE PROXECTO E
LICITACIÓN DA OBRA

VICERREITORÍA RESPONSABLE:	Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Vicerreitor: Xosé Lois Martínez Suárez
RESPONSABLE DO SEGUIMENTO DO CONTRATO:	Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos Director: Roi Salgueiro Barrio
PROXECTO: ARQUITECTO REDACTOR:	Pedro Taboada de Zuñiga Campos
IMPORTE DE LICITACIÓN (IVE INCLUÍDO):	515.819,46 €
SUPERFICIE CONSTRUIDA:	
EMPRESA CONSTRUTORA:	
ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA:	
ARQUITECTOS TÉCNICOS, DIRECTORES DE EJECUCIÓN DE OBRA:	
COORDINADOR DE SEGURIDADE E SAÚDE:	
DATA DE ADXUDICACIÓN DA OBRA:	
DATA DO CONTRATO:	
PRAZO DE EXECUCIÓN:	120 días
PRAZO EXECUCIÓN DO REFORMADO:	
DATA DE INICIO DA OBRA:	
ESTADO DAS OBRAS	

ORZAMENTO DO INICIAL:		Total Orzamento:
ORZAMENTO DO REFORMADO:		
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. ORIXINAL ATE A DATA :		
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. REFORMADO ATE A DATA :		

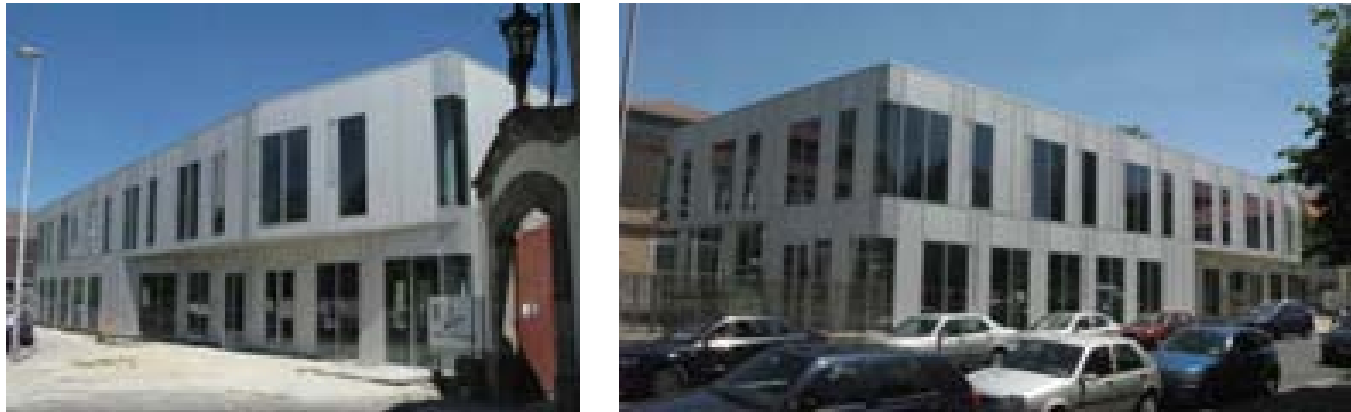


OBRA		
URBANIZACIÓN DO CONTORNO DO CENTRO CÍVICO UNIVERSITARIO. REDACCIÓN DE PROXECTO E LICITACIÓN DA OBRA		
VICERREITORÍA RESPONSABLE:	Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Vicerreitor: Xosé Lois Martínez Suárez	
RESPONSABLE DO SEGUIMENTO DO CONTRATO:	Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos Director: Roi Salgueiro Barrio	
PROXECTO: ARQUITECTO	Pedro Taboada de Zuñiga Campos	
REDACTOR:		
IMPORTE DE LICITACIÓN (IVE INCLÚIDO):	233.898,41 €	
SUPERFICIE CONSTRUIDA:		
EMPRESA CONSTRUTORA:		
ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA:		
ARQUITECTOS TÉCNICOS, DIRECTORES DE EJECUCIÓN DE OBRA:		
COORDINADOR DE SEGURIDADE E SAÚDE:		
DATA DE ADXUDICACIÓN DA OBRA:		
DATA DO CONTRATO:		
PRAZO DE EXECUCIÓN:	120 días	
PRAZO EXECUCIÓN DO REFORMADO:		
DATA DE INICIO DA OBRA:		
ESTADO DAS OBRAS		
ORZAMENTO DO INICIAL:		Total Orzamento:
ORZAMENTO DO REFORMADO:		
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. ORIXINAL ATE A DATA :		
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. REFORMADO ATE A DATA :		



OBRA		
PINTADO DA FACULTADE DE ENFERMERÍA		
VICERREITORÍA RESPONSABLE:	Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Vicerreitor: Xosé Lois Martínez Suárez	
RESPONSABLE DO SEGUIMENTO DO CONTRATO:	Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos Director: Roi Salgueiro Barrio	
PROXECTO: ARQUITECTO REDACTOR:		
IMPORTE DE LICITACIÓN (IVE INCLUÍDO):	65.000,60 €	
SUPERFICIE CONSTRUIDA:		
EMPRESA CONSTRUTORA:	DECORACIONES GRELA S.L.	
ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA:		
ARQUITECTOS TÉCNICOS, DIRECTORES DE EJECUCIÓN DE OBRA:		
COORDINADOR DE SEGURIDADE E SAÚDE:		
DATA DE ADXUDICACIÓN DA OBRA:	03/12/2009	
DATA DO CONTRATO:		
PRAZO DE EXECUCIÓN:		
PRAZO EXECUCIÓN DO REFORMADO:		
DATA DE INICIO DA OBRA:		
ESTADO DAS OBRAS	SEN COMENZAR	
IMPORTE DE ADXUDICACIÓN (IVE INCLUIDO):	63.050,58 €	Total Orzamento:
ORZAMENTO DO REFORMADO:		
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. ORIXINAL ATE A DATA :		
MPORE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. REFORMADO ATE A DATA :		



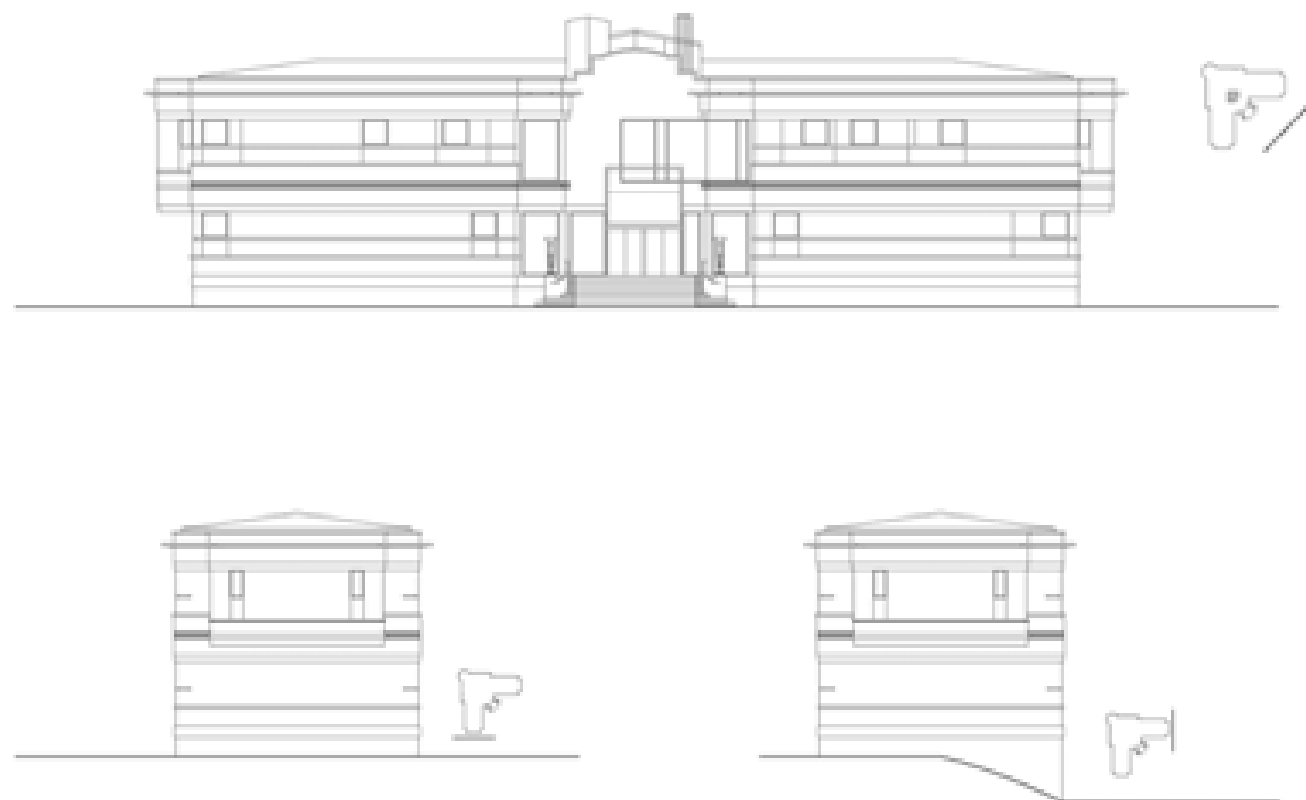





CAMPUS DA CORUÑA: BASTIAGUEIRO

OBRA


CIENCIAS DO DEPORTE. PROXECTO E OBRA DE NOVA
CONSERXERÍA NAS PISTAS DE ATLETISMO

VICERREITORÍA RESPONSABLE	Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Vicerreitor: Xosé Lois Martínez Suárez	
RESPONSABLE DO SEGUIMENTO DO CONTRATO	Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos Director: Roi Salgueiro Barrio	
PROXECTO: ARQUITECTO		
REDACTOR:		
IMPORTE DE LICITACIÓN (IVE INCLÚIDO):		
SUPERFICIE CONSTRUIDA:		
EMPRESA CONSTRUTORA:		
ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA		
ARQUITECTO TÉCNICO, DIRECTOR DE EXECUCIÓN DE OBRA:		
COORDINADOR DE SEGURIDADE E SAÚDE:		
DATA DE ADXUDICACIÓN DA OBRA:		
DATA DO CONTRATO:		
PRAZO DE EXECUCIÓN:		
PRAZO EXECUCIÓN DO REFORMADO:		
DATA DE INICIO DA OBRA:		
ESTADO DAS OBRAS:		
IMPORTE ADXUDICACIÓN:		Total orzamento final:
ORZAMENTO DO REFORMADO		
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. ORIXINAL ATE A DATA :		Total acreditado ate esta data:
IMPORTE DAS CERTIFICACIÓN ACREDITADAS PROX. REFORMADO ATE A DATA :		

CONSERXERÍA EN INEF

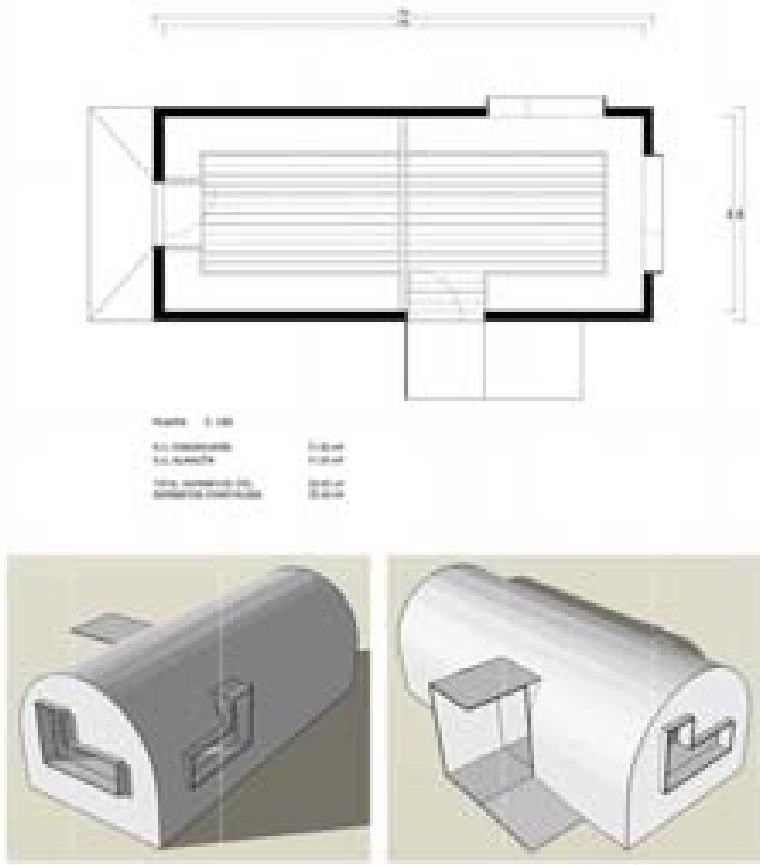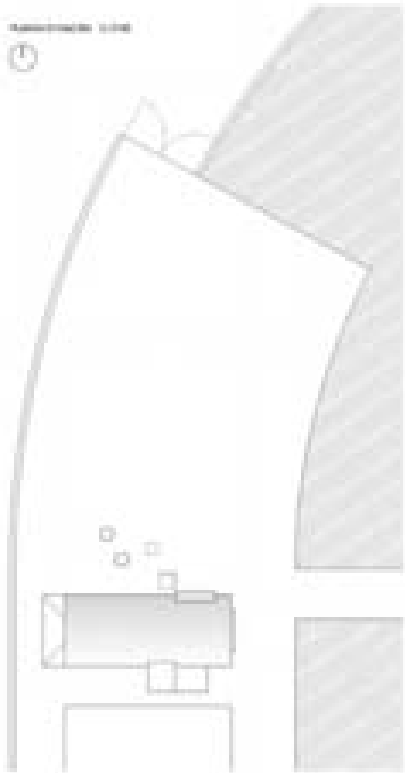

CONSERXERÍA EN INEF

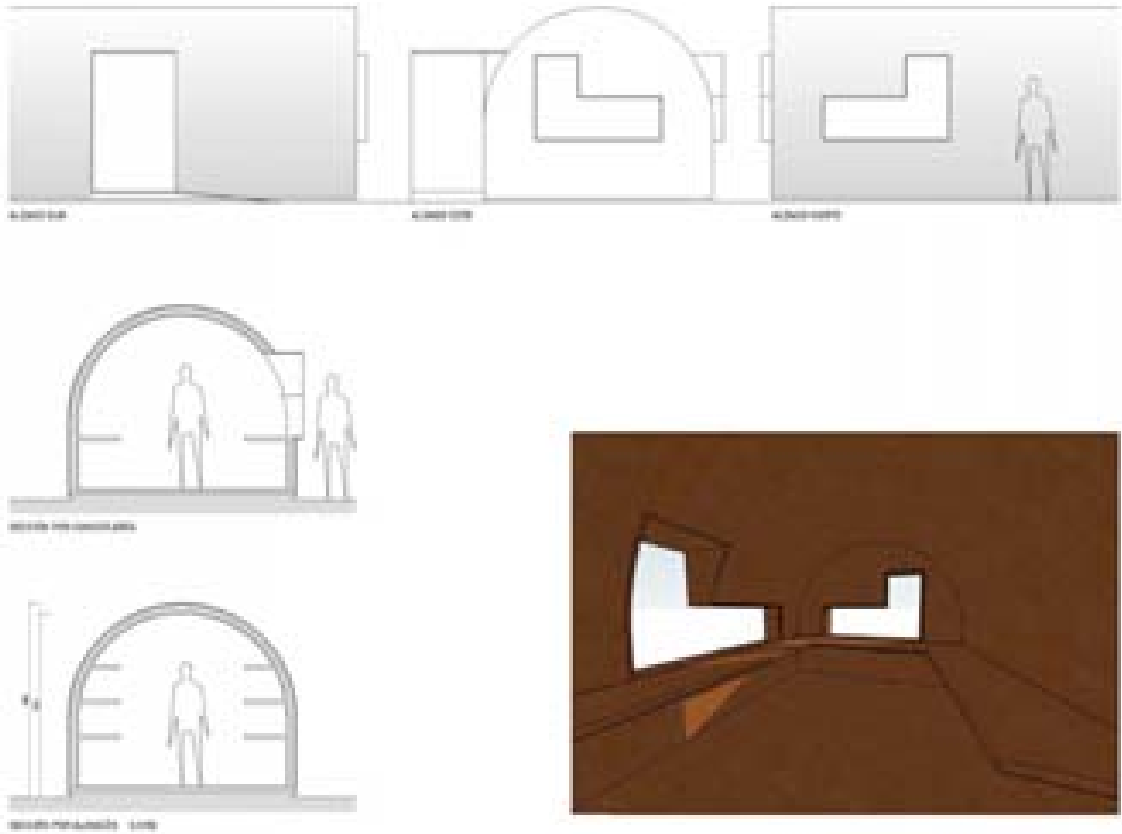

INSTALACIONES

AGORA



Sala de Caldeiras Rematada

OBRA			
REFORMA DA SALA DE CALDEIRAS DA ZAPATEIRA			
VICERREITORÍA RESPONSABLE:	Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Vicerreitor: Xosé Lois Martínez Suárez		
PROXECTO: ENXEÑEIROS REDACTORES	COTISA e supervisión da UDC por Jesús M. Giz Novo.		
ORZAMENTO DA ACTUACIÓN:	Adxudicada en 445.414,07.		
EMPRESA INSTALADORA:	Elecnor S.A.		
DIRECCIÓN DE OBRA:	COTISA e supervisión da UDC por Jesús M. Giz Novo		
OBRA: DATA DE ADXUDICACIÓN	10/12/2009		
PRAZO DE EXECUCIÓN:	2 meses. Comezada o día 4 Agosto de 2010. Rematada a obra na súa práctica totalidade. Unicamente falta a realización da acometida de gas por parte da empresa distribuidora Gas Galicia e a parte superior das chemineas que irán integradas dentro dun proxecto de adecuación da zona da antiga sala de caldeiras e parte traseira da facultade de Ciencias.		
CARACTERÍSTICAS DO PROXECTO	Sala de caldeiras adaptada á subministración de gas. - Combustible máis limpo. - Combustible máis económico. - A eficiencia das caldeiras aumenta considerablemente o que suporá un aforro anual de máis de máis de 60.000€. - Estase a realizar o proxecto de dotación de calefacción centralizada para a UMM e Ampliación da ETSAC aumentando a eficiencia do conxunto e diminuindo os custos de mantementos globais.		
DATOS AMBIENTAIS DO PROXECTO	Subvención do INEGA 2009 do 10 %. Porcentaxe recorrida por considerala insuficiente e comentada en reunión co director do INEGA.	49,81 % de redución no consumo de enerxía primaria	Aforro anual de 202 Ton CO2/ano



Novas tubarías instaladas

ANTES



Perdas de calor nas tubarías soterradas



Sala de caldeiras non cumpre normativa RF
en zona de acceso público



Fuga de auga nunca tubaría de
calefacción soterrada



Acceso non permitido por fachada acristalada á vella sala
permitía o vandalismo sobre a mesma.

DURANTE



Montaxe de novas tubarías soterradas



Montaxe de novas tubarías Baixo a pasarela da ETSA





CALdeira nova previo montaxe




OBRA			
INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA DO CENTRO CÍVICO UNIVERSITARIO DE FERROL – 12,6Kwp			
VICERREITORÍA RESPONSABLE:		Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Vicerreitor: Xosé Lois Martínez Suárez	
PROXECTO: TECNICOS REDACTORES		Cenit Atlántico e supervisión da UDC por Jesús M. Giz Novo.	
ORZAMENTO DA ACTUACIÓN:		Adxudicada en 56.028,00€	
EMPRESA INSTALADORA:		Cenit Atlántico	
DIRECCIÓN DE OBRA:		Cenit Atlántico e supervisión UDC por Jesús M. Giz Novo	
OBRA: DATA DE ADXUDICACIÓN		06/10/2009	
PRAZO DE EXECUCIÓN:		REMATADA 12/2010	
CARACTERÍSTICAS DO PROXECTO		Instalación solar fotovoltaica de 12,6 kWpico con 13,18 kWp reais Ubicada no campus de Esteiro. Sensibilización ambiental e instalación demostrativa para as escolas da EPS e EUP	
DATOS AMBIENTAIS DO PROXECTO		Subvención 50% conveniado CMADS 6000€ AXUDA INEGA 2009 Subvención total 61%	Grazas a subvencións amortización para a UDC en menos de 5 anos Aforro de 7,57 Ton CO2/ano. Ingresos anuais de 4588 €

SISTEMA DE CONTROL SCADA PARA AUTOMATIZACIÓN DE INSTALACIÓNS

VICERREITORÍA RESPONSABLE:	Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Vicerreitor: Xosé Lois Martínez Suárez
PROXECTO:	Jesús M. Giz Novo e SIC
CARACTERÍSTICAS DO PROXECTO	Esta actuación consiste na implementación dun sistema SCADA que permitirá supervisar a distancia as instalacións, verificar rendementos e sacar históricos de consumos. O dito Scada está instalado nos servidores centrais da UDC co cal se ten unha máxima seguridade e controlada a xestión da rede polo Servizo de Xestión de Rede e Servizo de Sistemas. Á súa vez permitirá actuar sobre as instalacións apagando e encendendo en función das necesidades desde calquera ordenador que se quera configurar. <u>As actuacións xa levadas a cabo son:</u> 1 – Xoana Capdevielle: Control de rego, e sistema bioclimático de refrixeración e calefacción. 2 – Xoana Capdevielle: Monitorización dos parámetros de temperatura e humidade de Arquivo Central da UDC con históricos destes valores garantizando a perdurabilidade documental. 3 – Xoana Capdevielle: Integración de controis de temperatura para novos despachos do CUFIE e control por zonas dos despachos do SEINFE e Acceso a documento. 4 – Sistema de control para a regulación de iluminación, ventilación e lamas de protección solar no CITIC. 5 – Sistema de control nas climatización da Facultade de Ciencias da Saúde. <u>Outras futuras actuacións serán:</u> 1 – Sistema de control para as climatizadoras da Facultade de Dereito. 2 – Sistema de control para a climatizadora do salón de actos da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais. 3 – Sistema de climatización, bombas de drenaxe, SAI e Grupo electrógeno do Edificio de Servizos Centrais de Investigación. 4 – Sistema de control na Facultade de Ciencias da Educación para a climatización de Biblioteca e Salón de Actos. 5 – A nivel xeral implementaránse contadores de auga, enerxía, gas, gasoil para novos edificios e algúns existentes.
OUTRAS CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DO PROXECTO	A posible contabilización de consumos de cafeterías e outras concesións para poder repercutir os custes das sumministracións eléctricas, de auga e calefacción.

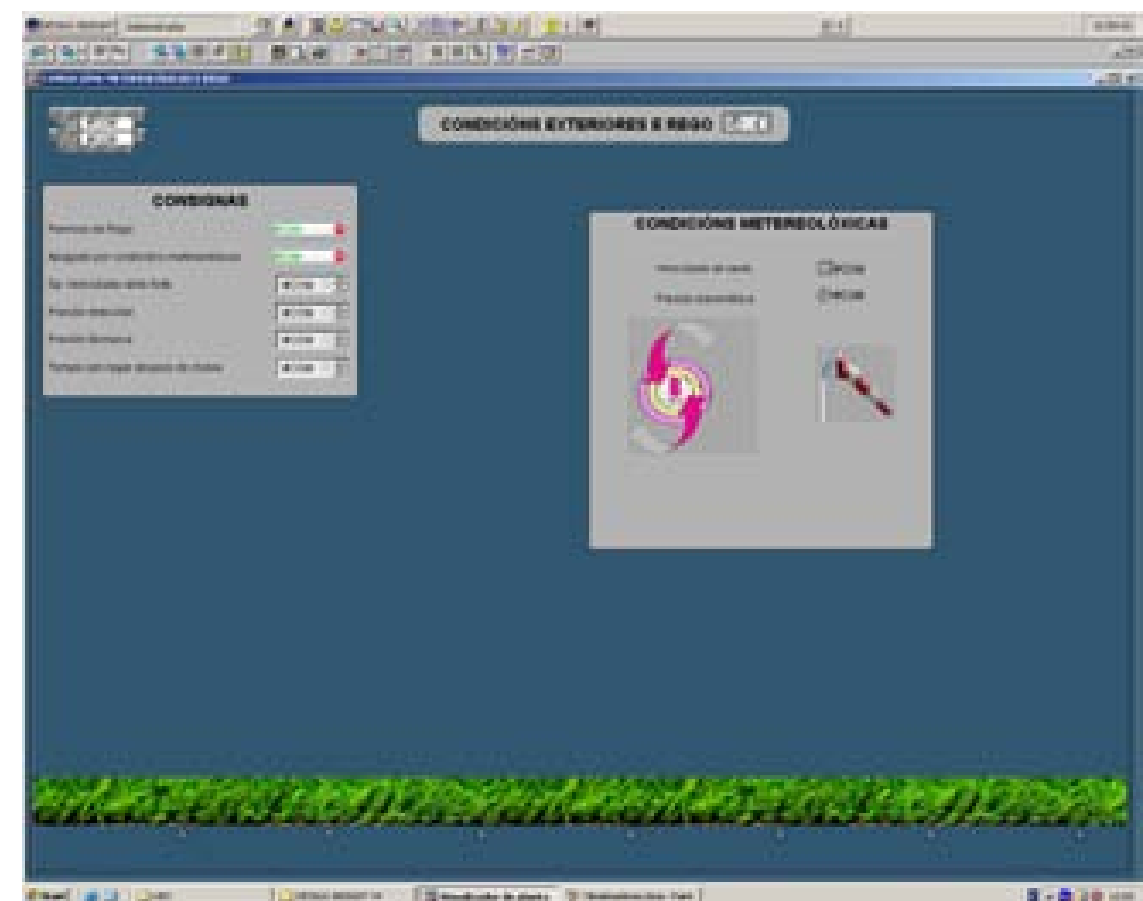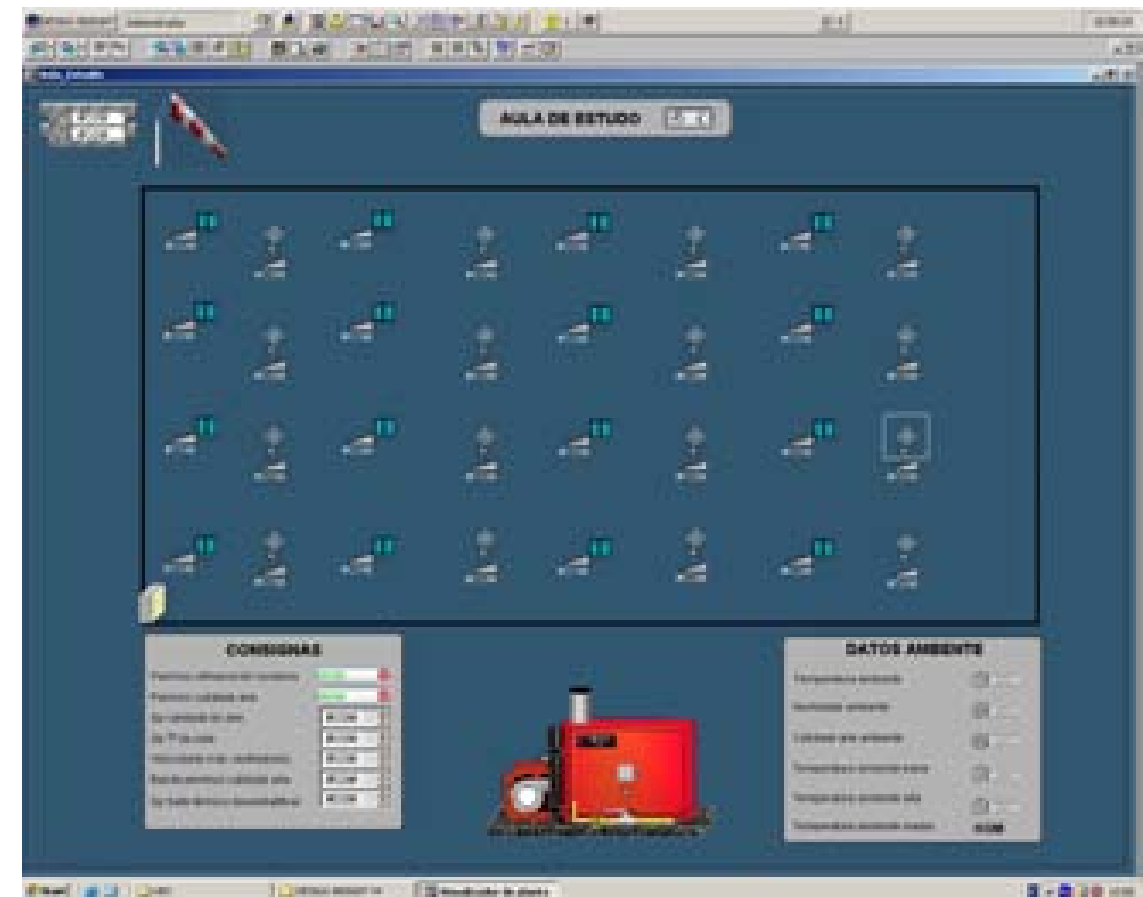

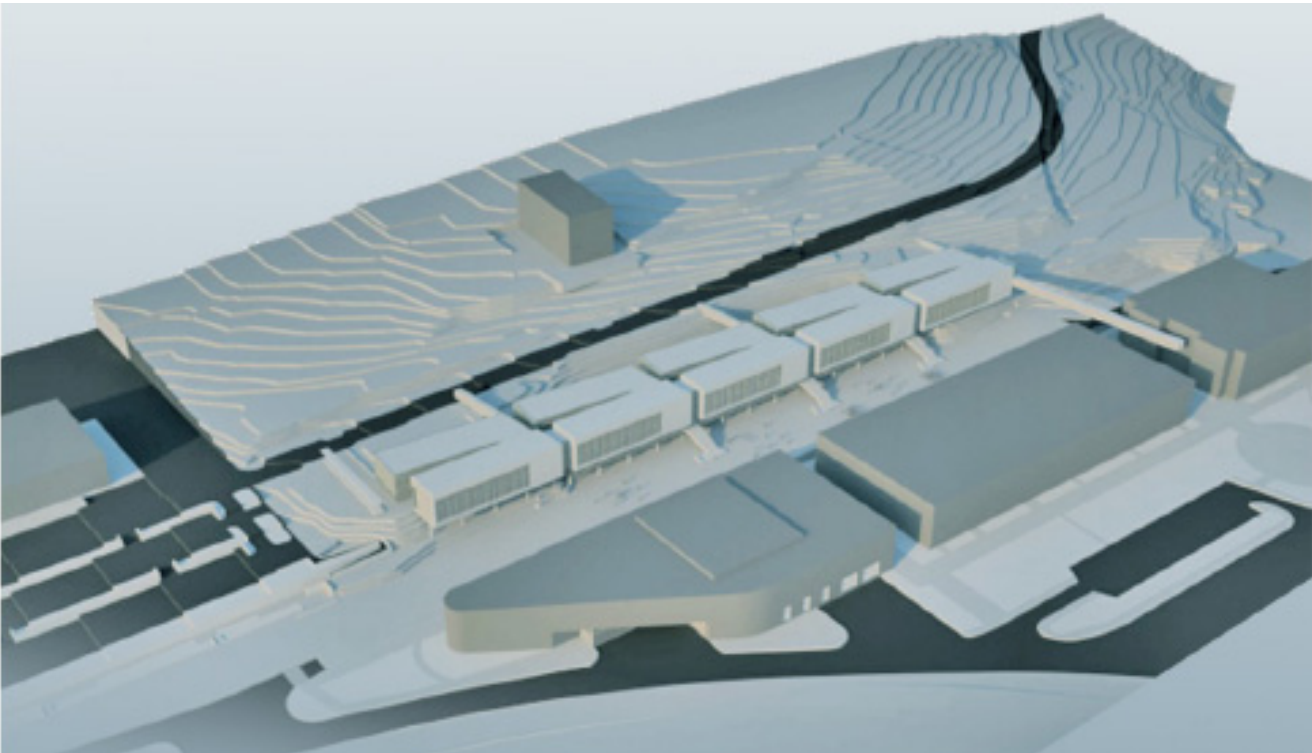


ESTUDO DE VIABILIDADE PARA COXERACIÓN NA UDC AREA CIENTÍFICA E FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E A EDUCACIÓN FÍSICA			
VICERREITORÍA RESPONSABLE:	Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Vicerreitor: Xosé Lois Martínez Suárez		
PROXECTO: ENXEÑEIRO INDUSTRIAL	Jesús M. Giz Novo.		
ORZAMENTO DA ACTUACIÓN:	17400,00 €		
CONSULTING TÉCNICO:	INSTITUTO TECNOLÓXICO DE GALICIA		
DIRECCIÓN DE OBRA: ENXEÑEIRO	Jesús M. Giz Novo		
OBRA: DATA DE ADXUDICACIÓN	07/05/2010		
CARACTERÍSTICAS DO PROXECTO	Este estudo pretende valorar a viabilidade dunha instalación de coxeración que actue como produtor de enerxía en base á queima de gas retribuindo por réxime especial a venta da enerxía eléctrica e aproveitando o calor residual do proceso para usos térmicos en calefacción, piscina ou refrixeración dando lugar a trixeneración.		
DATOS AMBIENTAIS DO PROXECTO	Subvención INEGA 65%		



AUDITORÍA ENERXÉTICA


EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS DE ARQUITECTURA

VICERREITORÍA RESPONSABLE:	Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Vicerreitor: Xosé Lois Martínez Suárez		
PROXECTO: ENXEÑEIRO INDUSTRIAL	Jesús M. Giz Novo.		
ORZAMENTO DA ACTUACIÓN:	3422,00 €		
EMPRESA INSTALADORA:	ATISAE, S.L.		
DIRECCIÓN DE OBRA: ENXEÑEIRO	Jesús M. Giz Novo		
OBRA: DATA DE ADXUDICACIÓN	21/01/2010		
CARACTERÍSTICAS DO PROXECTO	-Esta auditoría enerxética plantéxase como o punto de partida para realizar melloras de eficiencia neste centro. -A calefacción eléctrica por efecto Joule (resistencia eléctrica) é un desfase de consumo enerxético pola dificultade de xestión da instalación e porque é un sistema altamente ineficiente. Pode verse nas fotos adxuntas un radiador acceso sen ocupación, eran as 8:15 da mañá. Por outra banda no rexistro de consumo eléctrico non se ve unha redución significativa de consumo durante a noite o cal indica que os radiadores permanecen accesos durante toda a noite. - A proposta de mellora pasaría por dar un servizo dende a sala de caldeiras centralizada da Zapateira.		
DATOS AMBIENTAIS DO PROXECTO	Subvención INEGA 75%		Aforro tras implantación de medidas sobre 84,31 Ton CO2/ano.

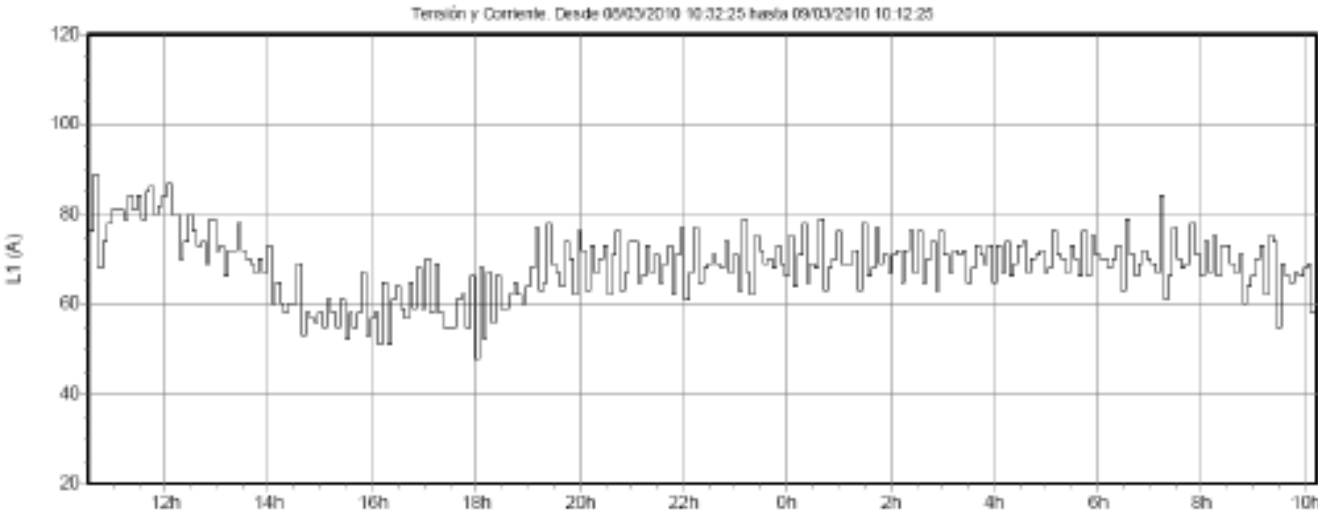

OBRA			
INCORPORACIÓN DE VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS EN VARIOS CENTROS DA UDC			
VICERREITORÍA RESPONSABLE:		Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Vicerreitor: Xosé Lois Martínez Suárez	
PROXECTO: TECNICOS REDACTORES		Jesús M. Giz Novo.	
ORZAMENTO DA ACTUACIÓN:		Varias actuacións	
EMPRESA INSTALADORA:		Varias	
DIRECCIÓN DE OBRA:		Jesús M. Giz Novo	
OBRA: DATA DE ADXUDICACIÓN		05/2010	
PRAZO DE EXECUCIÓN:		1 mes	
CARACTERÍSTICAS DO PROXECTO		A UDC segue a mellorar as condicións de regulación da calefacción en distintos centros. Neste caso CUR, CCR e Facultade de Dereito. Actuamos primeiro naqueles centros que teñen unha maior representatividade – aulas de estudo ou aqueles onde a regulación de temperatura en base a outros sistemas é moi complexa. Mediante a incorporación de válvulas termostáticas posibilitamos regular a temperatura indepedentemente ao gusto de cada usuario, esta medida aplícase a despachos ou oficinas. Á súa vez tentamos de sensibilizar aos usuarios para que deixen as válvulas configuradas nunha temperatura de 20°C. Ver pegatina superior. Esta medida é importante aplicala tamén en lugares con ocupación variable como aulas de estudo pero neste caso a regulación dependerá dalgún responsable e non dos usuarios. No CCR instalaronse 17 válvulas termostáticas en outros tantos radiadores de despachos.. O SAU está a pensar en dotar de información na WEB para que o estudantado poda consultar en cada momento as condicións térmicas de cada aula de estudo da UDC. http://www.udc.es/reitoria/ga/vicerreitorias/vxa/medioambiente/VALVULASIERMOESTATICAS.pdf	
DATOS AMBIENTAIS DO PROXECTO		Agardase subvención do INEGA para 2010	Redución de enerxía consumida do 12% por cada sistema instalado.



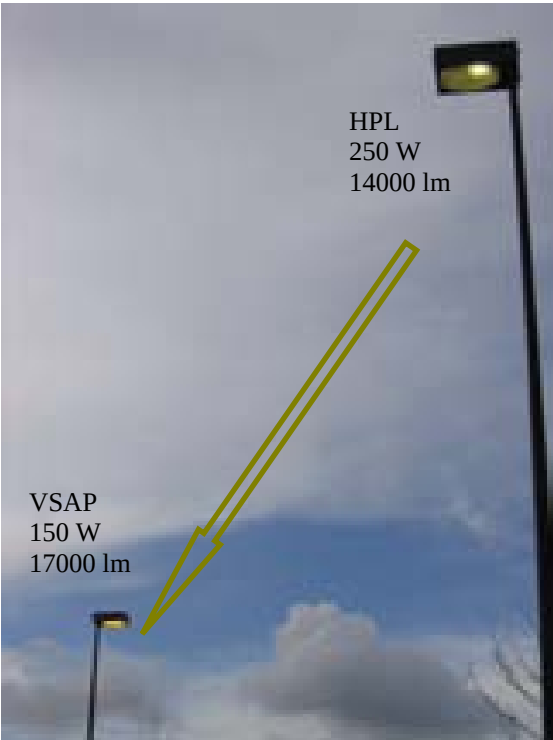

OBRA	
AUDITORÍA ENERXÉTICA ILUMINACIÓN EXTERIOR	
CAMPUS DA CORUÑA	
VICERREITORÍA RESPONSABLE:	Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Vicerreitor: Xosé Lois Martínez Suárez
PROXECTO: ENXEÑEIRO INDUSTRIAL	Jesús M. Giz Novo.
ORZAMENTO DA ACTUACIÓN:	3654,00 €
EMPRESA INSTALADORA:	Atisae, S.L.
DIRECCIÓN DE OBRA: ENXEÑEIRO	Jesús M. Giz Novo
OBRA: DATA DE ADXUDICACIÓN	01/2010
DATA DE REMATE:	30/06/2010
CARACTERÍSTICAS DO PROXECTO	Estudo de eficiencia enerxética no campus da Coruña. Este plantéxase como o paso previo para a realización dun proxecto técnico-paisaxístico para o campus de Elviña-A Zapateira. Neste proxecto fomentaráse o emprego de criterios eficientes na iluminación pero tamén na mellora da calidade do servizo, reforzando a iluminación en puntos singulares ou de tráfico conflictivo e regulando os apagados acendidos de forma adecuada diminuindo o consumo global de enerxía. O INEGA premia a realización destes estudos na posterior subvención en obras de mellora da eficiencia co cal o SAU entende que é de máxima prioridade a súa realización.
OUTROS DATOS	Paralelamente a este estudo realízanse melloras na iluminación como a que se está executando en OZA co cambio do tipo de iluminación e coa incorporación de sistema de reloxo astronómico na regulación do acendidos



OBRA

MELLORA DO SISTEMA DE XESTIÓN DE ILUMINACIÓN NO CITIC

VICERREITORÍA RESPONSABLE:	Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Vicerreitor: Xosé Lois Martínez Suárez		
PROXECTO: TECNICOS REDACTORES	Jesús M. Giz Novo en colaboración de TGV		
ORZAMENTO DA ACTUACIÓN:	Parte de control – 17658,48 €		
	Parte de detección y campo - 29508,74 €		
EMPRESA INSTALADORA:	Mantenza, S.L. e Siemens.		
DIRECCIÓN DE OBRA:	Jesús M. Giz Novo		
OBRA: DATA DE ADXUDICACIÓN	04/10/2010		
PRAZO DE EXECUCIÓN:	REMATADA 12/2010		
CARACTERÍSTICAS DO PROXECTO	O sistema consiste na mellora do sistema de regulación da iluminación, ventilación e control solar do CITIC. Este edificio diáfano inicialmente foi sometido a unha compartimentación posterior segundo os requirimentos das empresas e grupos de investigación que alí se aloxan. Por tanto a regulación da iluminación debe de adaptarse de forma eficiencia e flexible a estes novos usos. Por outra banda tamén é recomendable a automatización das lamas de regulación solar para conseguir un aproveitamento óptimo da luz solar e do sombreamento nas horas de incidencia directa do sol. Este sistema permite a avaliación dos aforros reais conseguidos nunha instalación de forma que sirva para que a UDC valore a implementación de sistema como este no resto de edificios.		
DATOS AMBIENTAIS DO PROXECTO	Subvención 33% INEGA 2009		



ULTIMA TIRA DE LAMA DE REGULACIÓN SOLAR PECHADA CANDO O SOL NON INCIDE DIRECTAMENTE SOBRE ESA FACHADA E 100% DA ILUMINACIÓN ACCESA



LUMINARIAS UBICADAS ENRIBA DE ARMARIOS POLA DIVISIÓN DE ESPAZOS

Plano Enerxético






PROXECTO – URBANIZACIÓN PARQUE TECNOLÓXICO	
VICERREITORÍA RESPONSABLE:	Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Vicerreitor: Xosé Lois Martínez Suárez
PROXECTO: TECNICOS REDACTORES	COTISA e por parte da UDC UDC: Jesús M. Giz Novo, Roi Salgueiro Barrio.
PRAZO DE EXECUCIÓN:	UNHA VEZ COMECEN AS OBRAS DO PRÓXIMO EDIFICIO DO PARQUE TECNOLÓXICO.
CARACTERÍSTICAS DO PROXECTO	Este proxecto trata de resolver e unificar a conexión e interrelación entre espazo público e subministros dentro do parque tecnolóxico da forma máis eficiente e sostible posible. Estase a realizar un estudo para a planificación da conectividade dos novos edificios á área do parque tecnolóxico, fixando criterios de eficiencia tanto ambiental coma económica, propoñendo un única alta en servizos de gas, electricidade e auga para o parque tecnolóxico. Tamén se contemplan outros puntos como a depuración de augas para o seu uso en cisternas e urinarios, separación de augas grises e negras e o que será o proxecto estrela en instalacións da UDC, a realización dun sistema de calefacción centralizada (district heating) que combinará á perfección o uso da BIOMASA (0% emisións) e o gas para dar lugar a un abaratamento no futuro mantemento das edificacións indo en pro da sostibilidade económica da UDC.
DATOS AMBIENTAIS DO PROXECTO	Este proxecto contempla os criterios actuais máis innovadores en pro dunha eficiencia ambiental e económica como son. - Sistema de calefacción centralizada. - Sistema de contadores de auga, gas único para todo o parque diminuindo custos fixos coas compañías subministradoras. - Sistema de depuración e aproveitamento de augas. - Sistema de iluminación pública integrado e con criterios de aforro. - Posibilidade de elección do combustible para calefacción máis barato en cada momento segundo o mercado (PELLETS, ASTILLA OU GAS).



PROXECTO – CLIMATIZACIÓN POR HIDROTERMIA NO CLUBE UNIVERSITARIO

VICERREITORÍA RESPONSABLE:	Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Vicerreitor: Xosé Lois Martínez Suárez
PROXECTO: TECNICOS REDACTORES	Magaral S.L. UDC: Jesús M. Giz Novo.
PAZO DE EXECUCIÓN:	DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2011
CARACTERÍSTICAS DO PROXECTO	Proxecto de climatización por hidrotérmia, unha tecnoloxía similar á xeotermia pero con intercambio á auga no clube universitario. A ubicación do centro fai recomendable esta instalación de enerxías renovables polos seguintes motivos: - Feitas xestións co INEGA para un convenio marco e un específico pola singularidade da actuación. - Maior eficiencia da instalación e constancia dese rendemento ao longo de todo o ano. - Maior durabilidade da maquinaria ao non actuar contra o aire directamente que provocaría unha corrosión prematura como ocorre coas máquinas de climatización da reitoría.
DATOS AMBIENTAIS DO PROXECTO	- Este proxecto contempla os criterios actuais máis innovadores onde os maiores custes de inversión vense xustificados polos altos prezos da enerxía en incremento progresivo.

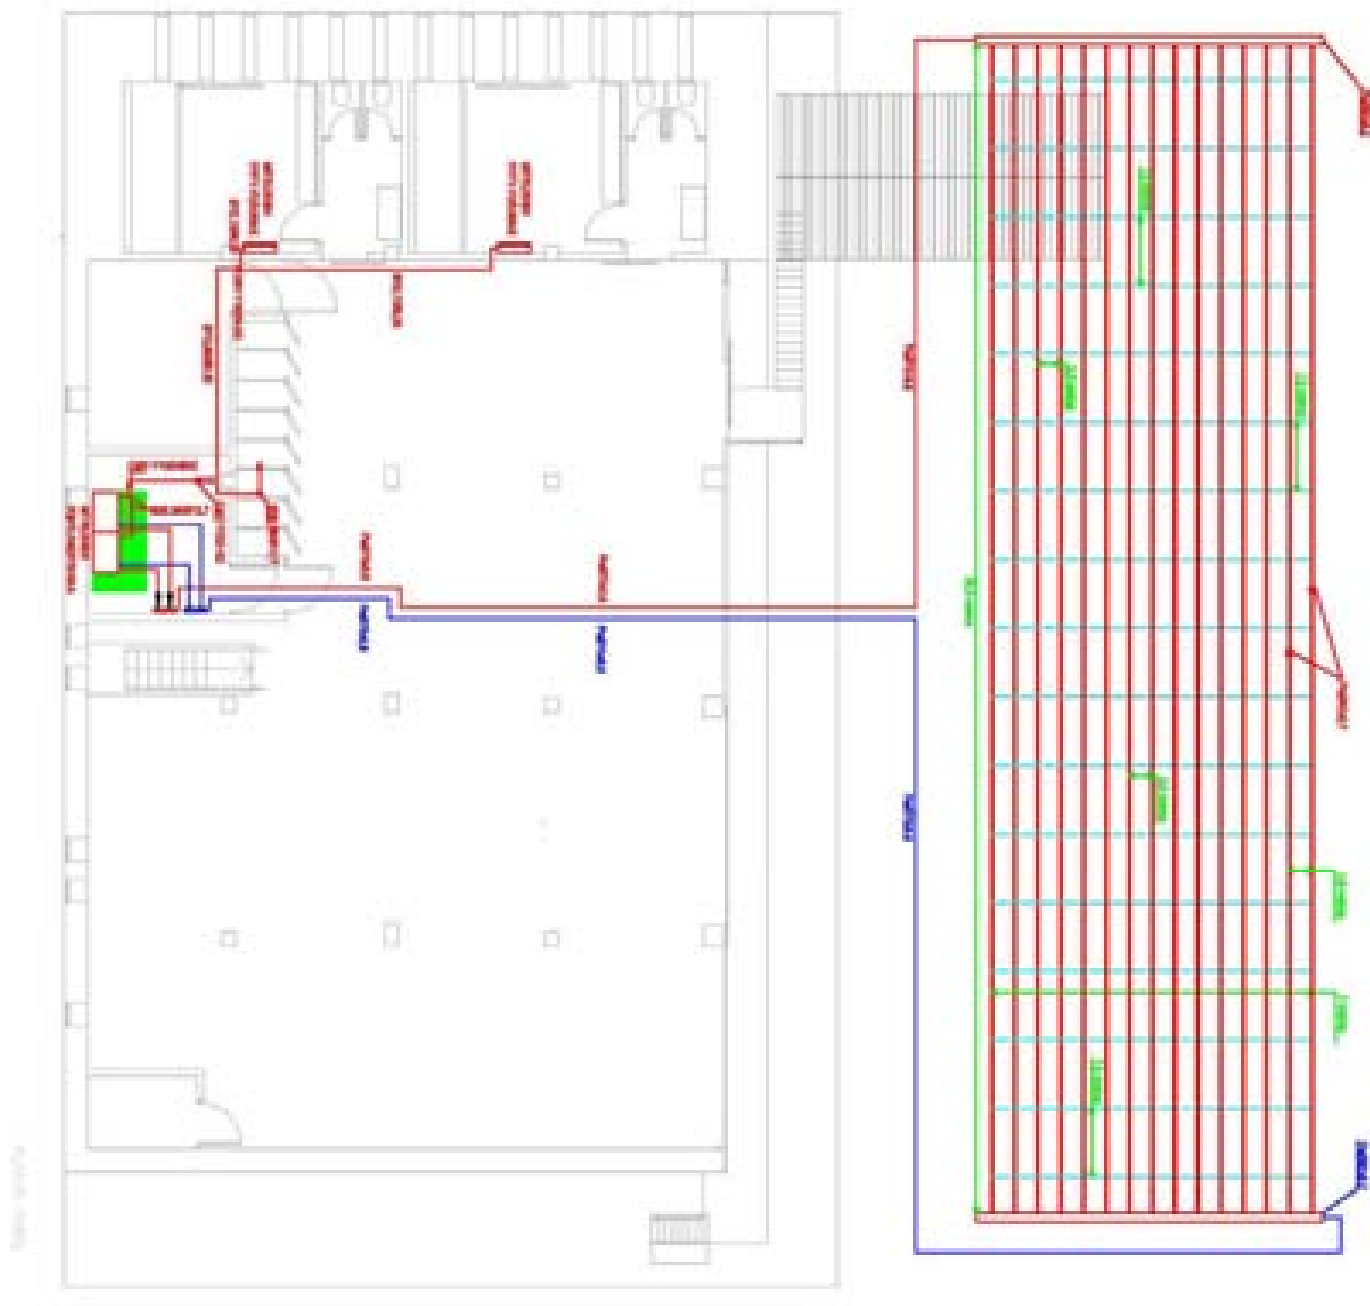

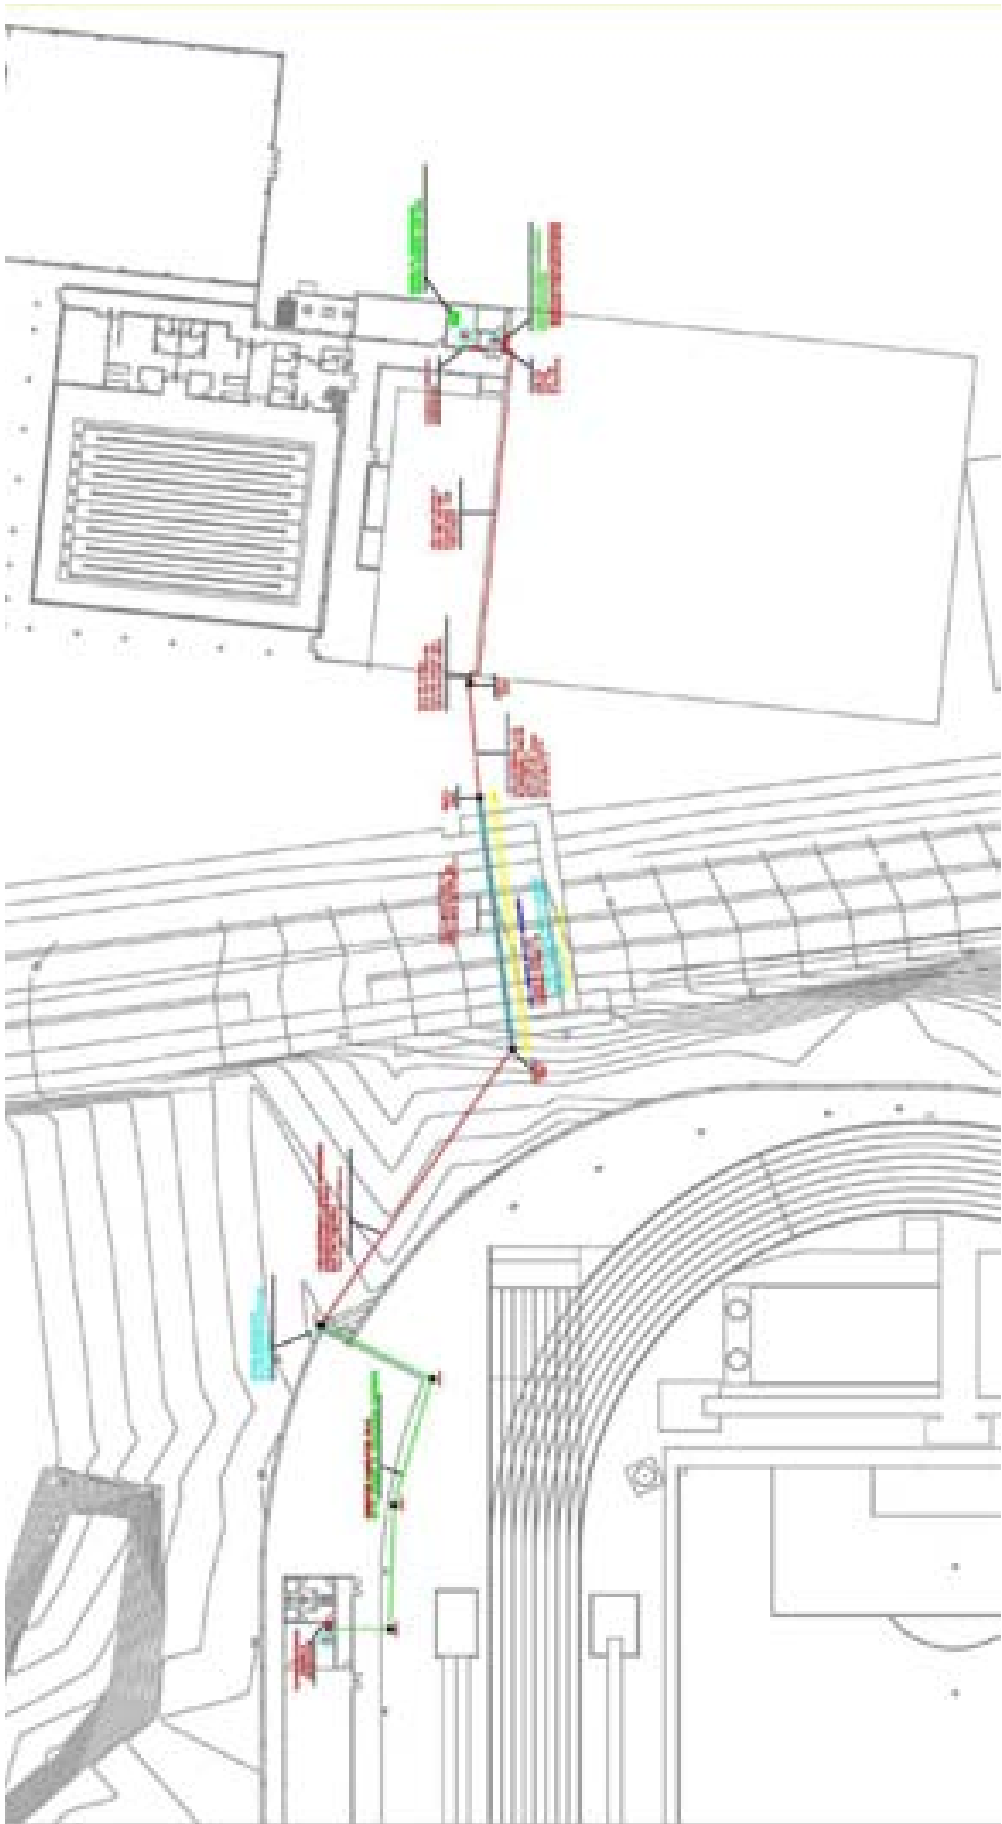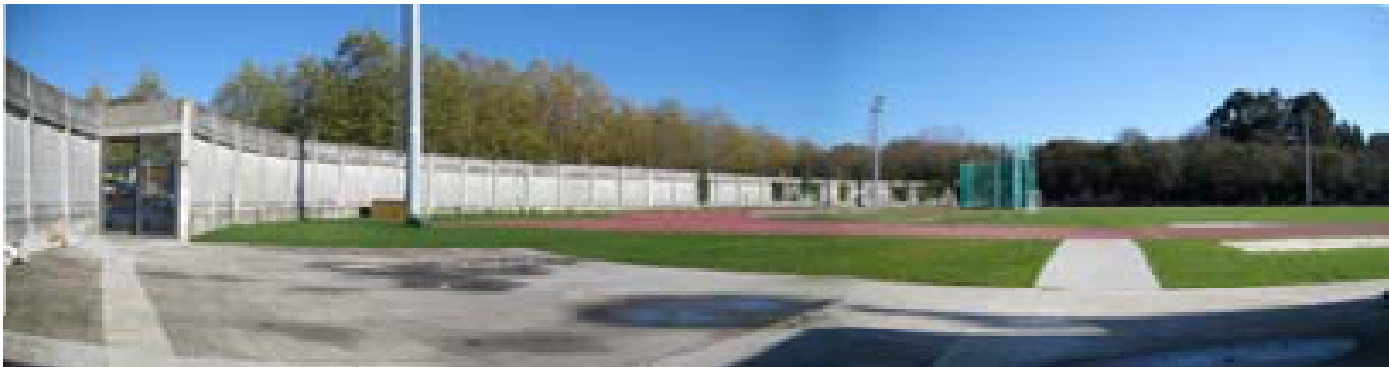

OBRA

ACOMETIDA ELECTRICA Á FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E A EDUCACIÓN FÍSICA

VICERREITORÍA RESPONSABLE:	Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Vicerreitor: Xosé Lois Martínez Suárez
PROXECTO: TECNICOS REDACTORES	Magaral Ingeniería S.L. con supervisión da UDC por Jesús M. Giz Novo
ORZAMENTO DA ACTUACIÓN:	53.620,18 €
EMPRESA INSTALADORA:	Moelvi S.L.
DIRECCIÓN DE OBRA: ENXEÑEIRO	Magaral Ingeniería S.L. con supervisión da UDC por Jesús M. Giz Novo
OBRA: DATA DE ADXUDICACIÓN	08/09/2009
DATA DE REMATE:	REMATADA.
PRAZO DE EXECUCIÓN:	1 mes
CARACTERÍSTICAS DO PROXECTO	- Nun convenio establecido coa Consellería de Educación melloráronse as instalacións das pistas polideportivas da Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física. - O consumo eléctrico incrementouse co que é preciso dotar dunha acometida eléctrica con potencia suficiente. - Por criterios de eficiencia e de diminución de custes futuros se proxecta dar servizo dende o centro de transformación da facultade dado que ten potencia suficiente. - Esta obra posibilitará o funcionamento adecuado do alumeado deportivo e da calefacción das pistas cubertas.



OBRA


SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESOS, CCTV E CONTROL DE INTRUSIÓN PARA EDIFICIOS DA UDC

VICERREITORÍA RESPONSABLE:	Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Vicerreitor: Xosé Lois Martínez Suárez
PROXECTO: TECNICOS REDACTORES	Roi Salgueiro Barrio e Jesús M. Giz Novo
DIRECCIÓN DE OBRA: ENXEÑEIRO	Roi Salgueiro Barrio e Jesús M. Giz Novo
CARACTERÍSTICAS DO PROXECTO	Se traballa nun sistema centralizado de control de accesos na UDC. Isto permitirá: 1 – Ter un xestor de permisos único para toda a UDC cun posto centralizado que permita coñecer en cada momento os usuarios que hai dentro dun edificio e limitar as zonas de acceso (accesos a parkings, salas críticas, accesos durante fins de semana). 2 – Permitiría ter un contaxe de usuarios dentro dun edificio en caso de evacuación emerxencia. 3 – Permitiría ter un maior control de roubos. 4 – O control de accesos aos aparcadoiros de centro será preciso unha vez esten concluídas as torres de vivendas da zona de Someso.
CENTROS NOS QUE XA TEN SIDO APLICADA	-Escola Universitaria de Terapia Ocupacional – Rematado, pendente de conexión con posto de vixilancia do campus de OZA. -Centro Investigacións en Tecnoloxías de Información e da Comunicación (CITIC), rematado. -Edificiό de Servizos Centrais de Investigación, pendente de realización de obra civil en parking para automatización de barreiras.





% de colectores según tipo de aguas

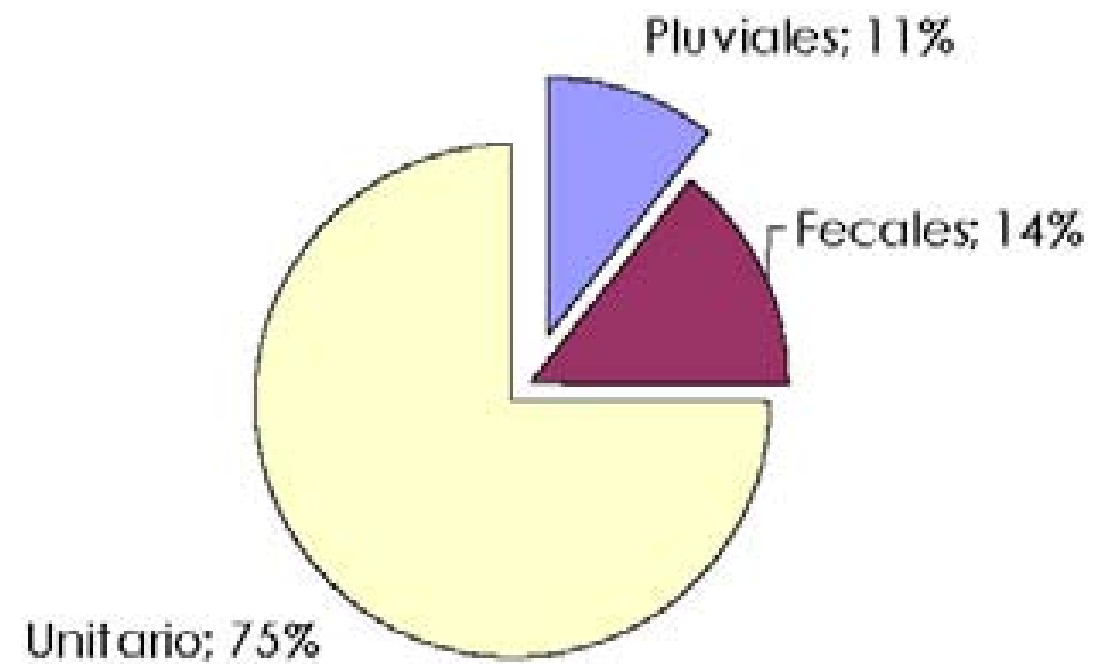

OBRA

MELLORA DAS REDES SOTERRADAS NO CAMPUS DA UDC

VICERREITORÍA RESPONSABLE:	Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Vicerreitor: Xosé Lois Martínez Suárez
PROXECTO: TECNICOS REDACTORES	Roi Salgueiro Barrio e Jesús M. Giz Novo
DIRECCIÓN DE OBRA: ENXEÑEIRO	Roi Salgueiro Barrio e Jesús M. Giz Novo
CARACTERÍSTICAS DO PROXECTO	AUGAS: Dentro do proxecto SOSTAUGA impulsado pola Oficina de Medioambiente, diagnosticouse a necesidade de realizar un levantamento claro da rede de saneamento do campus da UDC para ver as posibilidades de aforro na depuración de augas, reutilización de augas pluviais e manantiais e a verificación da correcta separación das distintas augas para poder avaliar tamén a capacidade futura da rede segundo a planificación de nova obra para a UDC. Esta medida dará lugar a obras de mellora. Achégase copia dun documento de estudo actualizado. O documento sostauga poder verse en: http://www.udc.es/sociedade/medio_ambiente/auga_e_rios/ Documento que foi presentado nun congreso en Oviedo no ano 2010. TELECOMUNICACIÓNS: Mellora das canalizacións no ámbito da Zapateira, retirada de cables de fibra que discorrían pola fachada da Facultade de Ciencias para soterralas e mallar as canalizacións en toda a praza, mellorando tamén o aspecto visual da facultade. ELECTRICIDADE: Mellora das canalizacións no ámbito da Zapateira, entre outras prevése dar un servizo de iluminación único dende o aparcadoiro de Ciencias que mellorará o control e a eficiencia da instalación cun futuro proxecto.



Billa temporizada para lavabos:
 Con perlizador
 Caudal: 2 l/min independente da presión.
 Apertura por pulsador,
 Peche automático aos 10s ± 2s.
 Consumo: 0.33 L por cada uso.



CAMPAÑA DE DIFUSIÓN AFORRA AUGA

VICERREITORÍA RESPONSABLE:	Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Vicerreitor: Xosé Lois Martínez Suárez
PROXECTO: TECNICOS REDACTORES	Manolo Soto e Jesús M. Giz Novo.
CARACTERÍSTICAS DO PROXECTO	Campaña de difusión no aforro de auga, co cambio de 52 billas monomando por 52 billas perlizadoras temporizadas na facultade de Ciencias. Tamén se teñe recollida a súa instalación para novas obras a través do prego de condicións técnicas da UDC. O sistema permite temporizar a descarga e que esta sexa moi eficiente grazas os sistemas perlizadores cunha inxección de aire que reduce o consumo de auga sen diminuír a confortabilidade no uso. O SAU esta incluíndo estes sistemas nos novos proxectos de edificación ou reformas consciente dos grandes aforros que permite para fomentar e difundir o seu emprego coma un criterio ambiental máis. Dispúxose información na WEB da VIXA e follas informativas nos aseos da facultade. Ver web: http://www.udc.es/sociedade/medio_ambiente/auga_e_rios/
DATOS AMBIENTAIS DO PROXECTO	Estímanse unhas posibilidades de aforro do 77% anual.

INSTALACIÓN DE FONTES REFRIXERADAS DE AUGA

VICERREITORÍA RESPONSABLE:	Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Vicerreitor: Xosé Lois Martínez Suárez
PROXECTO: TECNICOS REDACTORES	Manuel Soto Castiñeira e Jesús M. Giz Novo.
CARACTERÍSTICAS DO PROXECTO	Campaña de difusión de reutilización de envases. Evitase a utilización de envases de plástico, evítanse os custes de transporte derivados da comercialización de botellas, etc... Posibilitase ao alumnado evitar os custes (0,60€) por cada botella de auga mineral. Instalación de 20 fontes de auga refrixerada noutros tantos centros en 2009. Debido ao éxito da campaña ampliouse en 5 unidades máis en 2010. Campaña de difusión a posteriori en papel nos centros onde se instalou e a través da WEB: http://www.udc.es/sociedade/medio_ambiente/auga_e_rios/
DATOS AMBIENTAIS DO PROXECTO	Aforro no emprego de envases de plástico por parte do alumnado.



MANTEMENTOS E INSPECCIÓNS PERIÓDICAS

VICERREITORÍA RESPONSABLE: Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental
Vicerreitor: Xosé Lois Martínez Suárez

PROXECTO: ENXEÑEIRO INDUSTRIAL Jesús M. Giz Novo.

INSPECCIÓN PERIÓDICAS	Coordinación das seguintes inspeccións periódicas obrigadas por normativa e subsanación de erros atopados para dispoñer en normativa as instalacións: BAIXA TENSIÓN: C.U.R., Escola Universitaria Politécnica, Facultade de Ciencias da Educación, Facultade de Socioloxía e Ciencias da Comunicación, Escola Técnica Superior de Arquitectura, Escola Universitaria de Arquitectura Técnica, Escola de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos, Facultade de Filoloxía, Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física, Pavillón de Deportes, Pavillón de Estudantes, Estadio Deportivo Elviña, Pistas deportivas – Rocodromo da Zapateira, Edificio de Apoio ao Estudo, Escola infantil. Enviose un dossier a todos os centros afectados por esta revisión para que asuman o mantemento de interruptores diferenciais, luminarias de emerxencia e notifique ao SAU as modificacións na instalación como medida para poder reducir os custos na revisión que tocará dentro de 5 anos e manter a instalación no seu correcto estado en todo momento. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN A UDC ten practicamente ao día estas inspeccións salvo problemas construtivos que complican a súa solución, fosos de recollida de aceites, obras temporais, ventilacións inadecuadas, etc... DEPOSITOS DE GASOIL Os depósitos de gasoil deben revisarse cada 10 anos. Na UDC isto non se fixo máis que puntualmente por sospeita de fugas pero non se rexistrou na delegación de Industria o cal é obrigatorio. O SAU propón realizar esta ano a lo menos revisión en 10 centros e a subsanación dos posibles defectos. Finalmente por escasez de tempo para a súa xestión fixéronse unicamente 3 depósitos. Será preciso continuar no 2011. INSTALACIÓNS TÉRMICAS O INEGA no seu plan de revisión de caldeiras está a asumir a primeira inspección de caldeiras que esixe o novo regulamento de caldeiras en canto a eficiencia en salas de caldeiras. Isto dalle unha vantaxe ás caldeiras da UDC xa revisadas todas as de máis de 10 anos para finais de 2010 de forma <u>totalmente gratuíta</u>. INSPECCIÓN ANUAL DE TOMAS A TERRA Este mantemento obrigatorio segundo RD 842/2002 estase a realizar de forma regular nos últimos anos na época seca do ano.
------------------------------	--

MANTEMENTOS, SUBMINISTROS E PREGOS DE CONDICIÓN

VICERREITORÍA RESPONSABLE: Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental
Vicerreitor: Xosé Lois Martínez Suárez

PROXECTO: ENXEÑEIRO INDUSTRIAL Jesús M. Giz Novo.

MANTEMENTOS	- Realización de pregos de condicións técnicas para mantementos cunha grande concreción e inventario. O obxectivo é controlar os gasto non soamente do servizo senón os provocados por unha mala eficacia do servizo que provoca custes de reposición de pezas de forma prematura. - Pretendese publicar para acceso aos centros os pregos de condicións técnicas e contar coa colaboración de responsables de centros e persoal de conserxarías na supervisión do servizo para unha mellor coordinación global na UDC. Realización dos seguintes pregos de condicións entre finais de 2009 e primer semestre de 2010. - Grupos electróxicos. - Centros de transformación, liñas de alta tensión soterradas e baterías de condensadores. - Calefacción e climatización. - Legionellose e calidade do vaso da piscina da facultade do deporte e a educación física. - Instalacións solares térmicas e fotovoltaicas - Sais – aglutinar e coordinar o servizo prestado para os 4 saís da udc que se manteñen.
SUBMINISTRACIÓNS	- Control de produción eléctrica na instalación solar fotovoltaica do CITIC. - Control de consumos de auga-gasóleo-electricidade e gas por centro con estudo de ratios por usuario e por m2. - Revisión de facturación eléctrica, estase a estudar este punto para poder aforrar até <u>25.000€/ano</u> en conceptos de penalización por potencia e por enerxía reactiva. Remate estudo Xuño 2010 Realización dos seguintes pregos de condicións técnicos para concursos a licita ren Xuño 2010: - Subministración eléctrica. - Subministración de gas.
OBRAS	Realización do prego de condicións técnicas para proxectos de novas edificacións na UDC. Cun documento de case 30 páxina que marcan os criterios que se deben de considerar en todo deseño de edificios e instalacións da UDC. Os requirimentos van mais aló da normativa tentando buscar un achegamento e integración de criterios da UDC e buscando a maior eficiencia global das actuacións.
